




D1_22_harmonogram prací aktualizace_2_ k 30.11.2016_MiMu

ID	Kód WBS	Název úkolu	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	<div><div><div>2016</div><div>2017</div></div></div>																					
70	1.6.1.2.4.5	Konstrukce asfaltové vozovky	26.5.17	8.6.17																						
71	1.6.1.2.5	Odvodnění vozovky	15.4.17	12.6.17																						
72	1.6.1.2.5.1	Přikopy patní prefabrikované	15.4.17	12.6.17																						
73	1.6.1.2.5.2	Monolitické žlaby patní	18.4.17	1.5.17																						
74	1.6.1.2.5.3	Monolitické rigol v SDP (Curbking)	18.4.17	1.5.17																						
75	1.6.1.2.5.4	Štěrbinové žlaby	26.4.17	19.5.17																						
76	1.6.1.2.6	Dokončovací práce	13.5.17	11.6.17																						
77	1.6.1.2.6.1	Skluzy	13.5.17	5.6.17																						
78	1.6.1.2.6.2	Dosypání krajnic	13.5.17	5.6.17																						
79	1.6.1.2.6.3	Dokončovací práce (terénní úpravy, humusování)	13.5.17	5.6.17																						
80	1.6.1.2.6.4	Svodidla vpravo	23.5.17	11.6.17																						
81	1.6.1.3	Střední dělicí pás (SDP)	15.6.17	11.7.17																						
82	1.6.1.3.1	Trvalé přejezdy SDP	15.6.17	11.7.17																						
83	1.6.1.3.2	Ocelové svodidlo oboustranné	15.6.17	11.7.17																						
84	1.6.1.3.3	Rozproštění ornice	15.6.17	11.7.17																						
85	1.6.2	SO 101.2 - Opravy větví MÚK	3.10.16	8.6.17																						
86	1.6.2.1	Pravá polovina (PJP)	3.10.16	24.11.16																						
87	1.6.2.1.1	Oprava větví AB vozovky v tloušťkách 12cm a 6cm	3.10.16	20.11.16																						
88	1.6.2.1.2	Úprava krajnic z asfaltového recyklátu	1.11.16	24.11.16																						
89	1.6.2.2	Levá polovina (LJP)	1.5.17	8.6.17																						
90	1.6.2.2.1	Oprava větví AB vozovky v tloušťkách 12cm a 6cm	1.5.17	5.6.17																						
91	1.6.2.2.2	Úprava krajnic z asfaltového recyklátu	5.6.17	8.6.17																						
92	1.6.3	SO 101.3 - Opravy před stavbou	18.4.16	2.12.16																						
93	1.6.3.1	Pravá polovina (PJP)	18.4.16	1.5.16																						
94	1.6.3.1.1	Úprava drenážních šachet v krajnici PJP	18.4.16	29.4.16																						
95	1.6.3.1.2	Oprava zpevněné asfaltové krajnice	26.4.16	29.4.16																						
96	1.6.3.1.3	Oprava styčných spar hmotou EMZ	30.4.16	1.5.16																						
97	1.6.3.2	Levá polovina (LJP)	7.5.16	2.12.16																						
98	1.6.3.2.1	Oprava stávajících žlabů v SDP, oprava stávajících CB desek	28.11.16	2.12.16																						
99	1.6.3.2.2	Broušení CB vozovky	7.5.16	8.5.16																						
100	1.6.3.2.3	Oprava styčných spar hmotou EMZ	7.5.16	8.5.16																						
101	1.6.3.2.4	Oprava jednotlivých desek CB vozovky	14.5.16	15.5.16																						
102	1.6.4	SO 101.4 - Propustky	3.4.17	18.6.17																						
103	1.6.4.1	Pravá polovina (PJP)	3.4.17	18.6.17																						
104	1.6.4.1.1	Propustek v km 162,823	3.4.17	16.4.17																						
105	1.6.4.1.2	Propustek v km 164,024	13.4.17	30.4.17																						
106	1.6.4.1.3	Propustek v km 164,703	23.4.17	7.5.17																						
107	1.6.4.1.4	Propustek v km 166,909	3.5.17	21.5.17																						
108	1.6.4.1.5	Propustek v km 167,380	13.5.17	4.6.17																						
109	1.6.4.1.6	Propustek v km 167,923	23.5.17	18.6.17																						
110	1.6.4.2	Levá polovina (LJP)	3.4.17	18.6.17																						

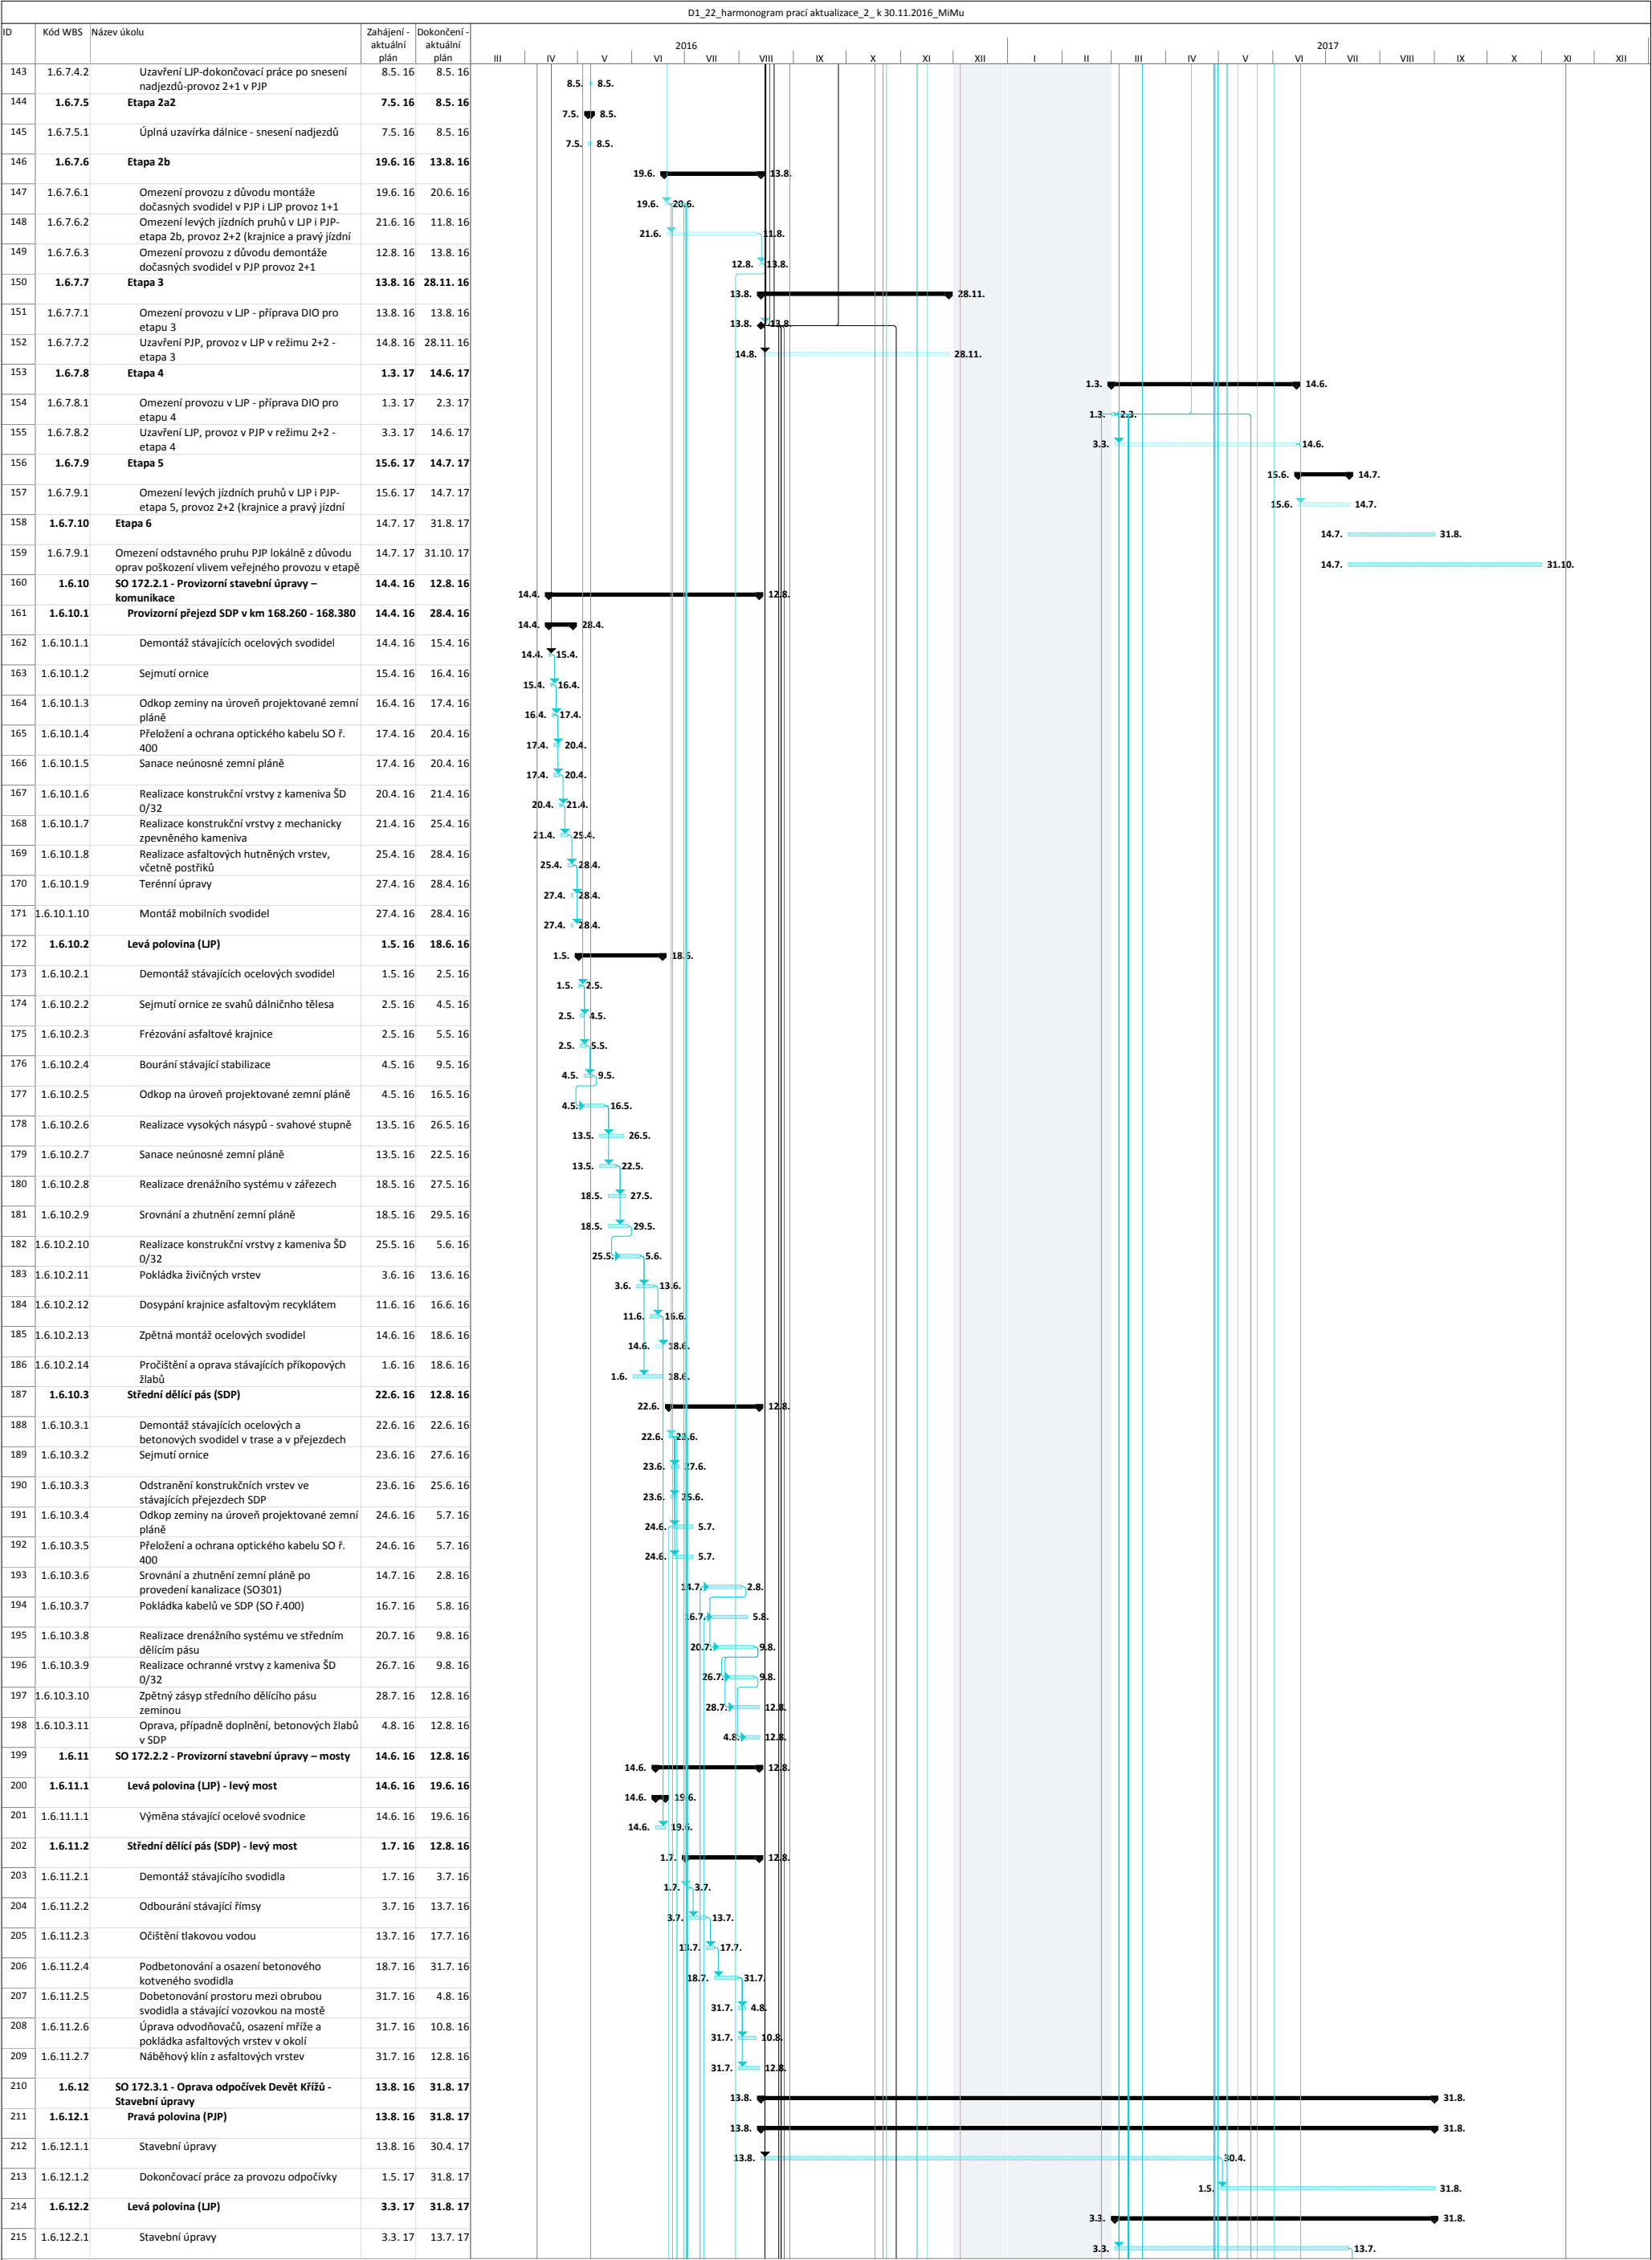

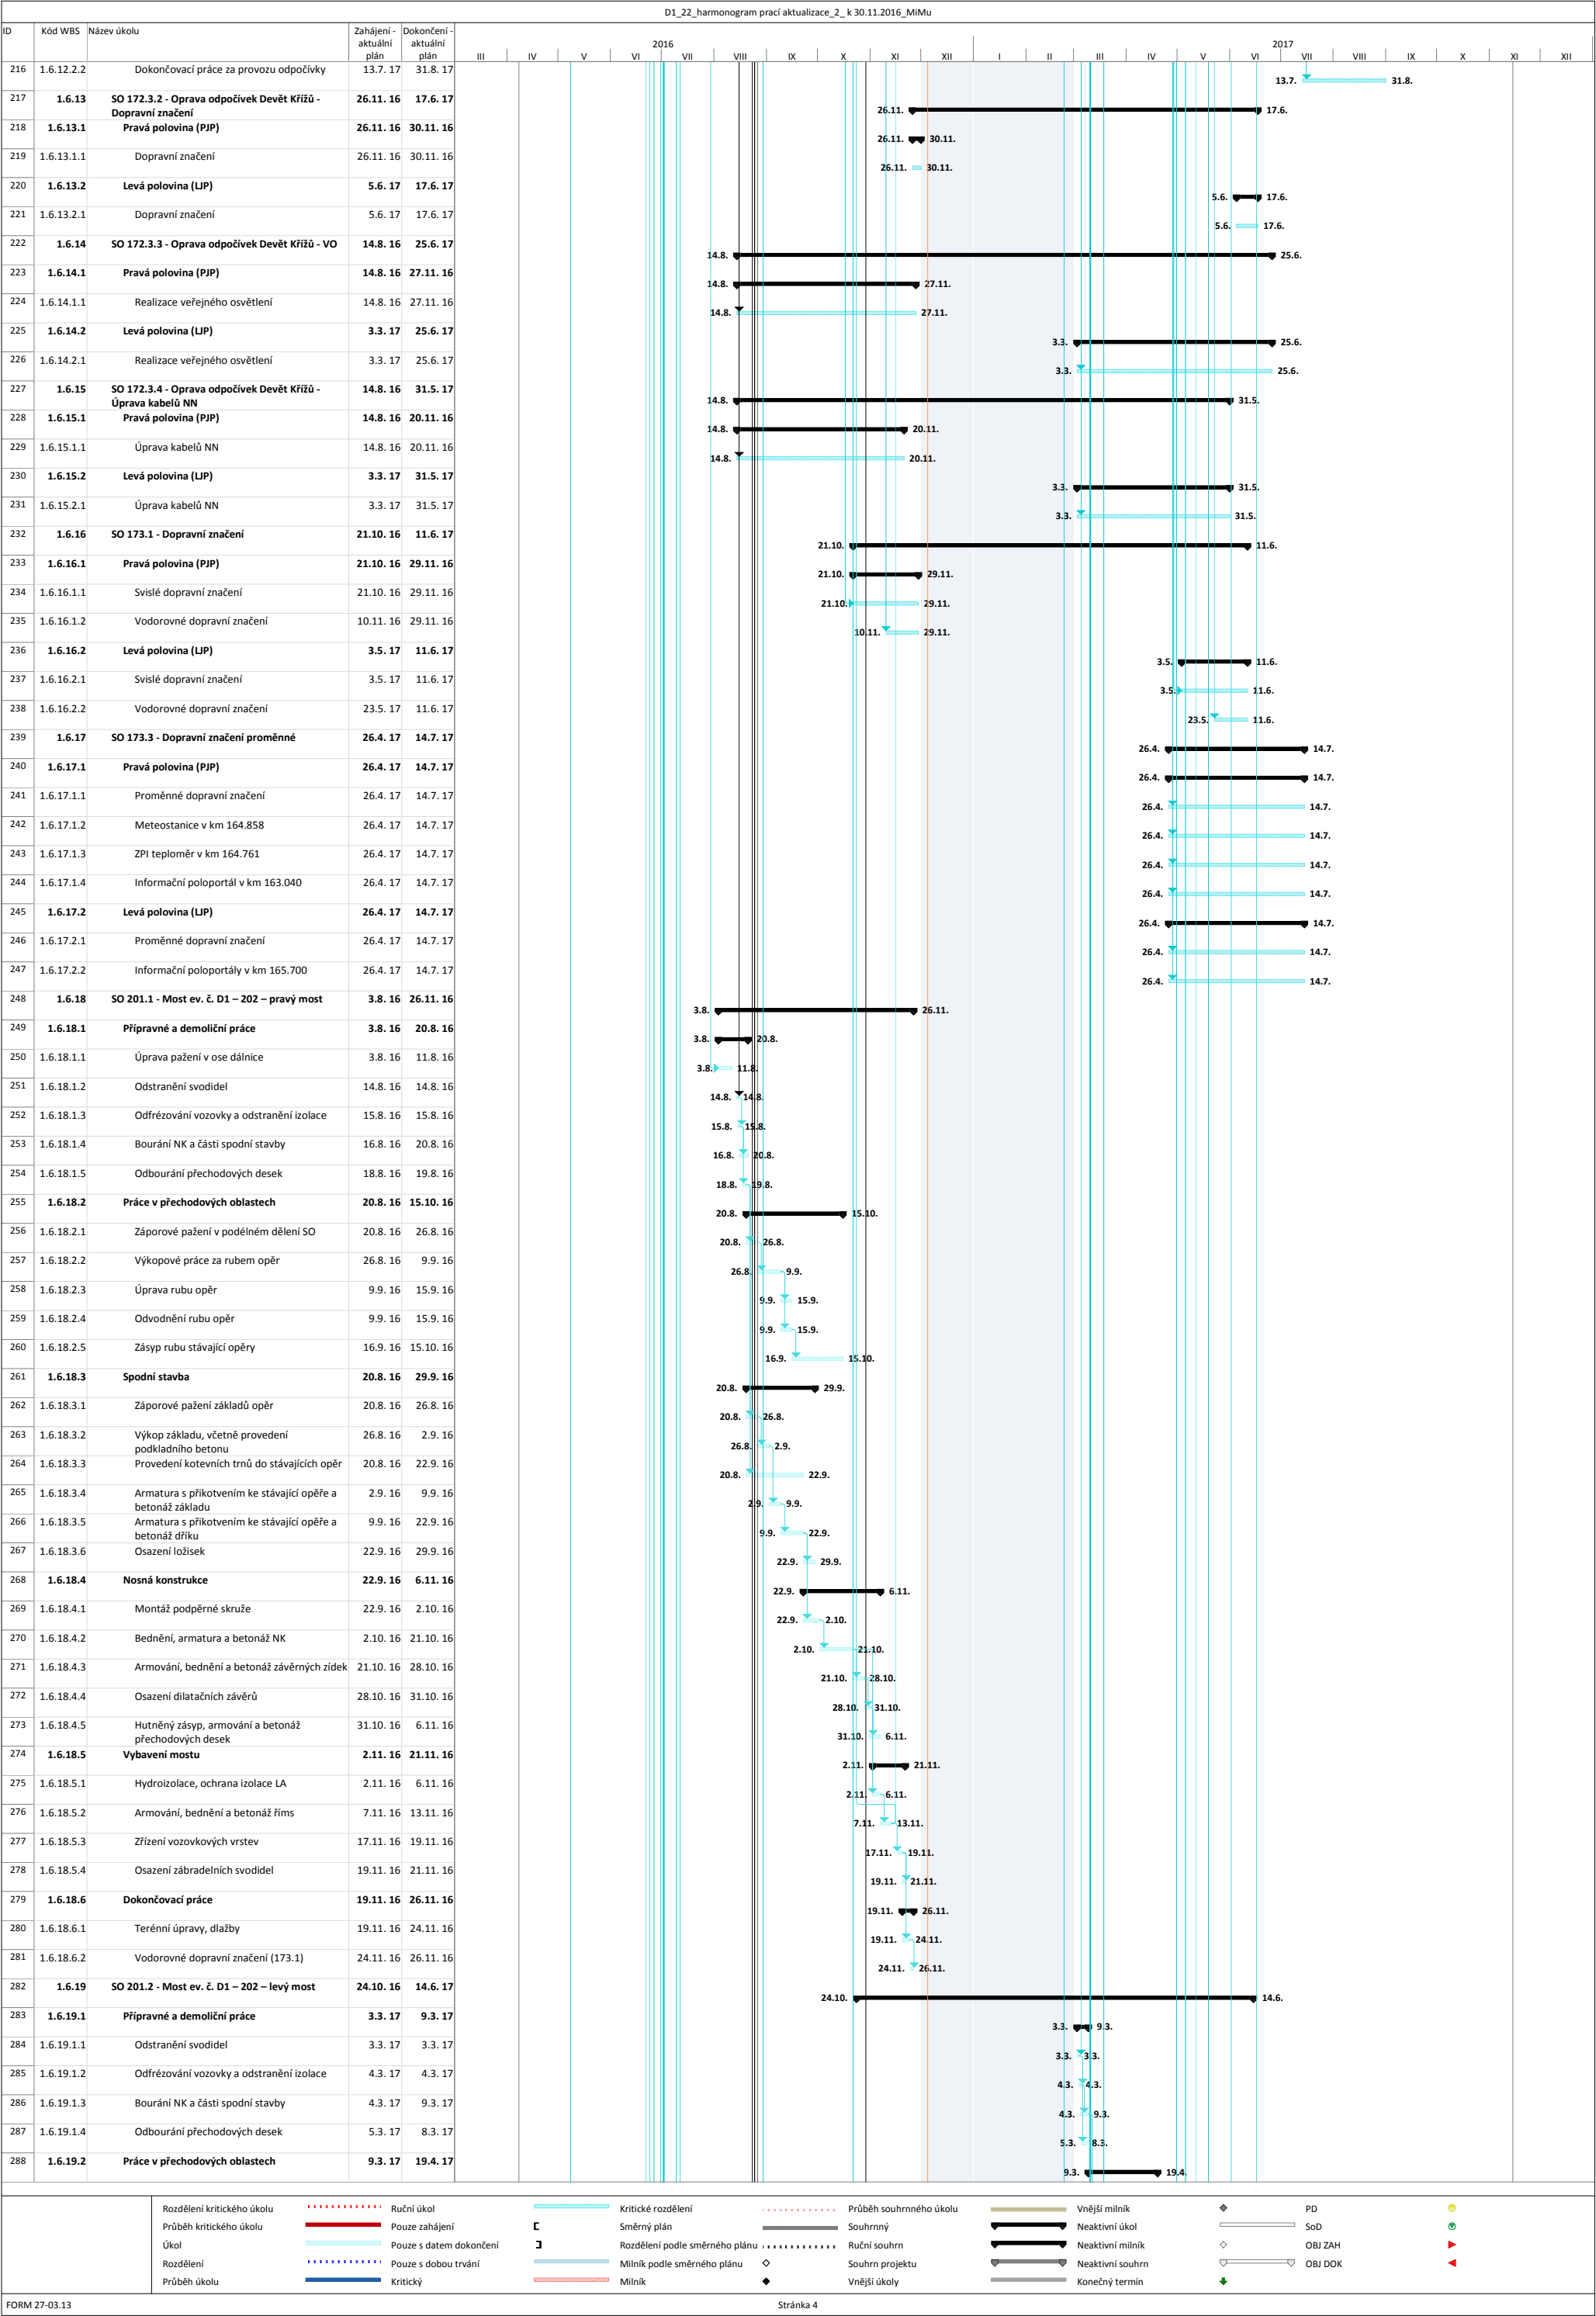

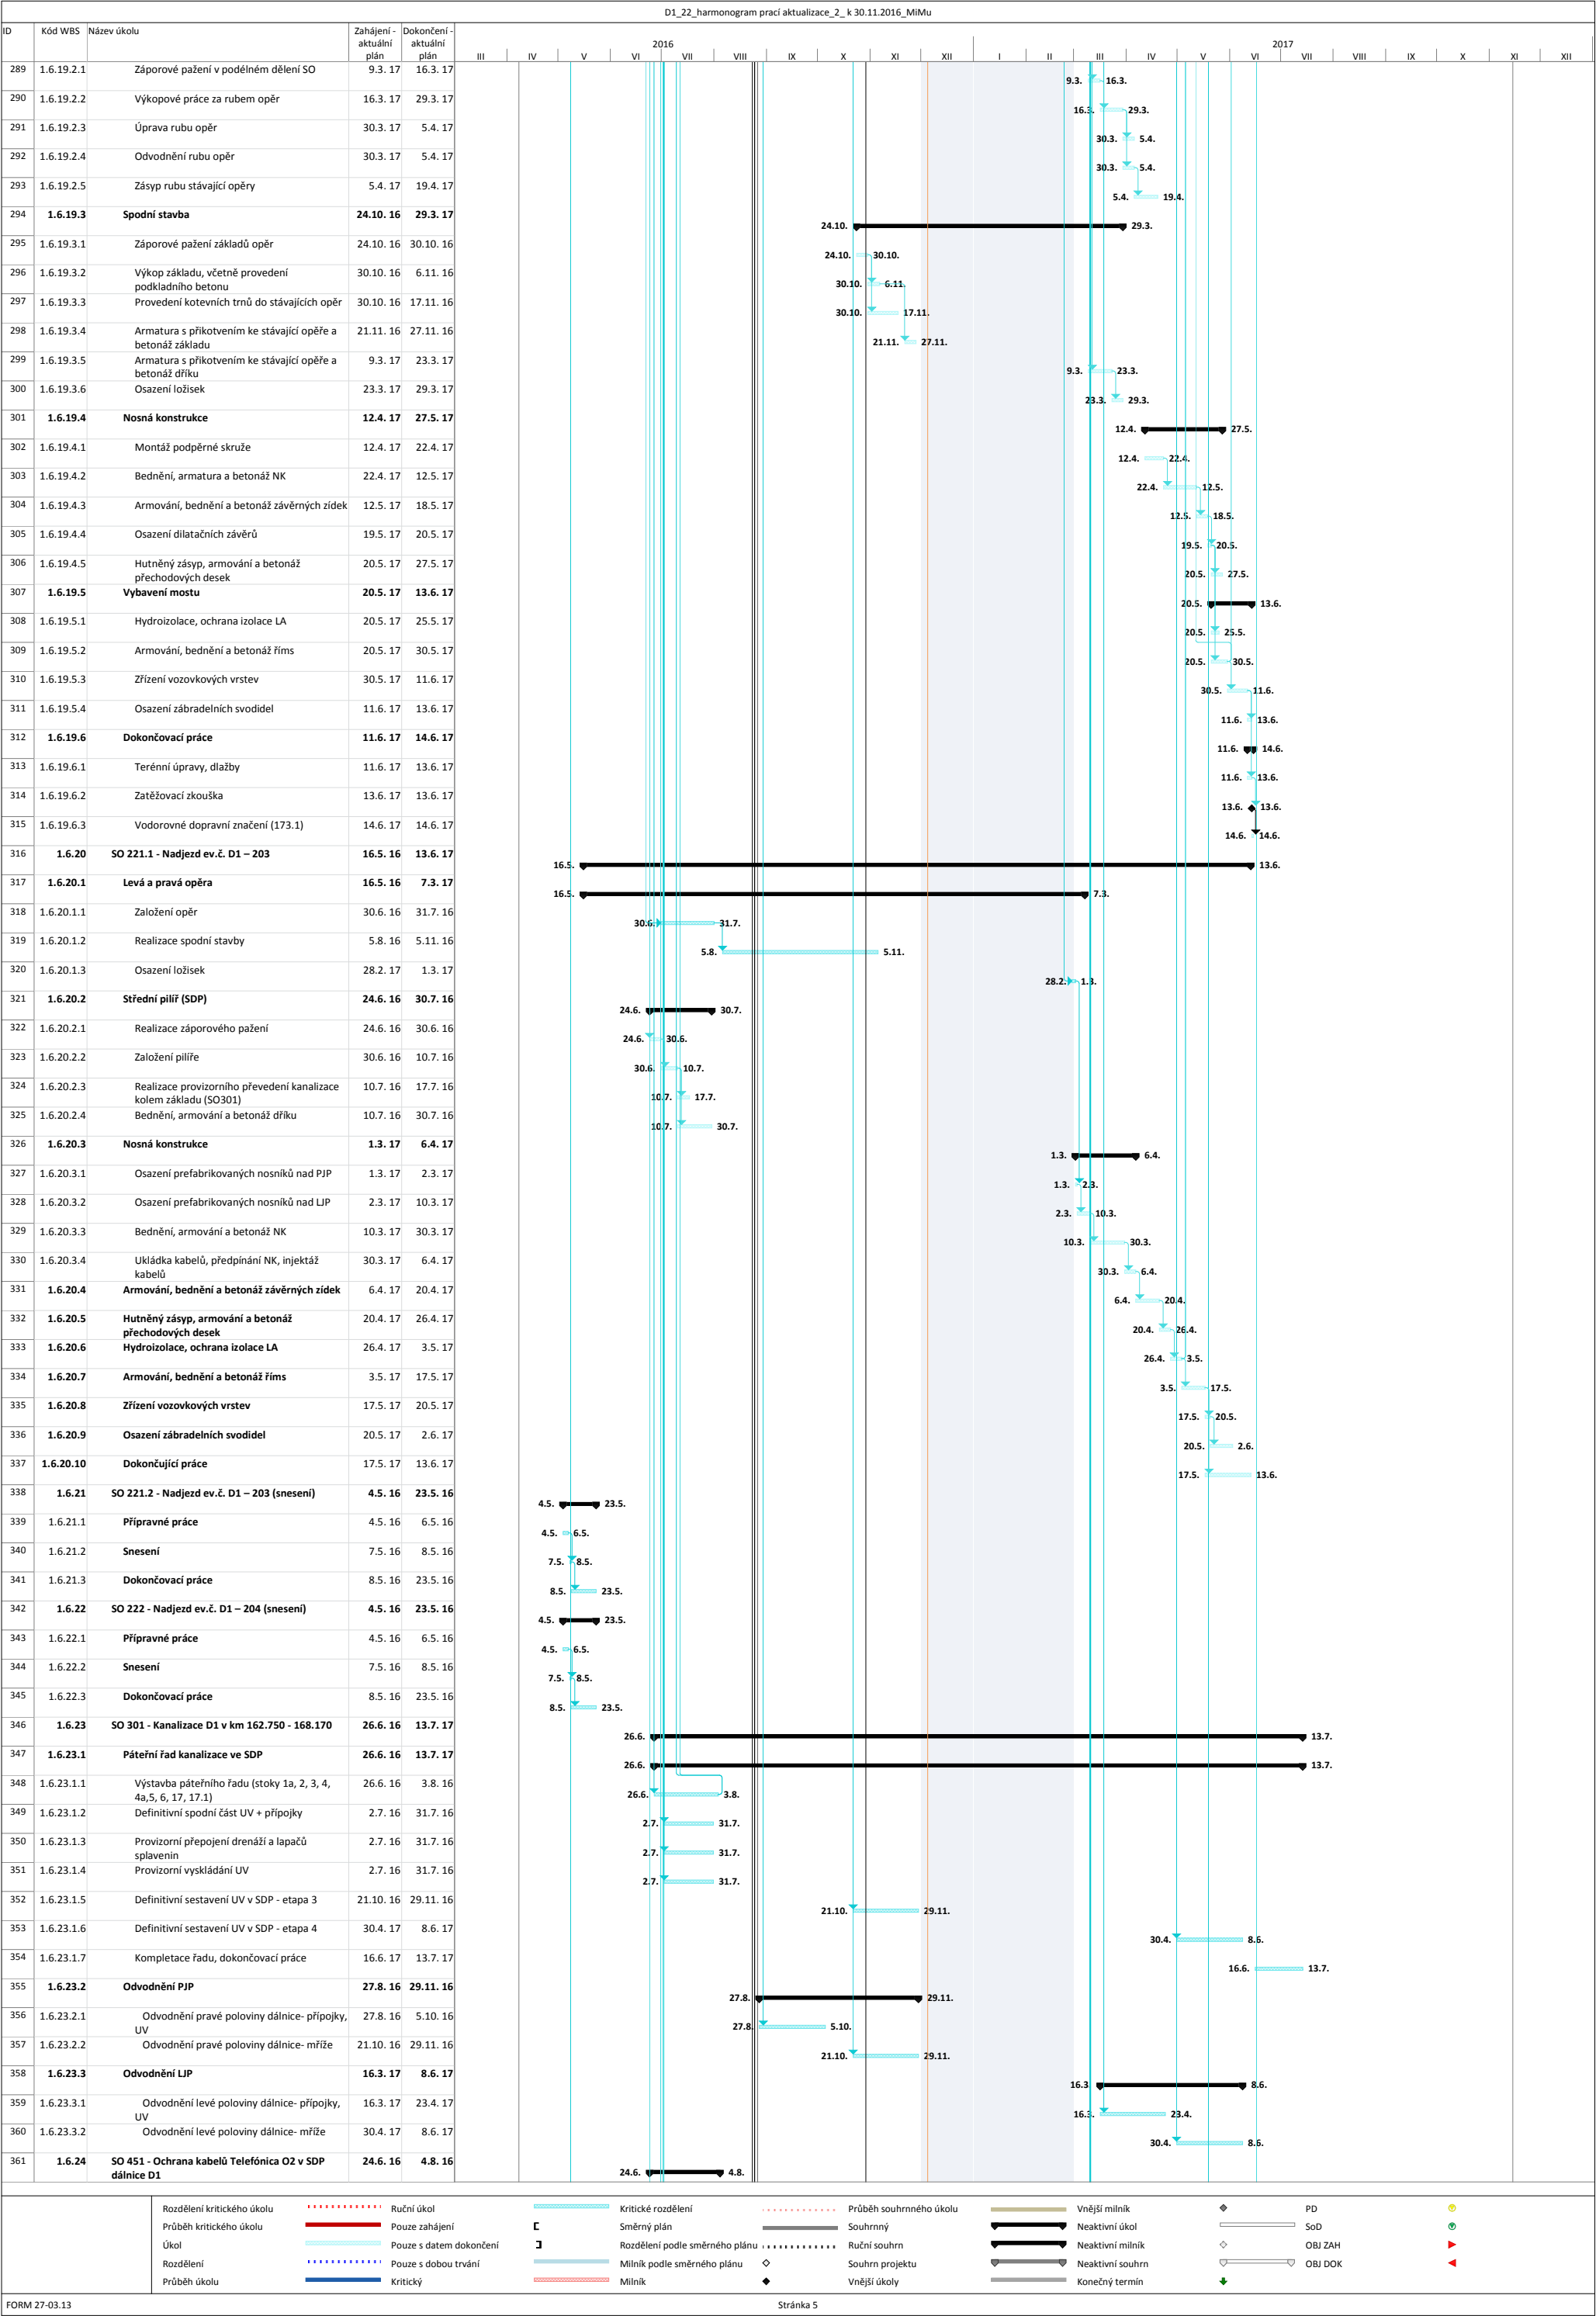

D1_22_harmonogram prací aktualizace_2_k 30.11.2016_MiMu

ID	Kód WBS	Název úkolu	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán
362	1.6.24.1	Provizorní přeložka OK	24.6. 16	19.7. 16
363	1.6.24.2	Definitivní přeložka OK	20.7. 16	4.8. 16
364	1.6.25	SO 490 - Ochrana kabelů ŘSD v SDP dálnice D1 po dobu stavby	24.6. 16	3.7. 17
365	1.6.25.1	Provizorní přeložka	24.6. 16	19.7. 16
366	1.6.25.2	Definitivní přeložka	14.6. 17	3.7. 17
367	1.6.26	SO 491 - Dálniční systém SOS - kabelové vedení	8.5. 16	23.10. 16
368	1.6.26.1	Vedení v SDP	30.6. 16	8.8. 16
369	1.6.26.2	Vedení pravý jízdní pás	26.8. 16	23.10. 16
370	1.6.26.3	Vedení levý jízdní pás	8.5. 16	6.6. 16
371	1.6.27	SO 492 - Dálniční systém SOS - hlášky	2.7. 16	8.4. 17
372	1.6.27.1	Střední dělicí pás (SDP)	2.7. 16	9.8. 16
373	1.6.27.2	Pravá polovina (PJP)	24.8. 16	21.10. 16
374	1.6.27.3	Levá polovina (LJP)	10.3. 17	8.4. 17
375	1.6.28	SO 493 - Dálniční systém SOS - meteorostanice	23.8. 16	7.5. 17
376	1.6.28.1	Základy pravý jízdní pás	23.8. 16	20.10. 16
377	1.6.28.2	Základy levý jízdní pás	10.3. 17	8.4. 17
378	1.6.28.3	Osazení stožárů a zařízení	8.4. 17	7.5. 17
379	1.6.29	SO 494 - Dálniční systém SOS - kabelové šachty a prostupy	30.6. 16	8.4. 17
380	1.6.29.1	Šachty a prostupy v SDP	30.6. 16	29.7. 16
381	1.6.29.2	Šachty a prostupy pravý jízdní pás	24.8. 16	21.10. 16
382	1.6.29.3	Šachty a prostupy levý jízdní pás	11.3. 17	8.4. 17
383	1.6.30	SO 495 - Dálniční systém SOS - trubky pro optické kabely	2.7. 16	8.4. 17
384	1.6.30.1	Trubky v SDP	2.7. 16	30.7. 16
385	1.6.30.2	Trubky pravý jízdní pás	24.8. 16	21.10. 16
386	1.6.30.3	Trubky levý jízdní pás	11.3. 17	8.4. 17
387	1.6.31	SO 496 - Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy	2.7. 16	7.6. 17
388	1.6.31.1	Kabelové vedení	2.7. 16	30.7. 16
389	1.6.31.2	Indukční smyčky ve fréz. drážce vozovky PJP	29.10. 16	17.11. 16
390	1.6.31.3	Indukční smyčky ve fréz. drážce vozovky LJP	19.5. 17	7.6. 17
391	1.6.32	SO 497 - Dálniční systém SOS - optický kabel DIS	19.5. 17	7.6. 17
392	1.6.32.1	Zafouknutí kabelu	19.5. 17	7.6. 17
393	1.6.33	SO 498 - Dálniční systém SOS - kamerový systém	24.8. 16	8.7. 17
394	1.6.33.1	Základy pravý jízdní pás	24.8. 16	21.10. 16
395	1.6.33.2	Osazení stožárů a zařízení	14.6. 17	8.7. 17
396	1.6.34	SO 499 - Úpravy dispečinku SSÚD Domašov	8.5. 16	3.7. 17
397	1.6.34.1	Úpravy dispečinku SSÚD Domašov zahájení	8.5. 16	27.5. 16
398	1.6.34.2	Úpravy dispečinku SSÚD Domašov po dokončení	14.6. 17	3.7. 17
399	1.6.35	SO 801 - Vegetační úpravy	1.11. 16	30.6. 17
400	1.6.35.1	Pravá polovina (PJP)	1.11. 16	1.5. 17
401	1.6.35.1.1	Výsadba křovin a stromů na odpočívce	3.4. 17	1.5. 17
402	1.6.35.1.2	Zatrávnění	1.11. 16	28.11. 16
403	1.6.35.2	Levá polovina (LJP)	1.5. 17	9.6. 17
404	1.6.35.2.1	Výsadba křovin a stromů na odpočívce	1.5. 17	31.5. 17
405	1.6.35.2.2	Zatrávnění	15.5. 17	9.6. 17
406	1.6.35.3	Střední dělicí pás (SDP)	15.6. 17	30.6. 17
407	1.6.35.3.1	Zatrávnění	15.6. 17	30.6. 17
408	1.6.35.4	Náhradní výsadba na pozemcích města Velká Bíteš	1.3. 17	31.5. 17
409	1.6.35.4.1	Výsadba 18 stromů mimo dálnici	1.3. 17	31.5. 17
410	1.7	Termín zprovoznění D1 po dokončení etap 0,1,2 - opravy před stavbou, rozšíření LJP a prací v SDP	9.6. 16	14.8. 16
411	1.7.1	Technické prohlídky dokončeného rozšíření LJP	9.6. 16	9.6. 16
412	1.7.2	Odstranění případných nedodělků z technické prohlídky LJP	10.6. 16	13.6. 16
413	1.7.3	Zprovoznění LJP po provedení rozšíření - etapa 2a	14.6. 16	14.6. 16
414	1.7.4	Technické prohlídky dokončeného SDP	11.8. 16	11.8. 16
415	1.7.5	Odstranění případných nedodělků z technické prohlídky SDP	12.8. 16	13.8. 16
416	1.7.6	Zprovoznění LJP i PJP po provedení prací v SDP - etapa 2b	14.8. 16	

