ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	MJ	Množství	NH	Počet hlavních pracovníků	počet hodin ve směně
1	**Zastřešení bytového domu**	**82,3 dny**	**12.8. 13**	**4.12. 13**			**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Plochá střecha**	**23,24 dny**	**12.8. 13**	**12.9. 13**			**0**	**0**	**0**	**0**
3	zhotovení bednění	0,53 dny	12.8. 13	12.8. 13		m2	25	0,51	3	8
4	dilatace-Mirelon	0,18 dny	12.8. 13	12.8. 13	3SS	m	73	0,04	2	8
5	betonáž Perlit-betonu(spádový)	1,07 dny	12.8. 13	13.8. 13	4	m3	7,16	3,57	3	8
6	odstranění bednění	0,23 dny	16.8. 13	16.8. 13	5FS+3 dny	m2	25	0,22	3	8
7	penetrační nátěr	0,6 dny	27.8. 13	28.8. 13	6FS+7 dny	m2	95,44	0,1	2	8
8	montáž parozábrany Vedatec	0,5 dny	28.8. 13	28.8. 13	7FS+0,3 dny	m2	99,38	0,12	3	8
9	osazení vtoků Topwet	0,06 dny	28.8. 13	28.8. 13	8SS	ks	4	0,23	2	8
10	montáž tep. Izolace EPS	0,95 dny	28.8. 13	29.8. 13	8	m2	95,44	0,24	3	8
11	lepení přidané hydroizolace na EPS	0,6 dny	29.8. 13	30.8. 13	10	m2	95,44	0,15	3	8
12	montáž tep. Izolace na atiku EPS 70 tl.50mm	1,68 dny	30.8. 13	3.9. 13	11FS+0,3 dny	m2	64,88	0,62	3	8
13	montáž atikového klínu	0,2 dny	3.9. 13	3.9. 13	12	m	68,25	0,07	3	8
14	položení hydroizolace Parafor Solo GS	0,91 dny	3.9. 13	4.9. 13	13FS+0,3 dny	m2	108,85	0,2	3	8
15	montáž nástavce vtoku	0,04 dny	4.9. 13	4.9. 13	14	ks	4	0,23	3	8
16	posyp křemíkem izolace	0,12 dny	4.9. 13	4.9. 13	15;14	m2	95,44	0,01	1	8
17	položení ochranné textilie geoNETEX	0,48 dny	9.9. 13	10.9. 13	16FS+3 dny	m2	95,44	0,12	3	8
18	nanesení kačírku	0,01 dny	10.9. 13	10.9. 13	17	m3	7,16	0,02	3	8
19	oplechování atiky	1,63 dny	10.9. 13	12.9. 13	18	m	19,85	1,31	2	8
20	oplechování, dělící vrstva zdí	0,14 dny	12.9. 13	12.9. 13	19	m	19,85	0,11	2	8
21	**valbová střecha 2a**	**36,21 dny**	**13.9. 13**	**4.11. 13**			**0**	**0**	**0**	**0**
22	montáž pozednic 140/160	0,89 dny	13.9. 13	16.9. 13	20FS+1 den	m	69,3	0,41	4	8
23	montáž ocelových sloupků 2xU100	4,45 dny	16.9. 13	20.9. 13	22	m	36,4	3,91	4	8
24	montáž o. vaznic 2xU240	1,63 dny	20.9. 13	24.9. 13	23	m	13,3	3,91	4	8
25	montáž o. vaznice 2xU160	1,17 dny	24.9. 13	25.9. 13	24	m	9,6	3,91	4	8
26	montáž o. vaznic 2xU180	0,44 dny	25.9. 13	25.9. 13	25	m	3,6	3,91	4	8
27	montáž o. vaznice 2xU180	0,9 dny	25.9. 13	26.9. 13	26	m	7,4	3,91	4	8
28	montáž o. vaznice 2xU160	0,64 dny	26.9. 13	27.9. 13	27	m	5,2	3,91	4	8
29	montáž o. vaznice 2xU200	1,64 dny	27.9. 13	30.9. 13	28	m	13,4	3,91	4	8
30	montáž d. vaznic u v. šachty	0,1 dny	1.10. 13	1.10. 13	29	m	4	0,41	2	8
31	montáž kleštin 80/180	0,6 dny	1.10. 13	1.10. 13	30	m	53,58	0,36	4	8
32	montáž d. nárožních krokví 200/260	0,69 dny	1.10. 13	2.10. 13	31	m	44,77	0,49	4	8
33	montáž d. krokví 100/180	3,89 dny	2.10. 13	8.10. 13	32	m	345,95	0,36	4	8
34	montáž d. bednění 22mm	2,36 dny	8.10. 13	10.10. 13	33	m2	279,51	0,27	4	8
35	montáž d. sloupků vikýře	0,14 dny	10.10. 13	10.10. 13	34	m	18,47	0,25	4	8
36	montáž d. desek stěn vikýře 12mm	0,16 dny	10.10. 13	10.10. 13	35	m2	19,32	0,27	4	8
37	tepelná izolace stěn vikýře	0,05 dny	10.10. 13	10.10. 13	36FF	m2	9,66	0,16	4	8
38	montáž kontralatí vikýře	0,06 dny	10.10. 13	10.10. 13	37	m	29,45	0,06	4	8
39	montáž bednení vikýře	0,53 dny	11.10. 13	11.10. 13	38	m2	63,15	0,27	4	8
40	montáž hydroizolace střechy	1,05 dny	11.10. 13	14.10. 13	39	m2	279,51	0,12	4	8
41	montáž kontralatí střechy	0,56 dny	16.10. 13	17.10. 13	40FS+2 dny	m	301,19	0,06	4	8
42	montáž latování	3,99 dny	17.10. 13	23.10. 13	41	m	798,09	0,16	4	8
43	motnáž střešních oken	0,21 dny	23.10. 13	23.10. 13	42	ks	7	0,47	2	8
44	montáž krytiny Bramac	3,67 dny	23.10. 13	29.10. 13	43	m2	279,51	0,42	4	8
45	montáž prostisněhových zábran	0,15 dny	29.10. 13	29.10. 13	44	ks	48	0,3	4	8
46	montáž pro odvětrání	0,05 dny	29.10. 13	29.10. 13	44	ks	3	0,25	2	8
47	montáž hřebene	0,12 dny	29.10. 13	29.10. 13	46	m	11,28	0,35	4	8
48	montáž nároží	0,62 dny	29.10. 13	29.10. 13	47	m	43,19	0,46	4	8
49	oplechování komína	0,27 dny	29.10. 13	30.10. 13	48	m	8,6	0,5	2	8
50	montáž plechové krytiny	1,62 dny	30.10. 13	31.10. 13	49	m2	63,15	0,82	4	8
51	montáž okapových systémů	0,48 dny	31.10. 13	1.11. 13	50	m	59,28	0,26	4	8
52	montáž odpadních trub	0,43 dny	1.11. 13	1.11. 13	51	m	48	0,29	4	8
53	montáž TI vikýře	0,32 dny	1.11. 13	1.11. 13	52	m2	63,15	0,16	4	8
54	montáž podbednění vikýře tl. 12mm	0,53 dny	1.11. 13	4.11. 13	53	m2	63,15	0,27	4	8
55	**valbová střecha 2b**	**21,85 dny**	**4.11. 13**	**4.12. 13**			**0**	**0**	**0**	**0**
56	osazení GANG-NAIL Vazniků	9,39 dny	4.11. 13	15.11. 13	54	m3	261,34	1,15	4	8
57	montáž bednění OSB tl.22mm	1,82 dny	15.11. 13	19.11. 13	56	m2	215,69	0,27	4	8
58	montáž difuzní izolace	0,81 dny	19.11. 13	20.11. 13	57	m2	215,69	0,12	4	8
59	montáž kontra-latí	0,43 dny	22.11. 13	22.11. 13	58FS+2 dny	m	226,8	0,06	4	8
60	montáž latování	3,5 dny	22.11. 13	28.11. 13	59	m	699,4	0,16	4	8
61	montáž krytiny Bramac	2,83 dny	28.11. 13	3.12. 13	60	m2	215,69	0,42	4	8
62	montáž protisněhových zábran	0,25 dny	3.12. 13	3.12. 13	61	ks	32	0,25	4	8
63	montáž tvarovek pro odvětrání	0,05 dny	3.12. 13	3.12. 13	62	ks	3	0,25	2	8
64	montáž hřebene	0,03 dny	3.12. 13	3.12. 13	63	m	1,45	0,35	2	8
65	montáž nároží	0,56 dny	3.12. 13	4.12. 13	64	m	38,68	0,46	4	8
66	montáž oplechování komína	0,18 dny	3.12. 13	3.12. 13	61	m	5,88	0,5	2	8
67	montáž okapového systému	0,47 dny	3.12. 13	3.12. 13	66	m	58,2	0,26	4	8
68	montáž odpadních trub	0,42 dny	3.12. 13	4.12. 13	67	m	46	0,29	4	8

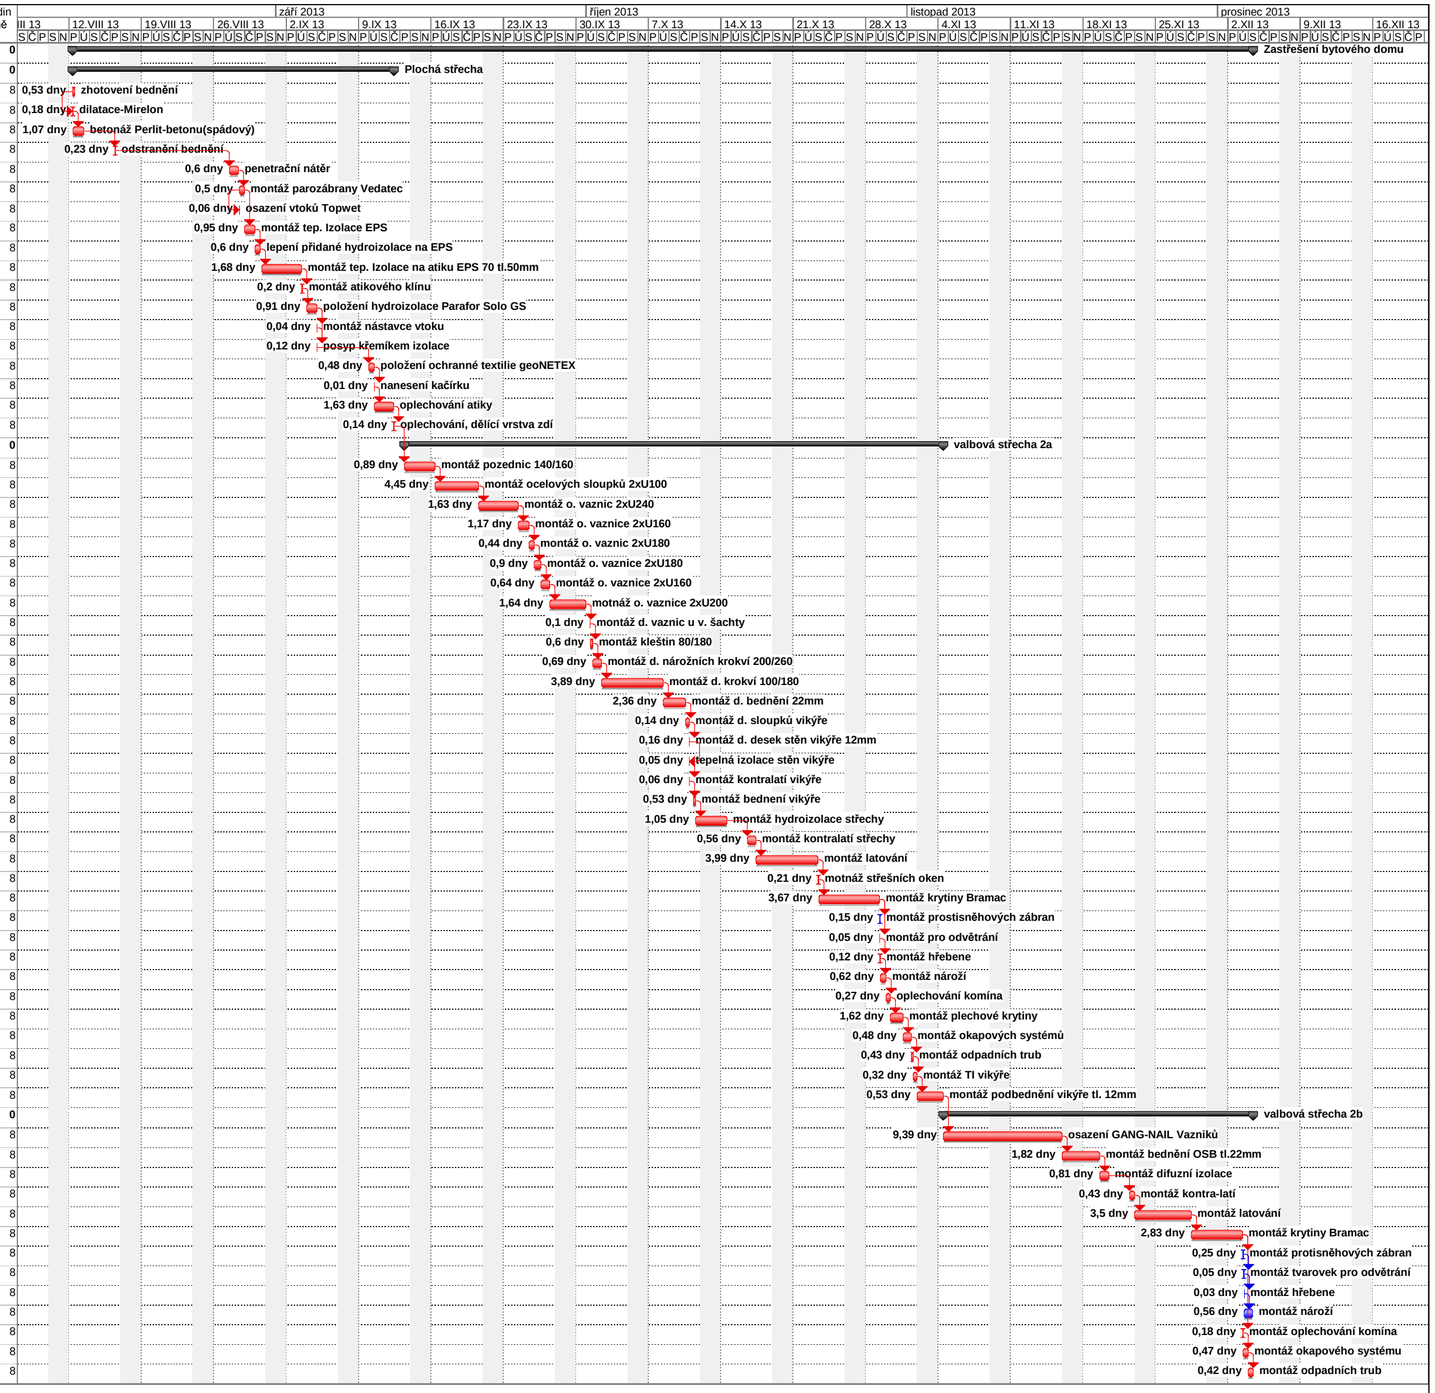

Projekt: Bytový dům Praha 8

Úkol | Kritický úkol | Souhrnný

CAHLÍK JAKUB
PŘÍLOHA: B5
