CONTEC - Časový graf akce: 08120001 Sociální bydlení Stařeč

8.1.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
10	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 1	5	1	0	1.3.21	5.3.21
20	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY 1	5	2	0	8.3.21	19.3.21
30	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 1	2	1	0	22.3.21	26.3.21
40	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1	3	1	2	8.3.21	12.3.21
50	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1	3	2	6	15.3.21	26.3.21
60	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1	11	1	0	29.3.21	2.4.21
70	PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1	2	1	0	5.4.21	9.4.21
80	KANALIZACE LEŽATÁ 1	2	1	0	12.4.21	16.4.21
90	ČERPÁNÍ VODY 1	1	4	2	8.3.21	2.4.21
100	PĚNOVÉ SKLO 1	11	1	0	19.4.21	23.4.21
110	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1	6	1	0	26.4.21	30.4.21
120	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1	6	1	0	3.5.21	7.5.21
130 MILNIK	MILNÍK Č.1 1 SPODNÍ STAVBA	0	1	0	14.5.21	14.5.21
140	ZÁKLADY 1	11	2	0	10.5.21	21.5.21
150	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 1	3	2	1	10.5.21	21.5.21
160	ZDI NOSNÉ 1.NP 1	8	3	0	31.5.21	18.6.21
170	STROPY 1.NP 1	10	2	0	21.6.21	2.7.21
180	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 1	6	1	1	21.6.21	25.6.21
190	SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ 1	6	1	0	7.7.21	9.7.21
200	ZDI NOSNÉ 2.NP 1	8	3	0	19.7.21	6.8.21
210 MILNIK	MILNÍK Č.2 1 NOS. KCE VRCH. S	0	1	0	13.8.21	13.8.21
220	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 1 vazníky	6	1	0	9.8.21	13.8.21
230	PODHLEDY NAD 2.NP 1	6	1	2	16.8.21	20.8.21
240	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 1	6	3	0	16.8.21	3.9.21
250	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1	6	1	7	6.9.21	10.9.21
260	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1	4	1	0	6.9.21	10.9.21
270	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1	4	1	0	13.9.21	17.9.21
280	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 1	2	1	1	30.8.21	3.9.21
290	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1	2	1	0	20.9.21	24.9.21
300	PRŮDUCHY KOMÍN 1	2	1	1	9.8.21	13.8.21
310 MILNIK	MILNÍK Č.3 1 ZASTŘEŠENÍ	0	1	0	1.10.21	1.10.21
320	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1	8	4	1	9.8.21	3.9.21
330	VÝPLNĚ OTVORŮ 1	8	1	0	6.9.21	10.9.21
340	KANALIZACE VNITŘNÍ 1	4	1	0	13.9.21	17.9.21
350	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1	6	2	0	20.9.21	1.10.21
360	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1	2	1	0	4.10.21	8.10.21
370	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 1	2	1	0	11.10.21	15.10.21
380	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1	4	1	0	13.9.21	17.9.21
390	ARMATURY ÚT 1	2	1	0	20.9.21	24.9.21
400	OTOPNÁ TĚLESA 1	4	1	0	27.9.21	1.10.21
410	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 1	2	1	0	4.10.21	8.10.21
420	KOTELNY ÚT 1	2	1	0	11.10.21	15.10.21
430	VÝTAH 1	2	1	7	20.9.21	24.9.21
440	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1	8	3	0	18.10.21	5.11.21
450	SLABOPROUD VODIČE 1	2	1	0	8.11.21	12.11.21
460	VZDUCHOTECHNIKA 1	4	1	0	18.10.21	22.10.21
470 MILNIK	MILNÍK Č.4 1 VNITŘ. TECH. VYB	0	1	0	19.11.21	19.11.21
480	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 1	6	1	0	25.10.21	29.10.21
490	TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY 1	8	3	0	1.11.21	19.11.21
500	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1	8	2	0	8.11.21	19.11.21
510	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1	2	1	0	22.11.21	26.11.21
520	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1	8	3	0	22.11.21	10.12.21
530	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1	1	1	2	13.12.21	17.12.21
540	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1	6	3	0	13.12.21	31.12.21
550	OBKLADY VNITŘNÍ 1	3	2	1	3.1.22	14.1.22
560	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1	3	2	1	10.1.22	21.1.22
570	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1	2	1	0	10.1.22	14.1.22
580	MALBY VNITŘNÍ 1	3	1	0	17.1.22	21.1.22
590	PODLAHY POVLAKOVÉ 1	4	1	0	24.1.22	28.1.22
600	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1	4	1	1	31.1.22	4.2.22
610	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1	4	1	0	24.1.22	28.1.22
620	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1	2	1	0	31.1.22	4.2.22
630	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 1	2	1	0	7.2.22	11.2.22
640	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1	2	2	0	31.1.22	11.2.22
650	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ 1	2	1	0	31.1.22	4.2.22
660	SILNOPROUD KOMPLETACE 1	2	1	0	7.2.22	11.2.22
670	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1	2	2	0	14.2.22	25.2.22
680	SCHODIŠTĚ 1 venkovní ocelové	4	2	0	14.2.22	25.2.22
690 MILNIK	MILNÍK Č.5 1 DOK. HL. OBJ.	0	1	0	4.3.22	4.3.22
700	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1	6	1	0	28.2.22	4.3.22
710	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1	1	1	0	7.3.22	11.3.22

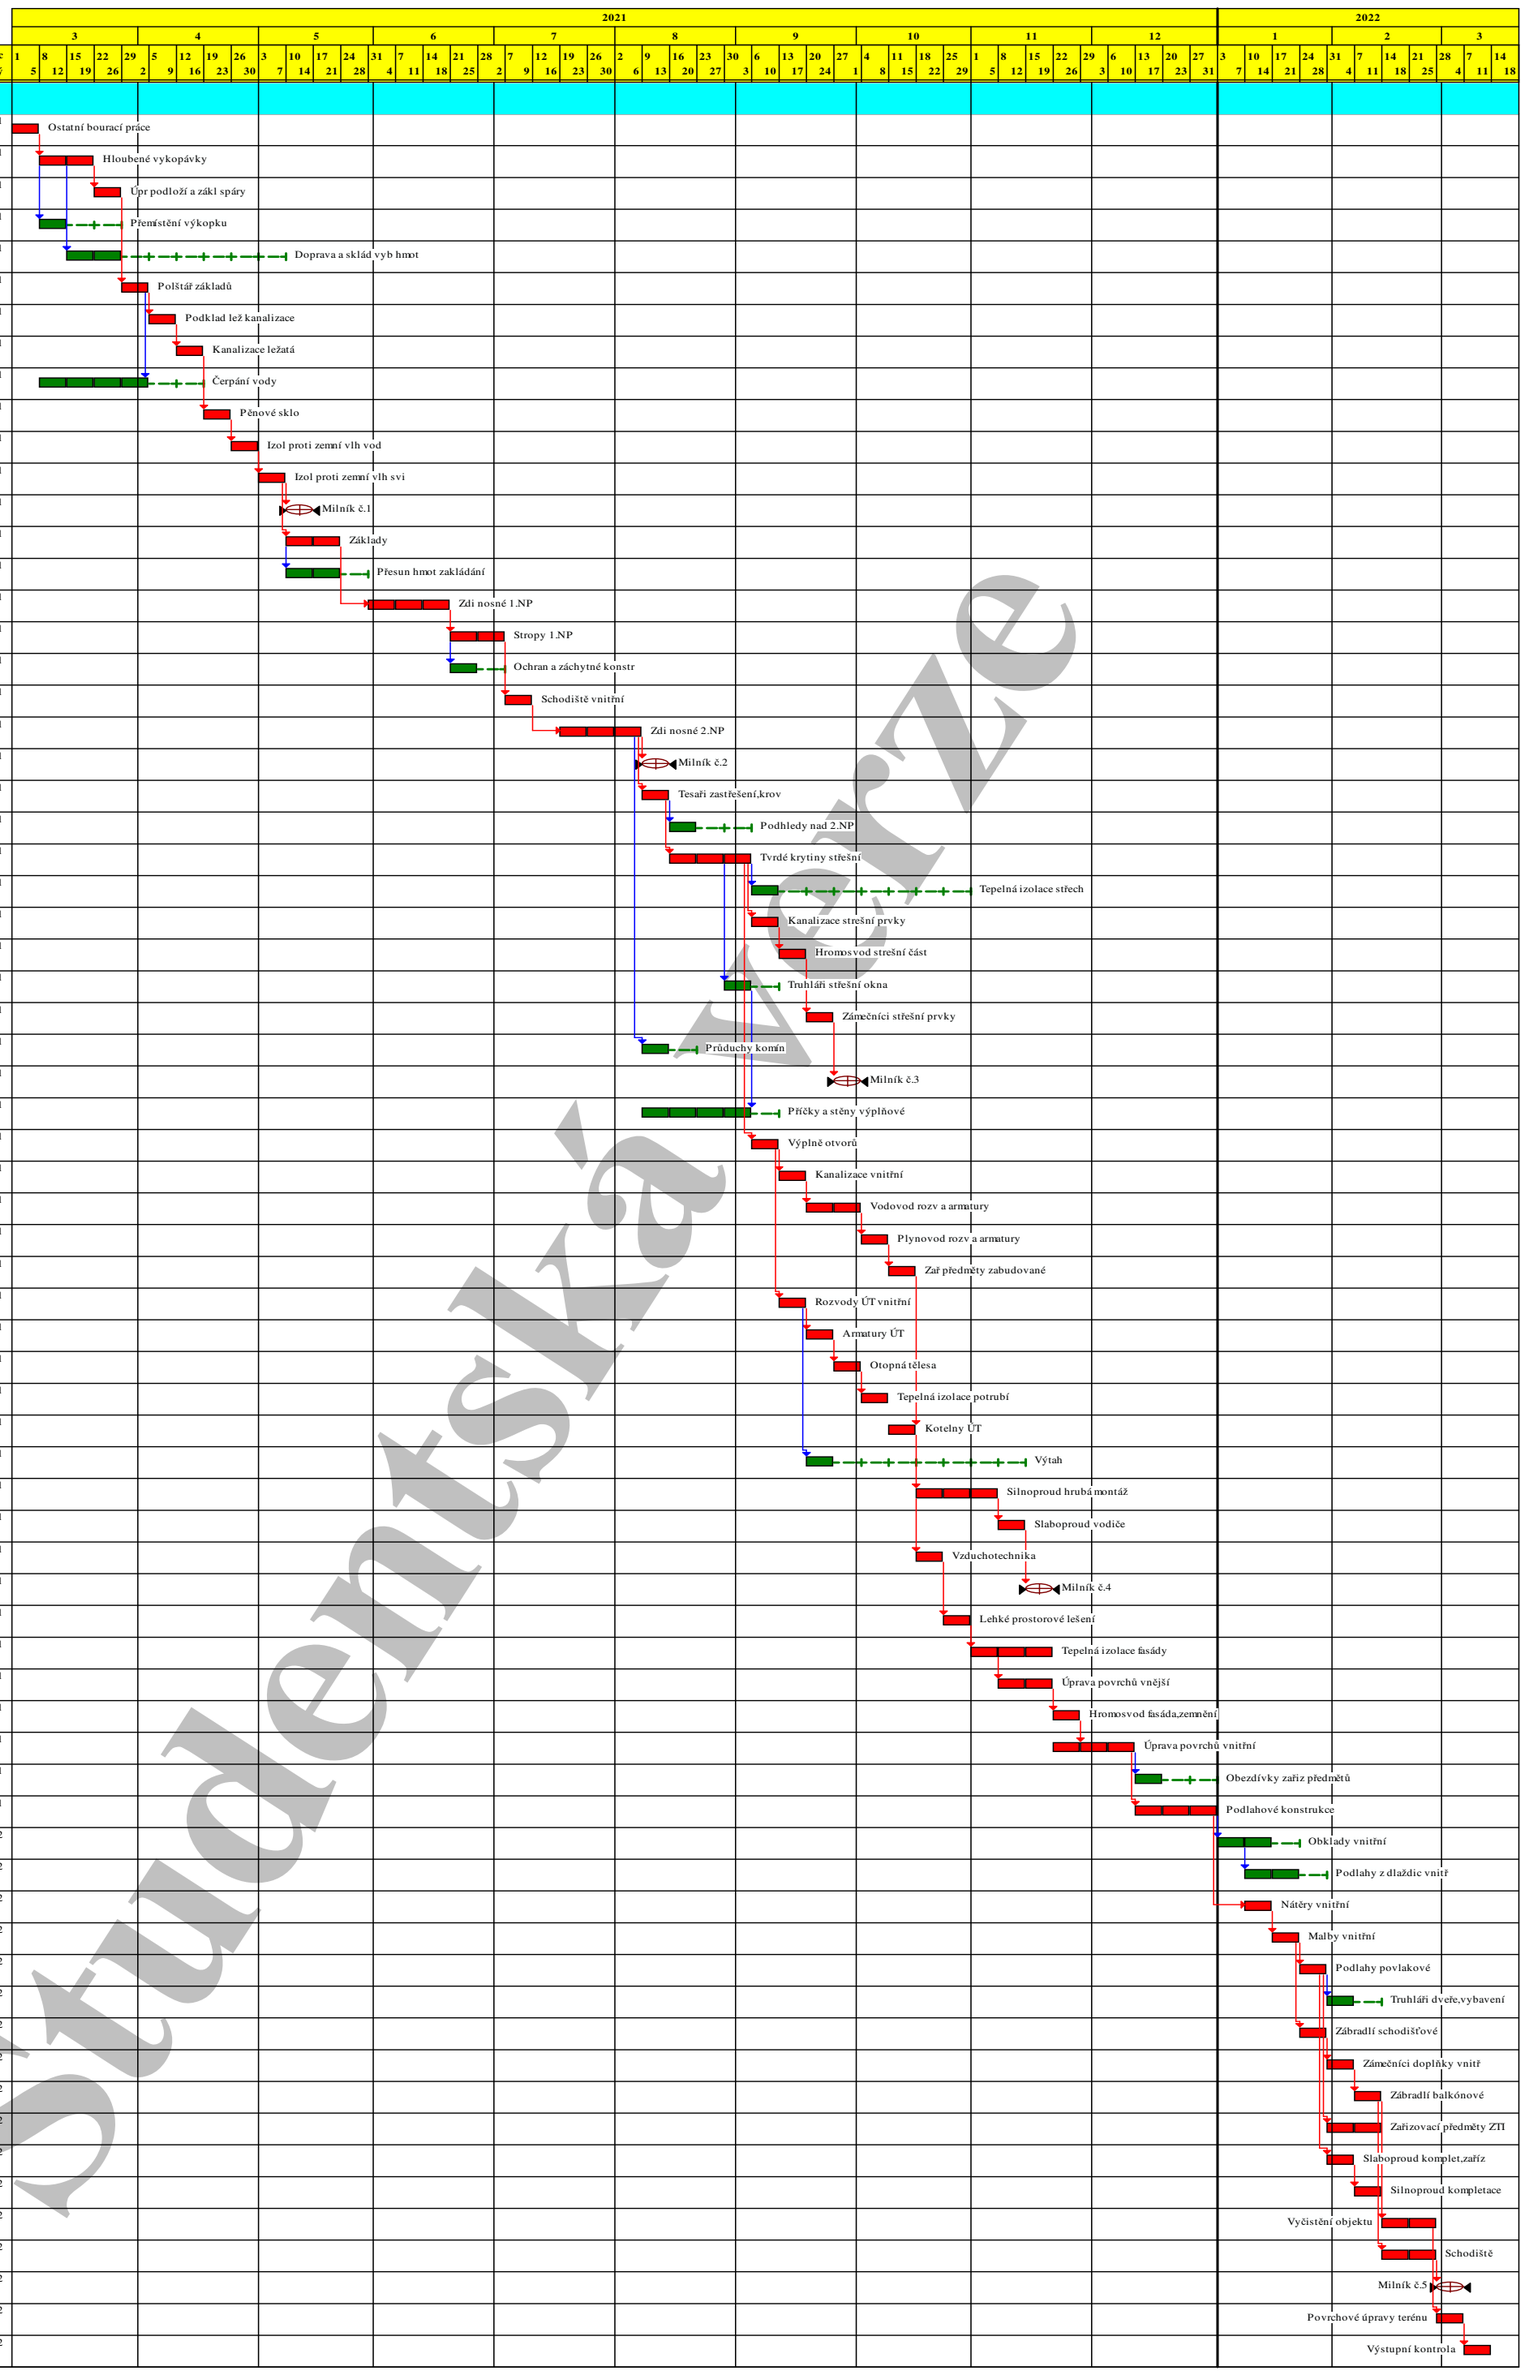

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Studentská verze
