ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Množství	MJ
3	Skrývka ornice	1,97 dny	1.2. 17	2.2. 17	1579,89	m3
4	Likvidace původní komunikace	5,69 dny	2.2. 17	10.2. 17	649,79	m2
5	Montáž mobilního oplocení	0,87 dny	10.2. 17	13.2. 17	139	bm
6	Zřízení zařízení staveniště	1 den	13.2. 17	14.2. 17	1	den
7	Vytyčení staveniště	1 den	14.2. 17	15.2. 17	1	
8	Hloubení jámy	14,53 dny	15.2. 17	8.3. 17	3875,05	m3
9	Štěrkopísek stavební jámy	7,48 dny	8.3. 17	17.3. 17	315	m3
10	Základové pasy rampy - podsyp	0,05 dny	17.3. 17	17.3. 17	13,79	m2
11	Základové pasy rampy - bednění	1,01 dny	17.3. 17	20.3. 17	34,96	m2
12	Základové pasy rampy - armování	0,36 dny	20.3. 17	20.3. 17	2,46	100 kg
13	Základové pasy rampy - betonáž	0,56 dny	20.3. 17	21.3. 17	8,38	m3
14	Základové pasy rampy - technologcká přestávka	3 dny	21.3. 17	24.3. 17	3	den
15	Základové pasy rampy - odbednění	0,52 dny	24.3. 17	27.3. 17	34,96	m2
16	Základová stěna rampy	0,52 dny	27.3. 17	27.3. 17	16,71	m3
17	Zásyp do -2,800	0,13 dny	27.3. 17	27.3. 17	17,04	m3
18	Piloty 1 až 14 (P3)	4,97 dny	8.3. 17	15.3. 17	20	bm
19	Piloty 1 až 14 (P2)	11,94 dny	15.3. 17	30.3. 17	48	bm
20	Kalichy pilot - podbetonávka	0,08 dny	30.3. 17	31.3. 17	1,27	m3
21	Kalichy pilot - bednění	1,22 dny	31.3. 17	3.4. 17	42,3	m2
22	Kalichy pilot - armování	6,73 dny	3.4. 17	11.4. 17	46,4	100 kg
23	Kalichy pilot - betonáž	2,59 dny	12.4. 17	14.4. 17	16,31	m3
24	Kalichy pilot - technologická přestávka	0,38 dny	14.4. 17	14.4. 17	3	den
25	Kalichy pilot - odbednění	0,63 dny	14.4. 17	17.4. 17	42,3	m2
26	Zásyp do -2,100	2,48 dny	17.4. 17	20.4. 17	330,39	m3
27	Mikropiloty E2	7,2 dny	20.4. 17	1.5. 17	45	bm
28	Beton mezi kalichy pilot 3 až 12 - bednění	1,84 dny	1.5. 17	3.5. 17	64,12	m2
29	Beton mezi kalichy pilot 3 až 12 - betonáž	0,41 dny	3.5. 17	3.5. 17	6,2	m3
30	Beton mezi kalichy pilot 3 až 12- technologická přestávka	3 dny	3.5. 17	8.5. 17	3	den
31	Beton mezi kalichy pilot 3 až 12 - odbednění	0,96 dny	8.5. 17	9.5. 17	64,12	m2
32	Zásyp do -1,850	1,72 dny	9.5. 17	11.5. 17	229,12	m3
33	Základové pasy rampy 2 - podsyp	0,03 dny	11.5. 17	11.5. 17	8,89	m2
34	Základové pasy rampy 2 - bednění	0,85 dny	11.5. 17	12.5. 17	29,62	m2
35	Základové pasy rampy 2 - armování	0,23 dny	12.5. 17	12.5. 17	1,57	100 kg
36	Základové pasy rampy 2 - betonáž	0,35 dny	12.5. 17	12.5. 17	5,3	m3
37	Základové pasy rampy 2 - technologcká přestávka	3 dny	12.5. 17	17.5. 17	3	den
38	Základové pasy rampy 2 - odbednění	0,44 dny	17.5. 17	18.5. 17	29,62	m2
39	Základová stěna rampy	0,12 dny	18.5. 17	18.5. 17	3,7	m3
40	Zásyp do -1,600	1,14 dny	18.5. 17	19.5. 17	151,86	m3
41	Mikropiloty E1	29,6 dny	8.3. 17	18.4. 17	185	bm
42	Mikropiloty E3	12,8 dny	1.5. 17	18.5. 17	80	bm
43	Mikropiloty E4	39,47 dny	19.5. 17	13.7. 17	370	bm
44	Sloupy skeletu 1 až 14	7,36 dny	17.4. 17	26.4. 17	28,04	m3
45	Osazení prahů na jihu	3,61 dny	9.5. 17	15.5. 17	19,51	m3
46	Piloty 15 až 36 (P3)	14,93 dny	30.3. 17	20.4. 17	30	bm
47	Piloty 15 až 36 (P1, P2)	47,76 dny	20.4. 17	27.6. 17	96	bm
48	Kalichy pilot - podbetonávka	0,14 dny	27.6. 17	27.6. 17	2,18	m3
49	Kalichy pilot - bednění	2,28 dny	27.6. 17	30.6. 17	79,2	m2
50	Kalichy pilot - armování	12,34 dny	30.6. 17	18.7. 17	85,07	100 kg
51	Kalichy pilot - betonáž	1,7 dny	18.7. 17	20.7. 17	25,63	m3
52	Kalichy pilot - technologická přestávka	0,38 dny	20.7. 17	20.7. 17	3	den
53	Kalichy pilot - odbednění	1,19 dny	20.7. 17	21.7. 17	79,2	m2
54	Zásyp -1,400	3,17 dny	21.7. 17	26.7. 17	845,77	m2
55	Základové pasy Trafo - bednění	1,07 dny	26.7. 17	27.7. 17	37,09	m2
56	Základové pasy Trafo - armování	0,4 dny	27.7. 17	28.7. 17	2,76	100 kg
57	Základové pasy Trafo - betonáž	1,41 dny	28.7. 17	31.7. 17	8,9	m3
58	Základové pasy Trafo - technologická přestávka	3 dny	31.7. 17	3.8. 17	3	den
59	Základové pasy Trafo - odbednění	0,56 dny	3.8. 17	4.8. 17	37,09	m2
60	Základová stěna Trafo	0,1 dny	4.8. 17	4.8. 17	3,09	m3
61	Zásyp -1200	3,17 dny	4.8. 17	9.8. 17	845,77	m2
62	Základové patky + pasy dělící stěna - bednění	1,58 dny	9.8. 17	11.8. 17	54,83	m2
63	Základové patky + pasy dělící stěna - armování	1,47 dny	11.8. 17	14.8. 17	10,13	100 kg
64	Základové patky + pasy dělící stěna - betonáž	1,17 dny	14.8. 17	15.8. 17	17,68	m3
65	Základové patky + pasy dělící stěna - Technologická přestávka	3 dny	15.8. 17	18.8. 17	3	den
66	Základové patky + pasy dělící stěna - odbednění	0,82 dny	18.8. 17	21.8. 17	54,83	m2
67	Zásyp -0,900	3,17 dny	21.8. 17	24.8. 17	845,77	m2
68	Základové pasy vestavek - bednění	1,44 dny	24.8. 17	28.8. 17	50,1	m2
69	Základové pasy vestavek - armování	0,51 dny	28.8. 17	28.8. 17	3,54	100 kg
70	Základové pasy vestavek - betonáž	0,8 dny	28.8. 17	29.8. 17	12,02	m3
71	Základové pasy vestavek - Technologická přestávka	3 dny	29.8. 17	1.9. 17	3	den
72	Základové pasy vestavek - Odbednění	0,75 dny	1.9. 17	4.9. 17	50,1	m2
73	Sloupy 36, 29	1,3 dny	21.7. 17	24.7. 17	4,95	m3
74	Prahy	0,13 dny	24.7. 17	25.7. 17	2,06	m3
75	Zásyp -0,600	3,17 dny	4.9. 17	7.9. 17	845,77	m2
76	Vedení NN	1,88 dny	7.9. 17	11.9. 17	60,1	bm
77	Zásyp -0,370	3,17 dny	11.9. 17	14.9. 17	845,77	m2
78	Sloupy skeletu	12,21 dny	25.7. 17	10.8. 17	46,5	m3
79	ŽB sendvičové panely	1,78 dny	10.8. 17	14.8. 17	27,32	m3
80	Podkladní beton 70 mm - betonáž	4,66 dny	14.9. 17	21.9. 17	140,62	m3
81	Podkladní beton 70 mm - technologická přestávka	3 dny	21.9. 17	26.9. 17	3	den
82	Hydroizolace	11,55 dny	26.9. 17	11.10. 17	2310,13	m2
83	ŽB deska - armování	5,54 dny	11.10. 17	19.10. 17	114,6	100 kg
84	ŽB deska - betonáž	13,31 dny	19.10. 17	7.11. 17	602,64	m3
85	ŽB deska - technologická přestávka	3 dny	7.11. 17	10.11. 17	3	den

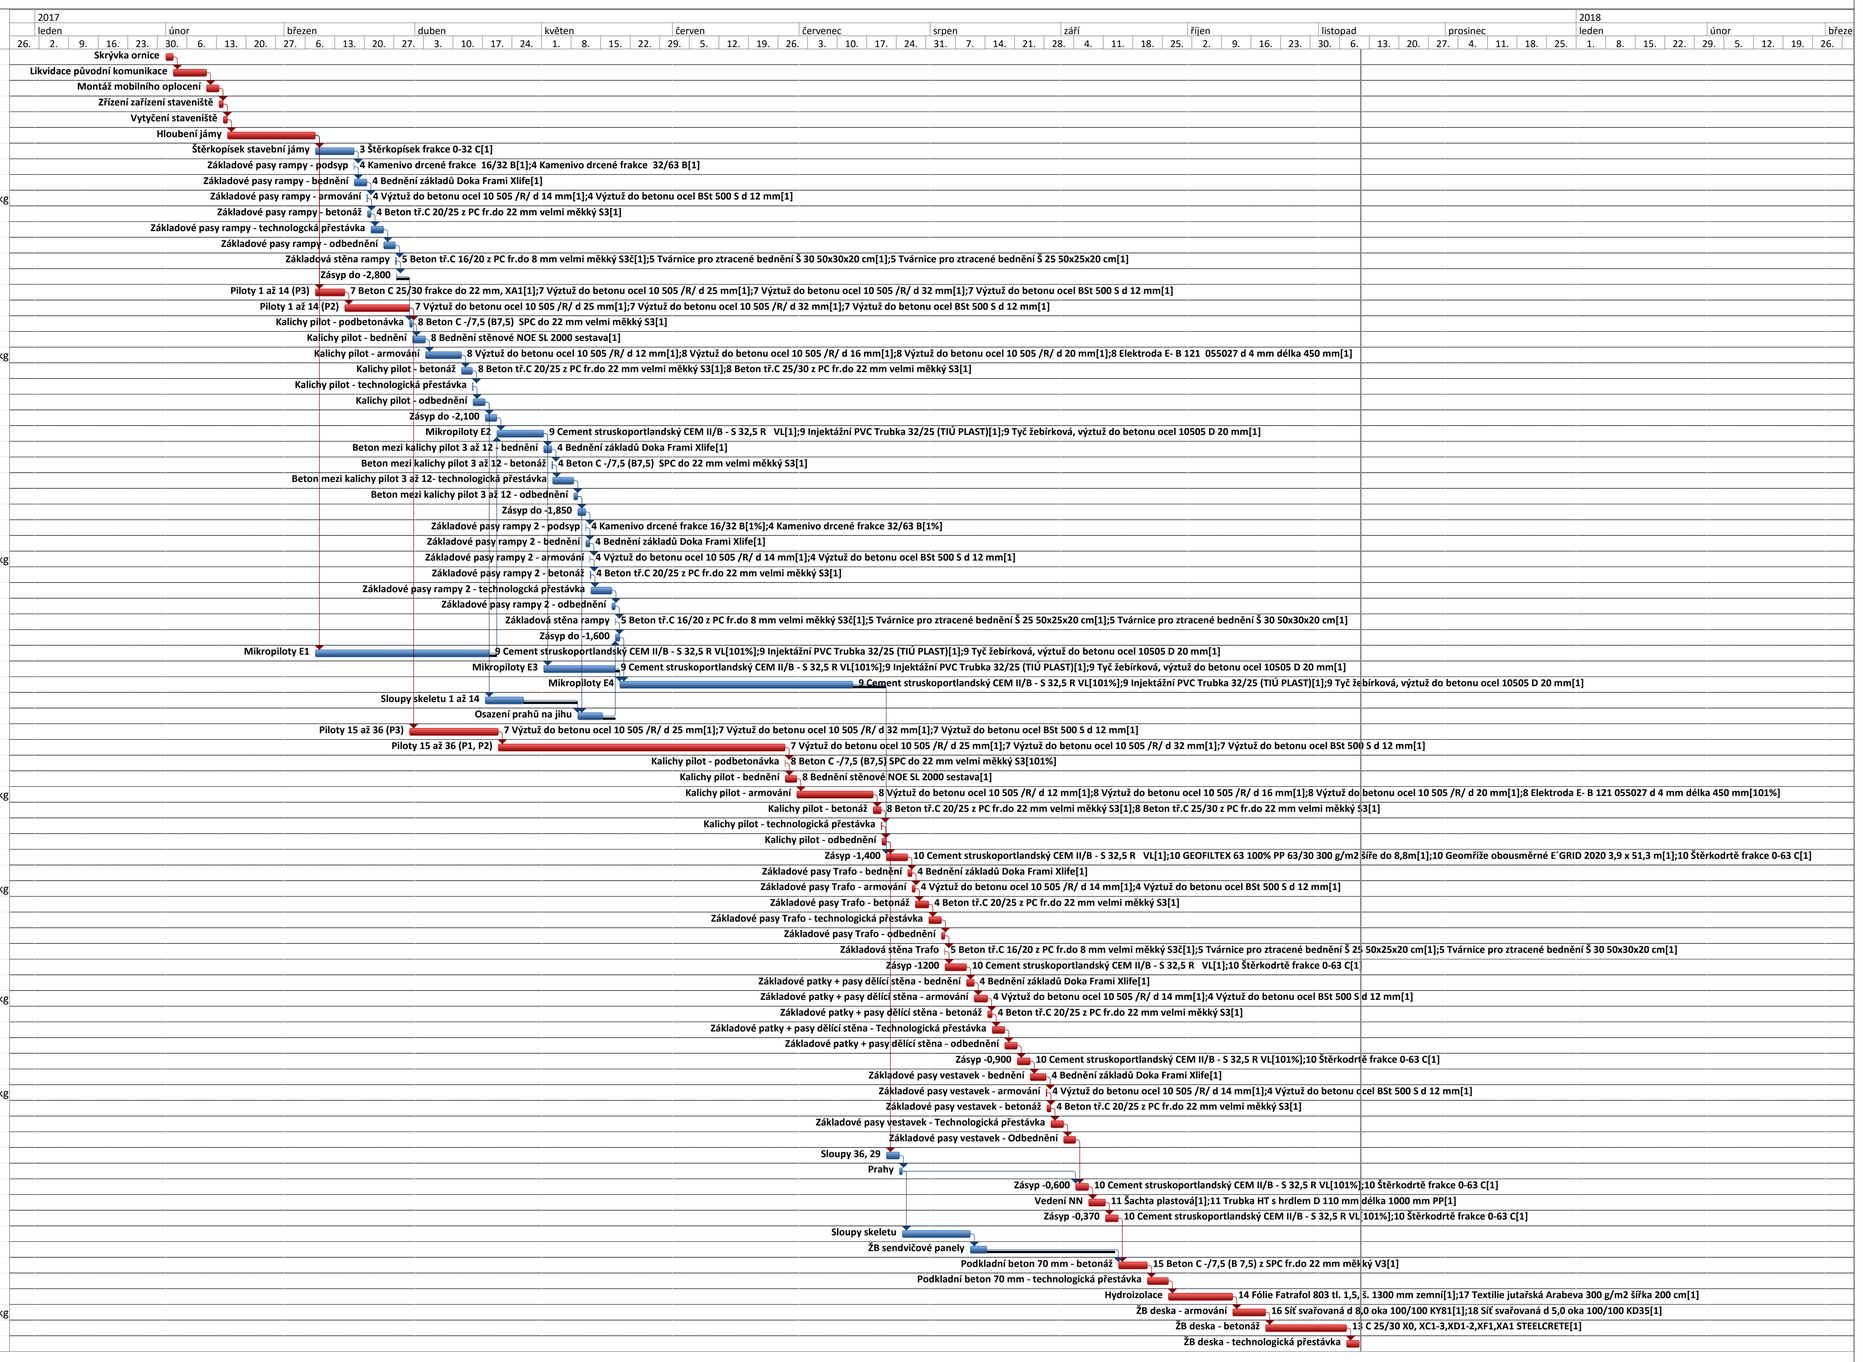

Projekt: B - časový plán spodní sta
Datum: 11.1. 16

Úkol · Souhrnný · Vnější milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Pouze s datem dokončení · Kritické rozdělení
Rozdělení · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Ruční úkol · Ruční souhrn · Konečný termín · Průběh
Milník · Vnější úkoly · Neaktivní milník · Pouze s dobou trvání · Pouze zahájení · Kritický · Časová rezerva
