VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK

CONTEC - Časový graf akce: 00SO00O1 Bytový dom v Bratislave

23.5.19

Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [dni]	Rez. možný	Začátek	Konec možný
Záber 1						
10 MURAR	Steny nosné 1.NP 1 Záber 1	6	4	0	1.4.19	4.4.19
20 MURAR	Osadenie prekladov 1.NP 1 Záber 1	6	1	0	5.4.19	5.4.19
30 TESAR	Deb. ven,prek,čiel 1.NP 1 Záber 1	10	2	0	8.4.19	9.4.19
40 TESAR	Deb. strop,schod 1.NP 1 Záber 1	10	4	0	10.4.19	15.4.19
50 ŽELEZ	Výstuž vence,prekl 1.NP 1 Záber 1	6	1	0	15.4.19	15.4.19
60 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 1.NP 1 Záber 1	6	4	0	16.4.19	19.4.19
70 ŽELEZ	Výstuž schodisko 1.NP 1 Záber 1	2	1	1	22.4.19	22.4.19
80 BETON	Beton strop. dosky 1.NP 1 Záber 1	6	1	0	22.4.19	22.4.19
90 BETON	Beton schodisko 1.NP 1 Záber 1	2	1	1	23.4.19	23.4.19
92 TESAR	Oddeb. ven,prekl 1.NP 1 Záber 1	6	1	1	6.5.19	6.5.19
94 TESAR	Oddebnenie stropu 1.NP 1 Záber 1	6	2	1	7.5.19	9.5.19
96 TESAR	Odstránenie stojok 1.NP 1 Záber 1	6	1	7	4.6.19	4.6.19
100 MURAR	Steny nosné 1.NP 1 Záber 2	6	3	2	8.4.19	10.4.19
110 MURAR	Osadenie prekladov 1.NP 1 Záber 2	6	1	2	11.4.19	11.4.19
120 TESAR	Deb.vene,prekl,čiel 1.NP 1 Záber 2	10	2	0	16.4.19	17.4.19
130 TESAR	Deb. stropu,schod 1.NP 1 Záber 2	10	3	0	18.4.19	22.4.19
140 ŽELEZ	Výstuž vence,prekl 1.NP 1 Záber 2	4	1	1	22.4.19	22.4.19
150 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 1.NP 1 Záber2	6	4	1	23.4.19	26.4.19
160 ŽELEZ	Výstuž schodisko 1.NP 1 Záber 2	2	1	1	29.4.19	29.4.19
170 BETON	Beton strop. dosky 1.NP 1 Záber 2	6	1	2	29.4.19	29.4.19
180 BETON	Beton schodisko 1.NP 1 Záber 2	2	1	4	30.4.19	30.4.19
182 TESAR	Oddeb. ven,prekl 1.NP 1 Záber 2	6	1	3	13.5.19	13.5.19
184 TESAR	Oddebnenie stropu 1.NP 1 Záber 2	6	2	3	14.5.19	15.5.19
186 TESAR	Odstránenie stojok 1.NP 1 Záber 2	6	1	9	12.6.19	12.6.19
190 MURAR	Steny nosné 1.NP 1 Záber 3	6	4	2	12.4.19	17.4.19
200 MURAR	Osadenie prekladov 1.NP 1 Záber 3	6	1	2	18.4.19	18.4.19
210 TESAR	Deb. ven,prekl,čiel 1.NP 1 Záber 3	10	2	0	23.4.19	24.4.19
220 TESAR	Deb. stropu,schod 1.NP 1 Záber 3	10	4	0	25.4.19	30.4.19
230 ŽELEZ	Výstuž vence,prekl 1.NP 1 Záber 3	4	1	1	29.4.19	29.4.19
240 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 1.NP 1 Záber 3	6	4	0	2.5.19	7.5.19
250 ŽELEZ	Výstuž schodiska 1.NP 1 Záber 3	2	1	0	9.5.19	9.5.19
260 BETON	Beton strop. dosky 1.NP 1 Záber 3	6	1	0	9.5.19	9.5.19
270 BETON	Beton schodisko 1.NP 1 Záber 3	2	1	0	10.5.19	10.5.19
272 TESAR	Oddeb. ven,prekl 1.NP 1 Záber 3	6	1	4	21.5.19	21.5.19
274 TESAR	Oddebnenie stropu 1.NP 1 Záber 3	6	2	4	22.5.19	23.5.19
276 TESAR	Odstránenie stojok 1.NP 1 Záber 3	6	1	9	19.6.19	19.6.19
280 MILNIK	HOTOVO 1.NP 1 ZNK, VNK	0	1	0	13.5.19	13.5.19
290 MURAR	Steny nosné 2.NP 1 Záber 1	6	4	0	3.5.19	9.5.19
300 MURAR	Osadenie prekladov 2.NP 1 Záber 1	6	1	0	10.5.19	10.5.19
310 TESAR	Deb vene,prekl,čiel 2.NP 1 Záber 1	10	2	0	13.5.19	14.5.19
320 TESAR	Deb stropu,schod 2.NP 1 Záber 1	10	4	0	15.5.19	20.5.19
330 ŽELEZ	Výstuž vence,prekl 2.NP 1 Záber 1	4	1	0	21.5.19	21.5.19
340 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 2.NP 1 Záber 1	6	4	0	22.5.19	27.5.19
350 TESAR	Výstuž schodiska 2.NP 1 Záber 1	2	1	0	28.5.19	28.5.19
360 BETON	Beton strop. doska 2.NP 1 Záber 1	6	1	0	28.5.19	28.5.19
370 BETON	Beton schodisko 2.NP 1 Záber 1	2	1	5	29.5.19	29.5.19
372 TESAR	Oddeb ven,prekl 2.NP 1 Záber 1	6	1	4	7.6.19	7.6.19
374 TESAR	Oddebnenie stropu 2.NP 1 Záber 1	6	2	4	10.6.19	11.6.19
376 TESAR	Odstránenie stojok 2.NP 1 Záber 1	6	1	7	9.7.19	9.7.19
380 MURAR	Steny nosné 2.NP 1 Záber 2	6	3	2	13.5.19	15.5.19
390 MURAR	Osadenie prekladov 2.NP 1 Záber 2	6	1	2	16.5.19	16.5.19
400 TESAR	Deb. ven,prekl,čiel 2.NP 1 Záber 2	10	2	0	21.5.19	22.5.19
410 TESAR	Deb. stropu,schod 2.NP 1 Záber 2	10	3	0	23.5.19	27.5.19
420 ŽELEZ	Výstuž ven,prek 2.NP 1 Záber 2	4	1	0	28.5.19	28.5.19
430 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 2.NP 1 Záber 2	6	4	0	29.5.19	3.6.19
440 ŽELEZ	Výstuž schodiska 2.NP 1 Záber 2	2	1	0	4.6.19	4.6.19
450 BETON	Beton strop. dosky 2.NP 1 Záber 2	6	1	2	4.6.19	4.6.19
460 BETON	Beton schodisko 2.NP 1 Záber 2	2	1	3	5.6.19	5.6.19
462 TESAR	Oddeb. ven,prekl 2.NP 1 Záber 2	6	1	5	14.6.19	14.6.19
464 TESAR	Oddebnenie stropu 2.NP 1 Záber 2	6	2	5	17.6.19	18.6.19
466 TESAR	Odstránenie stojok 2.NP 1 Záber 2	6	1	9	16.7.19	16.7.19
470 MURAR	Steny nosné 2.NP 1 Záber 3	6	3	1	21.5.19	23.5.19
480 MURAR	Osadenie prekladov 2.NP 1 Záber 3	6	1	1	24.5.19	24.5.19
490 TESAR	Deb ven,prekl,čiel 2.NP 1 Záber 3	10	2	0	28.5.19	29.5.19
500 TESAR	Deb. stropu,schod 2.NP 1 Záber 3	10	4	0	30.5.19	4.6.19
510 ŽELEZ	Výstuž vence,prekl 2.NP 1 Záber 3	4	1	0	4.6.19	4.6.19
520 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 2.NP 1 Záber 3	6	4	0	5.6.19	10.6.19
530 ŽELEZ	Výstuž schodiska 2.NP 1 Záber 3	2	1	0	11.6.19	11.6.19
540 BETON	Beton stropu 2.NP 1 Záber 3	6	1	0	11.6.19	11.6.19
550 BETON	Beton schodisko 2.NP 1 Záber 3	2	1	0	12.6.19	12.6.19
552 TESAR	Oddeb. ven,prekl 2.NP 1 Záber 3	6	1	5	21.6.19	21.6.19
554 TESAR	Oddebnenie stropu 2.NP 1 Záber 3	6	2	5	24.6.19	25.6.19
556 TESAR	odstránenie stojok 2.NP 1 Záber 3	6	1	7	23.7.19	23.7.19
560 MILNIK	HOTOVO 2.NP 1 ZNK,VNK	0	1	0	13.6.19	13.6.19
570 MURAR	Steny nosné 3.NP 1 Záber 1	6	4	0	7.6.19	12.6.19
580 MURAR	Osadenie prekladov 3.NP 1 Záber 1	6	1	0	13.6.19	13.6.19
590 TESAR	Deb. ven,prekl,čiel 3.NP 1 Záber 1	10	2	0	14.6.19	17.6.19
600 TESAR	Deb. strop,schod 3.NP 1 Záber 1	10	4	0	18.6.19	21.6.19
610 ŽELEZ	Výstuž ven,prekl 3.NP 1 Záber 1	4	1	8	11.6.19	11.6.19
620 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 3.NP 1 Záber 1	6	4	0	24.6.19	27.6.19
630 ŽELEZ	Výstuž schodiska 3.NP 1 Záber 1	2	1	0	28.6.19	28.6.19
640 BETON	Beton strop. dosky 3.NP 1 Záber 1	6	1	0	28.6.19	28.6.19
650 BETON	Beton schodisko 3.NP 1 Záber 1	2	1	3	1.7.19	1.7.19
652 TESAR	Oddeb. ven,prekl 3.NP 1 Záber 1	6	1	3	11.7.19	11.7.19
654 TESAR	Oddebnenie stropu 3.NP 1 Záber 1	6	2	3	12.7.19	15.7.19
656 TESAR	Odstránenie stojok 3.NP 1 Záber 1	6	1	10	9.8.19	9.8.19
660 MURAR	Steny nosné 3.NP 1 Záber 2	6	3	2	14.6.19	18.6.19
670 MURAR	Osadenie prekladov 3.NP 1 Záber 2	6	1	2	19.6.19	19.6.19
680 TESAR	Deb. ven,prekl,čiel 3.NP 1 Záber 2	10	2	0	24.6.19	25.6.19
690 TESAR	Deb. strop,schod 3.NP 1 Záber 2	10	3	0	26.6.19	28.6.19
700 ŽELEZ	Výstuž ven,prekl 3.NP 1 Záber 2	4	1	0	28.6.19	28.6.19
710 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 3.NP 1 Záber 2	6	4	0	1.7.19	4.7.19
720 ŽELEZ	Výstuž schodiska 3.NP 1 Záber 2	2	1	1	8.7.19	8.7.19
730 BETON	Beton strop. dosky 3.NP 1 Záber 2	6	1	0	8.7.19	8.7.19
740 BETON	Beton schodisko 3.NP 1 Záber 2	2	1	4	9.7.19	9.7.19
742 TESAR	Oddeb. ven,prekl 3.NP 1 Záber 2	6	1	2	18.7.19	18.7.19
744 TESAR	Oddebnenie stropu 3.NP 1 Záber 2	6	2	2	19.7.19	22.7.19
746 TESAR	Odstránenie stojok 3.NP 1 Záber 2	6	1	6	16.8.19	16.8.19
750 MURAR	Steny nosné 3.NP 1 Záber 3	6	3	2	21.6.19	25.6.19
760 MURAR	Osadenie prekladov 3.NP 1 Záber 3	6	1	2	26.6.19	26.6.19
770 TESAR	Deb. ven,prekl,čiel 3.NP 1 Záber 3	10	2	0	1.7.19	2.7.19
780 TESAR	Deb. strop,schod 3.NP 1 Záber 3	10	4	0	3.7.19	9.7.19
790 ŽELEZ	Výstuž venc,prekl 3.NP 1 Záber 3	4	1	1	8.7.19	8.7.19
800 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 3.NP 1 Záber 3	6	4	0	10.7.19	15.7.19
810 ŽELEZ	Výstuž schodiska 3.NP 1 Záber 3	2	1	0	16.7.19	16.7.19
820 BETON	Beton strop. dosky 3.NP 1 Záber 3	6	1	0	16.7.19	16.7.19
830 BETON	Beton schodisko 3.NP 1 Záber 3	2	1	0	17.7.19	17.7.19
832 TESAR	Oddeb. ven,prekl 3.NP 1 Záber 3	6	1	2	26.7.19	26.7.19
834 TESAR	Oddebnenie stropu 3.NP 1 Záber 3	6	2	2	29.7.19	30.7.19
836 TESAR	Odstránenie stojok 3.NP 1 Záber 3	6	1	1	26.8.19	26.8.19
840 MILNIK	HOTOVO 3.NP 1 ZNK, VNK	0	1	0	18.7.19	18.7.19
850 MURAR	Steny nosné 4.NP 1 Záber 1	6	4	0	11.7.19	16.7.19
860 MURAR	Osadenie prekladov 4.NP 1 Záber 1	6	1	0	17.7.19	17.7.19
870 TESAR	Deb. ven,prekl,čiel 4.NP 1 Záber 1	10	1	0	18.7.19	18.7.19
880 TESAR	Deb. strop,schod 4.NP 1 Záber 1	10	3	0	19.7.19	23.7.19
890 ŽELEZ	Výstuž venc,prekl 4.NP 1 Záber 1	4	1	4	23.7.19	23.7.19
900 ŽELEZ	Výstuž strop. doska 4.NP 1 Záber 1	6	4	4	24.7.19	29.7.19
920 BETON	Beton strop. dosky 4.NP 1 Záber 1	6	1	4	30.7.19	30.7.19
922 TESAR	Oddeb. ven,prekl 4.NP 1 Záber 1	6	1	4	9.8.19	9.8.19
924 TESAR	Oddebnenie stropu 4.NP 1 Záber 1	6	2	4	12.8.19	13.8.19
926 TESAR	Odstránenie stojok 4.NP 1 Záber 1	6	1	8	9.9.19	9.9.19
930 MURAR	Steny nosné 4.NP 1 Záber 2	6	3	0	18.7.19	22.7.19
940 MURAR	Osadenie prekladov 4.NP 1 Záber 2	6	1	0	23.7.19	23.7.19
950 TESAR	Deb. vencov a prekl 4.NP 1 Záber 2	10	1	0	24.7.19	24.7.19
960 TESAR	Deb. stropu, prest. 4.NP 1 Záber 2	10	3	0	25.7.19	29.7.19
970 ŽELEZ	Výstuž ven,prekl 4.NP 1 Záber 2	4	1	0	30.7.19	30.7.19
980 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 4.NP 1 Záber 2	6	4	0	31.7.19	5.8.19
990 BETON	Beton strop. dosky 4.NP 1 Záber 2	6	1	2	6.8.19	6.8.19
992 TESAR	Oddeb. ven,prekl 4.NP 1 Záber 2	6	1	2	16.8.19	16.8.19
994 TESAR	Oddebnenie stropu 4.NP 1 Záber 2	6	2	2	19.8.19	20.8.19
996 TESAR	Odstránenie stojok 4.NP 1 Záber 2	6	1	4	16.9.19	16.9.19
1000 MURAR	Steny nosné 4.NP 1 Záber 3	6	3	0	26.7.19	30.7.19
1010 MURAR	Osadenie prekladov 4.NP 1 Záber 3	6	1	0	31.7.19	31.7.19
1020 TESAR	Deb. vencov a prekl 4.NP 1 Záber 3	10	1	0	1.8.19	1.8.19
1030 TESAR	Deb. stropu, prest. 4.NP 1 Záber 3	10	3	0	2.8.19	6.8.19
1040 ŽELEZ	Výstuž vencov,prekl 4.NP 1 Záber 3	4	1	0	6.8.19	6.8.19
1050 ŽELEZ	Výstuž strop. dosky 4.NP 1 Záber 3	6	4	0	7.8.19	12.8.19
1060 BETON	Beton strop. dosky 4.NP 1 Záber 3	6	1	0	13.8.19	13.8.19
1062 TESAR	Oddeb. ven,prekl 4.NP 1 Záber 3	6	1	0	23.8.19	23.8.19
1064 TESAR	Oddebnenie stropu 4.NP 1 Záber 3	6	2	0	26.8.19	27.8.19
1066 TESAR	Odstránenie stojok 4.NP 1 Záber 3	6	1	0	23.9.19	23.9.19
1068 MILNIK	VRÁT. DEBNENIA 1 stojky, časť deb	0	1	0	28.8.19	28.8.19
1070 MILNIK	HOTOVO 4.NP 1 ZNK, VNK	0	1	0	14.8.19	14.8.19
1080 MURAR	Steny nosné - KROV 1 Záber 1	6	2	5	9.8.19	12.8.19
1090 TESAR	Deb. vencov - KROV 1 Záber 1	5	2	5	13.8.19	14.8.19
1100 ŽELEZ	Výstuž vencov - KROV 1 Záber 1	3	1	7	15.8.19	15.8.19
1110 BETON	Beton vence - KROV 1 Záber 1	3	1	7	16.8.19	16.8.19
1120 MURAR	Steny nosné - KROV 1 Záber 2	6	1	3	16.8.19	16.8.19
1130 TESAR	Deb. vencov - KROV 1 Záber 2	5	2	3	19.8.19	20.8.19
1140 ŽELEZ	Výstuž vencov - KROV 1 Záber 2	3	1	4	21.8.19	21.8.19
1150 BETON	Betón vencov - KROV 1 Záber 2	3	1	4	22.8.19	22.8.19
1160 MURAR	Steny nosné - KROV 1 Záber 3	6	1	0	23.8.19	23.8.19
1170 TESAR	Deb. vencov - KROV 1 Záber 3	5	2	0	26.8.19	27.8.19
1180 ŽELEZ	Výstuž vencov - KROV 1 Záber 3	3	1	0	28.8.19	28.8.19
1190 BETON	Beton vence - KROV 1 Záber 3	3	1	0	29.8.19	29.8.19
1200 MILNIK	HOTOVO POD KROV 1 ZNK	0	1	0	30.8.19	30.8.19
1210 TESAR	Oddebnenie vencov - KROV 1 Záber 1	3	1	7	28.8.19	28.8.19
1220 TESAR	Oddebnenie vencov - KROV 1 Záber 2	3	1	4	3.9.19	3.9.19
1230 TESAR	Oddebnenie vencov - KROV 1 Záber 3	3	1	0	10.9.19	10.9.19
1240 MILNIK	Oddebnenie vencov krov 1 Steny pod krov	0	1	0	11.9.19	11.9.19
1250 MILNIK	Kompletné oddebnenie 1 Celé debnenie	0	1	0	24.9.19	24.9.19

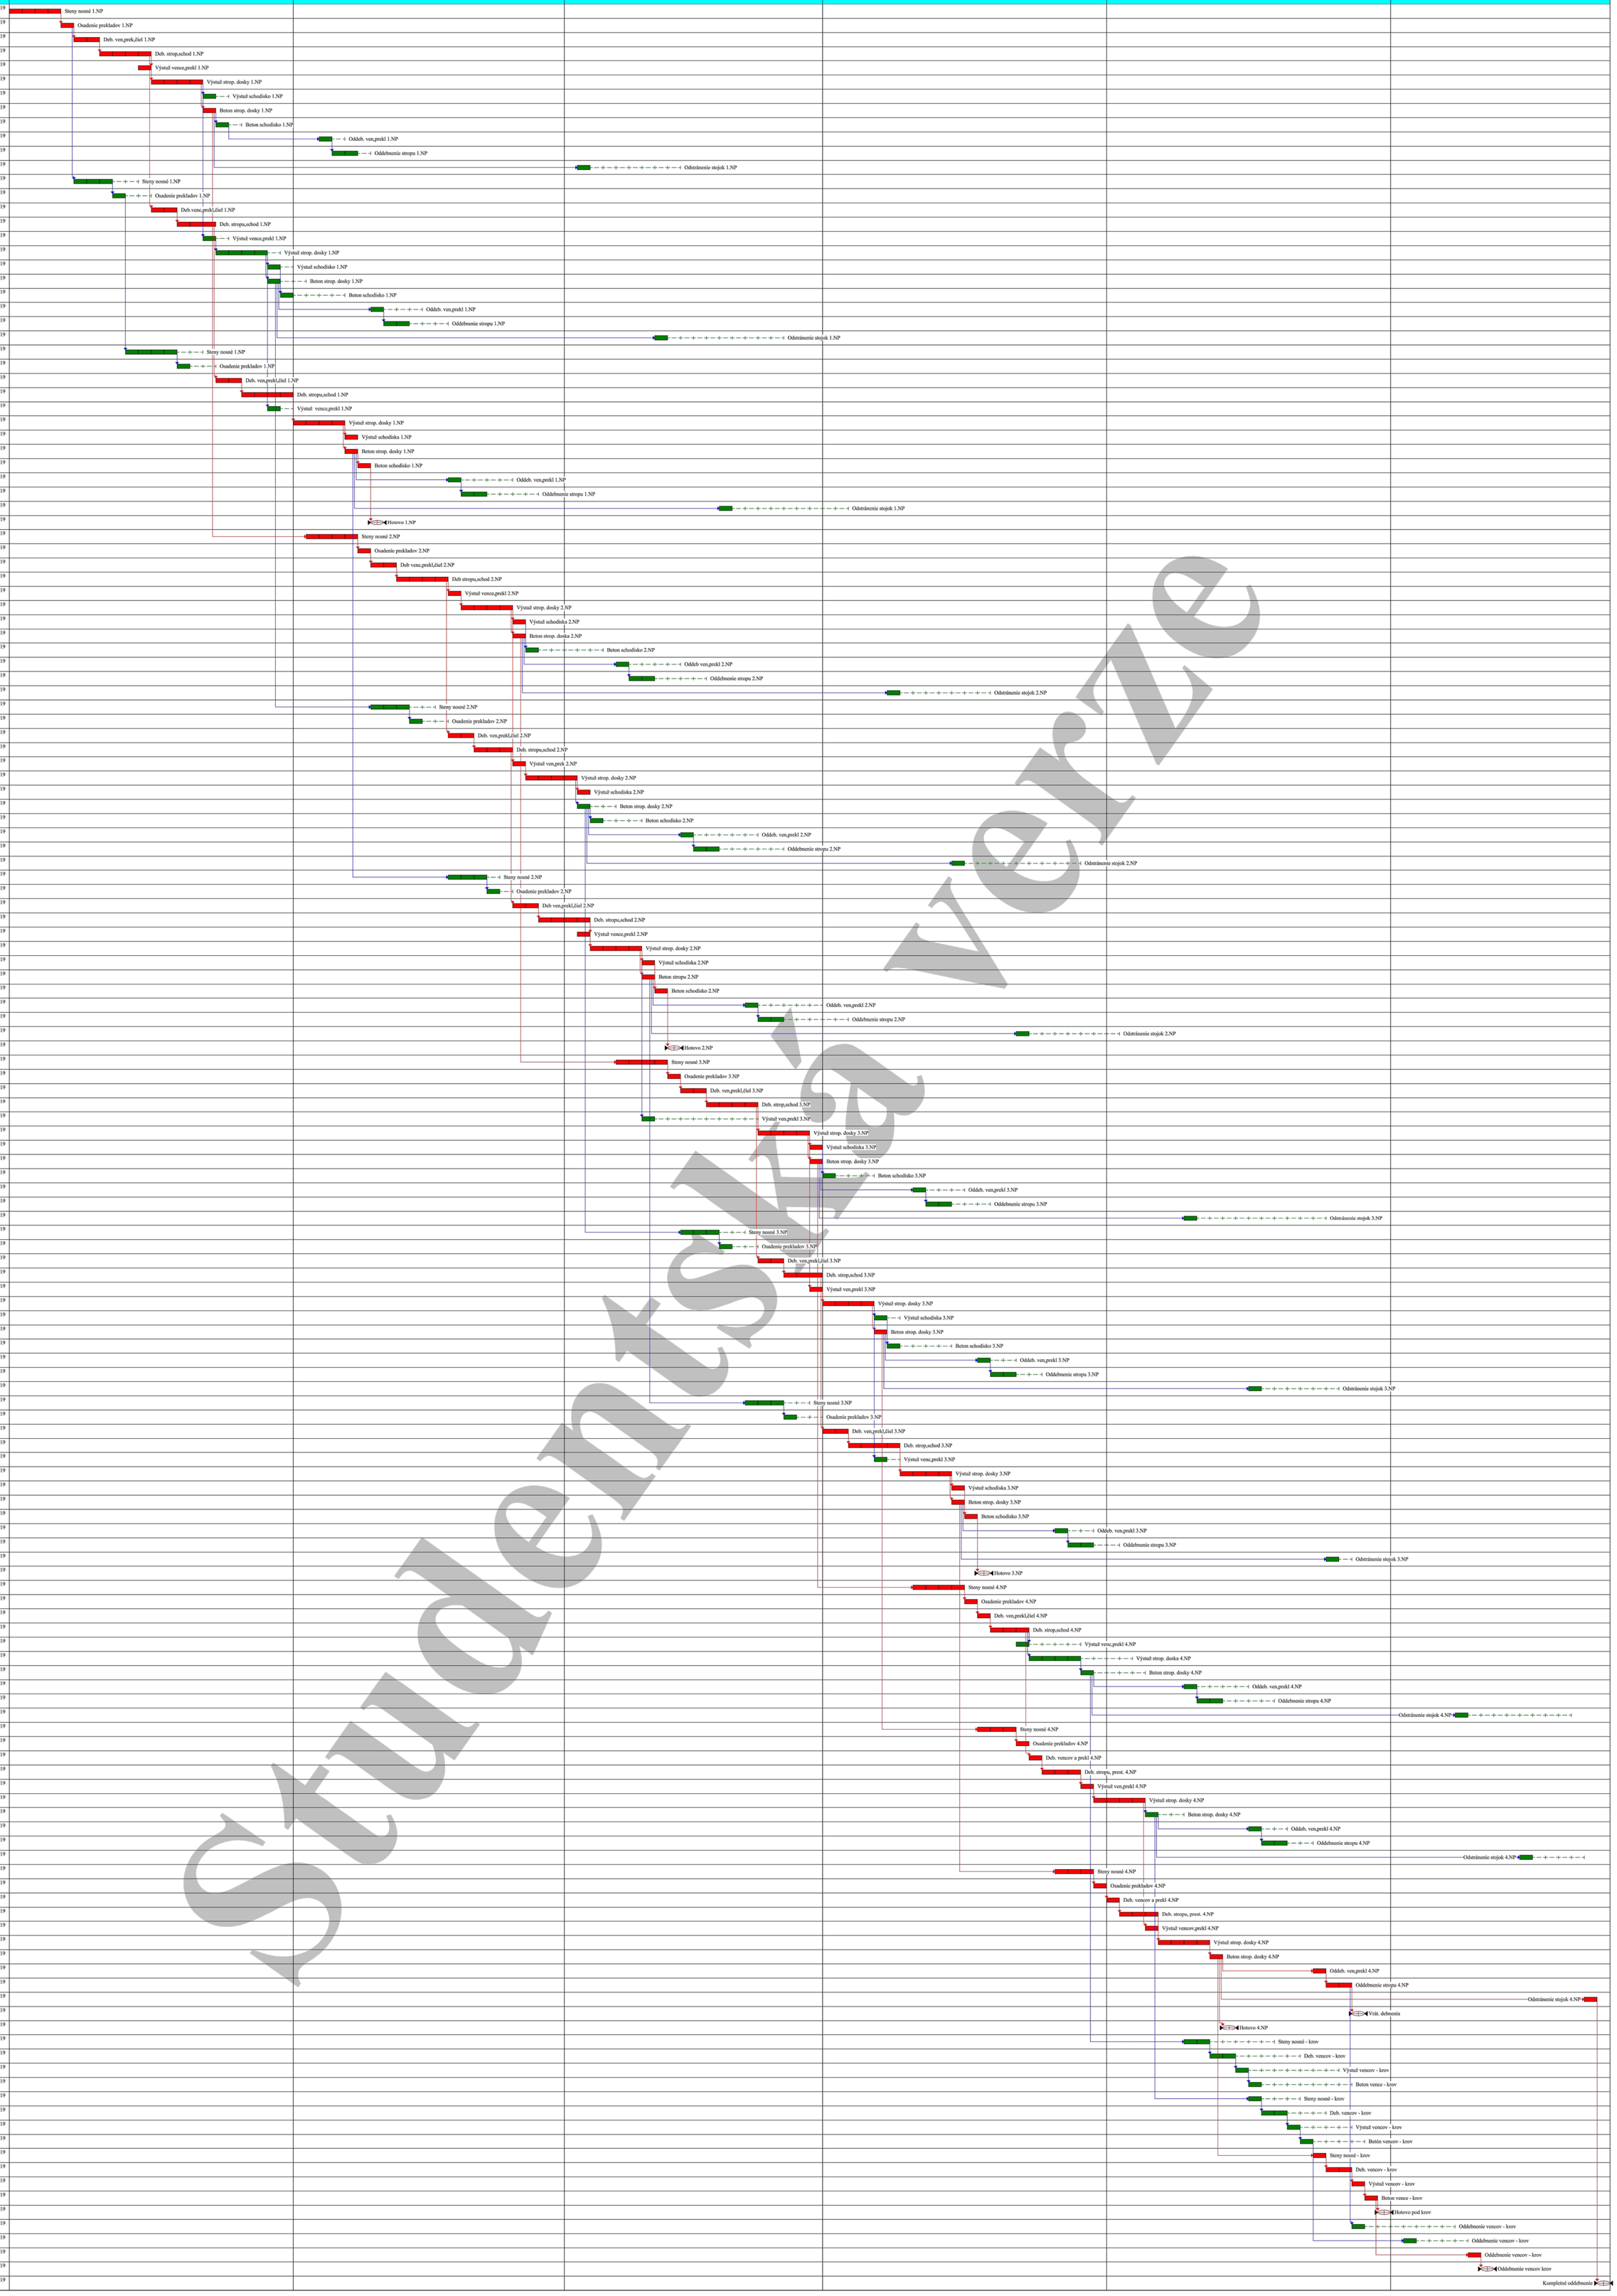

Činnost: kritická - , zpoždění - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vymucený termín - , hlavní vazba -

DRUH PRÁCE	BAKALÁRSKÁ PRÁCA	FAKULTA STAVEBNÍ	
VYPRACOVAL	Šimon Čonka		
VEDÚCI PRÁCE	Ing.Michal Novotný, Ph.D.		
STAVEBNÍK	De Bondt s.r.o., Rybárska 7389, 911 01 Trenčín		
MIESTO STAVBY	Bratislava - Devínska Nová Ves, Mečíková 57-61,Bratislava, 841 07		
NÁZEV STAVBY	REALIZACE HRUBÉ STAVBY BYTOVÉHO DOMU V BRATISLAVĚ		
		FORMÁT	16x4
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 BYTOVÝ DOM F	DATUM	05/2019
ČASŤ		STUPEŇ PD	
OBSAH:	ČASOVÝ PLÁN RIEŠENEJ ETAPY	MIERKA 1:100	PRÍLOHA ČÍSLO 2

VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK
Student version
