Časový plán výstavby hrubé horní stavby bytového domu - rezidence Gabriela

ID	Název úkolu	MJ	Nh	Množství	Počet pracovníků	Délka směny (hod)	Doba trvání (hod)	Doba trvání (dny)	Zahájení	Dokončení
1	Penetrační nátěr	m2	0,03	317,5	4	8	2,38	0,3 dny	3.3. 14	3.3. 14
2	Natavení hydroizolačních pásů	m2	0,23	365,12	4	8	20,99	2,62 dny	3.3. 14	5.3. 14
3	Zdivo obvodové 1NP (440)	m2	1,01	189,35	5	8	38,25	4,78 dny	5.3. 14	12.3. 14
4	Zdivo vnitřní nosné 1NP (300)	m2	0,7	134,9	5	8	18,89	2,36 dny	12.3. 14	17.3. 14
5	Osazování překladů KP7	ks	0,33	28	3	8	3,08	0,39 dny	17.3. 14	17.3. 14
6	Osazování válcovaných nosníků	t	15,53	6,46	5	8	20,06	2,51 dny	17.3. 14	19.3. 14
7	Montáž stropních panelů 1NP	ks	1,50	42	4	8	15,75	1,97 dny	19.3. 14	21.3. 14
8	Montáž bednění	m2	0,83	7,8	2	8	3,24	0,4 dny	24.3. 14	24.3. 14
9	Obezdívání věnců vč. kladení TI	m	0,24	70,84	3	8	5,67	0,7 dny	24.3. 14	24.3. 14
10	Vyztužování stropní konstrukce	t	24,65	0,80	4	8	4,93	0,62 dny	24.3. 14	25.3. 14
11	Betonáž stropní konstrukce 1NP	m3	0,7	7,04	5	8	0,99	0,12 dny	25.3. 14	25.3. 14
12	Odbednění stropní konstrukce	m2	0,42	7,8	2	8	1,64	0,2 dny	9.4. 14	9.4. 14
13	Zdivo obvodové 2NP (440)	m2	1,01	170,05	5	8	34,35	4,29 dny	9.4. 14	15.4. 14
14	Zdivo vnitřní nosné 2NP (300)	m2	0,7	124,85	5	8	17,48	2,19 dny	15.4. 14	17.4. 14
15	Osazování překladů KP7	ks	0,33	60	3	8	6,6	0,83 dny	17.4. 14	18.4. 14
16	Montáž stropních panelů 2NP	ks	1,5	38	4	8	14,25	1,78 dny	21.4. 14	22.4. 14
17	Montáž bednění	m2	0,83	17,32	3	8	4,79	0,6 dny	22.4. 14	23.4. 14
18	Obezdívání věnců vč. kladení TI	m	0,24	70,84	3	8	5,67	0,7 dny	22.4. 14	23.4. 14
19	Vyztužování stropní konstrukce	t	24,65	0,85	4	8	5,24	0,65 dny	23.4. 14	24.4. 14
20	Betonáž tropní konstrukce 2NP	m3	0,7	7,59	5	8	1,06	0,13 dny	24.4. 14	24.4. 14
21	Odbedňování stropní konstrukce	m2	0,42	17,32	2	8	3,64	0,45 dny	5.5. 14	5.5. 14
22	Příčky 1NP	m2	0,52	164,3	5	8	17,09	2,14 dny	30.4. 14	2.5. 14
23	Osazování plochých překladů	ks	0,32	22	2	8	3,52	0,44 dny	5.5. 14	5.5. 14
24	Zdivo obvodové 3NP (440)	m2	1,01	170,05	5	8	34,35	4,29 dny	5.5. 14	9.5. 14
25	Zdivo vnitřní nosné 3NP (300)	m2	0,7	124,85	5	8	17,48	2,19 dny	9.5. 14	13.5. 14
26	Osazování překladů KP7	ks	0,33	60	3	8	6,6	0,83 dny	13.5. 14	14.5. 14
27	Montáž stropních panelů 3NP	ks	1,5	38	4	8	14,25	1,78 dny	15.5. 14	16.5. 14
28	Montáž bednění	m2	0,83	17,32	3	8	4,79	0,6 dny	19.5. 14	19.5. 14
29	Obezdívání věnců vč. kladení TI	m	0,24	70,84	3	8	5,67	0,7 dny	19.5. 14	19.5. 14
30	Vyztužování stropní konstrukce	t	24,65	0,85	4	8	5,24	0,65 dny	19.5. 14	20.5. 14
31	Betonáž stropní konstrukce 3NP	m3	0,7	7,59	5	8	1,06	0,13 dny	20.5. 14	20.5. 14
32	Odbedňování stropní konstrukce	m2	0,42	17,32	2	8	3,64	0,45 dny	30.5. 14	30.5. 14
33	Příčky 2NP	m2	0,52	172,8	5	8	17,97	2,25 dny	28.5. 14	30.5. 14
34	Osazování plochých překladů	ks	0,33	18	2	8	2,97	0,37 dny	30.5. 14	30.5. 14
35	Zdivo obvodové 4NP (440)	m2	1,01	165,57	5	8	33,45	4,18 dny	30.5. 14	5.6. 14
36	Zdivo vnitřní nosné 4NP (300)	m2	0,7	119,25	5	8	16,7	2,09 dny	5.6. 14	9.6. 14
37	Osazování překladů KP7	ks	0,33	72	3	8	7,92	0,99 dny	9.6. 14	10.6. 14
38	Osazování válcovaných nosníků	t	16,58	3,77	5	8	12,5	1,56 dny	10.6. 14	12.6. 14
39	Montáž stropních panelů 4NP	ks	1,5	36	4	8	13,5	1,69 dny	12.6. 14	16.6. 14
40	Montáž stropních desek PZD	ks	1,09	104	4	8	28,34	3,54 dny	16.6. 14	19.6. 14
41	Montáž bednění	m2	0,83	27,16	3	8	7,51	0,94 dny	19.6. 14	20.6. 14
42	Obezdívání věnců vč. kladení TI	m	0,24	77,14	3	8	6,17	0,77 dny	23.6. 14	23.6. 14
43	Vyztužování stropní konstrukce	t	24,65	1,67	5	8	8,23	1,03 dny	23.6. 14	24.6. 14
44	Betonáž stropní konstrukce 4NP	m3	0,7	15,44	6	8	1,8	0,23 dny	24.6. 14	24.6. 14
45	Odbedňování stropní konstrukce	m2	0,42	27,16	4	8	2,85	0,36 dny	3.7. 14	3.7. 14
46	Příčky 3NP	m2	0,52	175,6	6	8	15,22	1,9 dny	1.7. 14	2.7. 14
47	Osazování plochých překladů	ks	0,32	19	2	8	3,04	0,39 dny	3.7. 14	3.7. 14
48	Zdivo obvodové 5NP (440)	m2	1,01	100,38	5	8	20,28	2,54 dny	3.7. 14	7.7. 14
49	Zdivo vnitřní nosné 5NP vč. atiky (300)	m2	0,7	163,31	5	8	22,86	2,86 dny	7.7. 14	10.7. 14
50	Osazování překladů KP7	ks	0,33	56	3	8	6,16	0,77 dny	10.7. 14	11.7. 14
51	Osazování válcovaných nosníků	t	16,58	0,14	2	8	1,16	0,15 dny	14.7. 14	14.7. 14
52	Montáž stropních panelů 5NP	ks	1,5	27	4	8	10,13	1,27 dny	14.7. 14	15.7. 14
53	Obezdívání věnců vč. kladení TI	m	0,24	77,04	3	8	6,16	0,77 dny	15.7. 14	16.7. 14
54	Vyztužování stropní konstrukce	t	24,65	0,58	4	8	3,57	0,45 dny	16.7. 14	16.7. 14
55	Betonáž stropní konstrukce 5NP	m3	0,7	4,97	5	8	0,7	0,1 dny	16.7. 14	16.7. 14
56	Příčky 4NP	m2	0,52	173,92	5	8	18,09	2,26 dny	17.7. 14	21.7. 14
57	Osazování plochých překladů	ks	0,32	15	2	8	2,4	0,3 dny	21.7. 14	21.7. 14
58	Příčky 5NP	m2	0,52	93,28	5	8	9,7	1,2 dny	21.7. 14	22.7. 14
59	Osazování plochých překladů	ks	0,32	8	2	8	1,28	0,16 dny	22.7. 14	22.7. 14

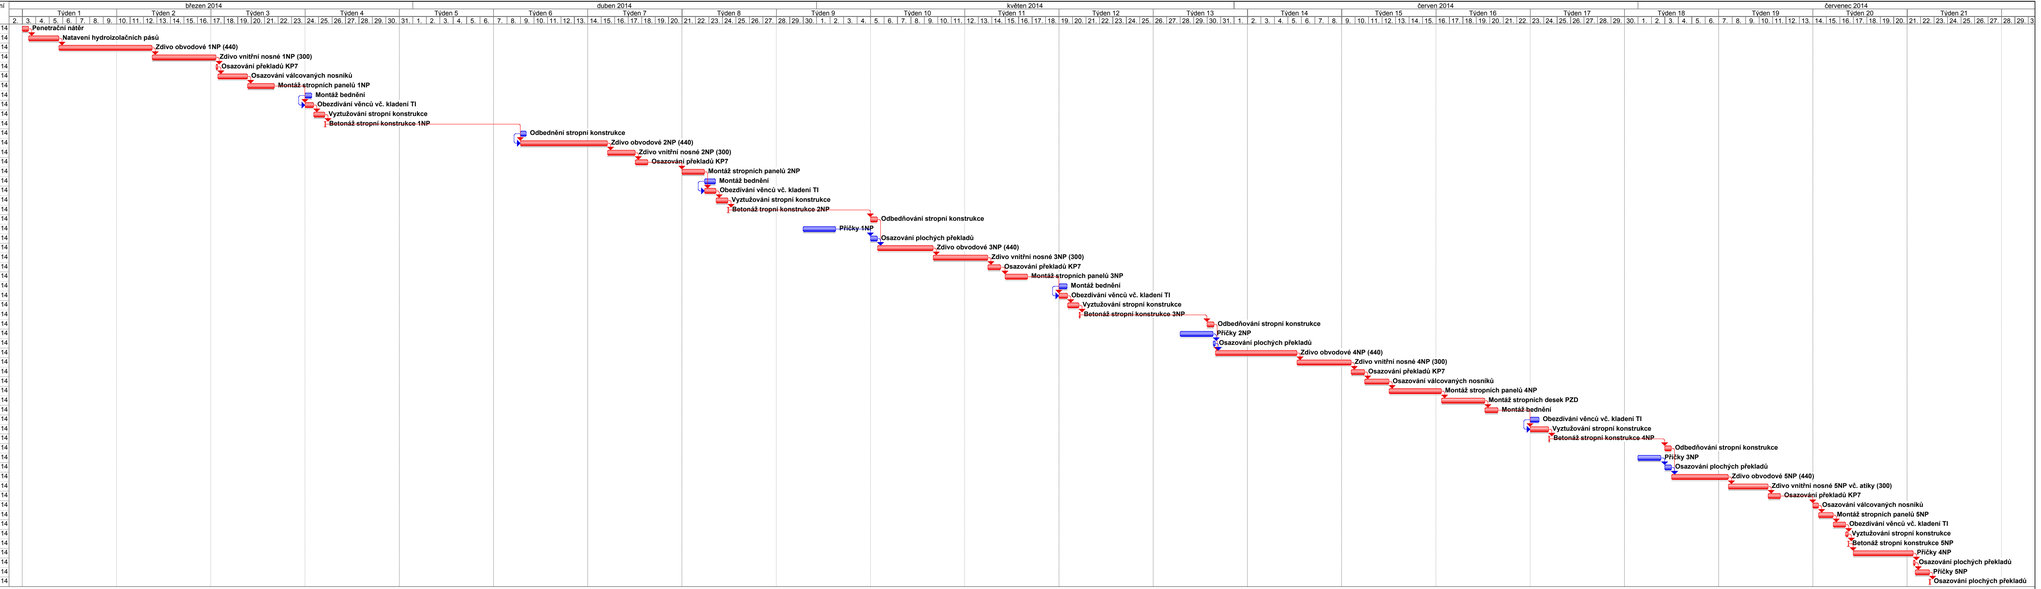

Projekt: Rezidence Gabriela
Datum: 23.5. 14
Vypracoval: Mihal Marek

Úkol | Průběh | Souhrnný | Zahrnutý kritický úkol | Zahrnutý průběh | Vnější úkoly | Seskupit podle souhrnu
Kritický úkol | Milník | Zahrnutý úkol | Zahrnutý milník | Rozdělení | Souhrn projektu | Konečný termín
