VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

Zobrazení hlavních vazeb

Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec
Dodav.	Směnnost		(dni)	možný	možný	
10	Vyztužení stěn	3	5	0	3.4.17	7.4.17
	1 ŽB STĚNY-1.NP					
20	Zřízení bednění	6	5	6	6.4.17	12.4.17
	1 ŽB STĚNY-1.NP					
30	Betonáž	4	2	6	13.4.17	14.4.17
	1 ŽB STĚNY-1.NP					
40	Odstranění bednění	6	2	6	24.4.17	25.4.17
	1 ŽB STĚNY-1.NP					
50	Porotherm 30 P+D	4	8	0	3.4.17	12.4.17
	1 VNĚJŠÍ ZDI-1.NP					
55	Překlady 7	4	1	2	10.4.17	10.4.17
	1 VNĚJŠÍ ZDI-1.NP					
60	Porotherm 30 AKU	4	15	0	13.4.17	4.5.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-1.NP					
65	Překlady 7	2	2	4	26.4.17	27.4.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-1.NP					
70	Překlady ocelové	2	1	3	26.4.17	26.4.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-1.NP					
75	Zřízení bednění	2	1	3	26.4.17	26.4.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-1.NP					
80	Betonáž překladů	1	1	3	26.4.17	26.4.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-1.NP					
90	Odstranění bednění	2	1	3	28.4.17	28.4.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-1.NP					
100	Porotherm 19 P+D	2	1	5	2.5.17	2.5.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-1.NP					
110	Osazení desek	3	3	0	5.5.17	10.5.17
	1 STROPY NAD 1.NP					
120	ISO nosníky	2	1	2	5.5.17	5.5.17
	1 STROPY NAD 1.NP					
130	Podpěrná konstrukce	5	3	0	5.5.17	10.5.17
	1 STROPY NAD 1.NP					
140	Výztuž věnců	3	1	0	11.5.17	11.5.17
	1 STROPY NAD 1.NP					
150	Bednění věnců	2	2	0	12.5.17	15.5.17
	1 STROPY NAD 1.NP					
155	Betonáž stropů	8	1	0	16.5.17	16.5.17
	1 STROPY NAD 1.NP					
160	Betonáž stropů restaur.	4	1	0	17.5.17	17.5.17
	1 STROPY NAD 1.NP					
162	Zřízení bednění	2	2	3	17.5.17	18.5.17
	1 SCHODIŠTĚ - 1.NP					
164	Výztuž schodiště	2	1	3	19.5.17	19.5.17
	1 SCHODIŠTĚ - 1.NP					
166	Betonáž	2	1	3	22.5.17	22.5.17
	1 SCHODIŠTĚ - 1.NP					
170	Porotherm 30 P+D	4	6	0	24.5.17	31.5.17
	1 VNĚJŠÍ ZDI-2.NP					
175	Překlady 7	2	2	0	30.5.17	31.5.17
	1 VNĚJŠÍ ZDI-2.NP					
180	Odstranění bednění	2	1	3	29.5.17	29.5.17
	1 SCHODIŠTĚ - 1.NP					
186	Vyztužení stěn	3	1	1	1.6.17	1.6.17
	1 ŽB STĚNY-2.NP					
187	Zřízení bednění	3	2	1	2.6.17	5.6.17
	1 ŽB STĚNY-2.NP					
188	Betonáž	4	1	1	6.6.17	6.6.17
	1 ŽB STĚNY-2.NP					
189	Odstranění bednění	3	1	1	14.6.17	14.6.17
	1 ŽB STĚNY-2.NP					
190	Porotherm 30 AKU	4	11	0	1.6.17	15.6.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-2.NP					
195	Překlady 7	2	1	3	12.6.17	12.6.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-2.NP					
200	Překlady ocelové	1	1	1	12.6.17	12.6.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-2.NP					
205	Zřízení bednění	2	1	1	12.6.17	12.6.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-2.NP					
210	Betonáž překladů	1	1	1	12.6.17	12.6.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-2.NP					
215	Odstranění bednění	2	1	1	14.6.17	14.6.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-2.NP					
220	Porotherm 19 P+D	2	1	3	12.6.17	12.6.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-2.NP					
225	Odstranění podpěr	5	2	17	14.6.17	15.6.17
	1 STROPY NAD 1.NP					
230	Osazení desek	3	2	0	16.6.17	19.6.17
	1 STROPY NAD 2.NP					
240	ISO nosníky	2	1	1	16.6.17	16.6.17
	1 STROPY NAD 2.NP					
250	Podpěrná konstrukce	5	2	0	16.6.17	19.6.17
	1 STROPY NAD 2.NP					
260	Výztuž věnců	2	1	0	20.6.17	20.6.17
	1 STROPY NAD 2.NP					
270	Bednění věnců	2	2	0	21.6.17	22.6.17
	1 STROPY NAD 2.NP					
280	Betonáž stropů	8	1	0	23.6.17	23.6.17
	1 STROPY NAD 2.NP					
282	Zřízení bednění	2	2	9	26.6.17	27.6.17
	1 SCHODIŠTĚ - 2.NP					
284	Výztuž schodiště	2	1	9	28.6.17	28.6.17
	1 SCHODIŠTĚ - 2.NP					
286	Betonáž	2	1	9	29.6.17	29.6.17
	1 SCHODIŠTĚ - 2.NP					
290	Porotherm 30 P+D	4	6	0	3.7.17	12.7.17
	1 VNĚJŠÍ ZDI-3.NP					
300	Překlady 7	3	1	1	11.7.17	11.7.17
	1 VNĚJŠÍ ZDI-3.NP					
310	Vyztužení stěn	2	1	1	13.7.17	13.7.17
	1 ŽB STĚNY-3.NP					
315	Odstranění bednění	1	1	9	13.7.17	13.7.17
	1 SCHODIŠTĚ - 2.NP					
320	Zřízení bednění	2	1	1	14.7.17	14.7.17
	1 ŽB STĚNY-3.NP					
330	Betonáž	2	1	1	17.7.17	17.7.17
	1 ŽB STĚNY-3.NP					
340	Odstranění bednění	2	1	1	25.7.17	25.7.17
	1 ŽB STĚNY-3.NP					
350	Porotherm 30 AKU	4	10	0	13.7.17	26.7.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-3.NP					
355	Překlady 7	2	1	3	21.7.17	21.7.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-3.NP					
360	Překlady ocelové	1	1	1	21.7.17	21.7.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-3.NP					
365	Zřízení bednění	3	1	1	21.7.17	21.7.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-3.NP					
370	Betonáž překladů	3	1	1	21.7.17	21.7.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-3.NP					
375	Odstranění bednění	3	1	1	25.7.17	25.7.17
	1 VNITŘNÍ ZDI-3.NP					
376	Výztuž věnců	2	1	0	27.7.17	27.7.17
	1 ŽB VĚNCE-3.NP					
377	Zřízení bednění	4	4	0	28.7.17	2.8.17
	1 ŽB VĚNCE-3.NP					
378	Betonáž věnců	2	1	0	3.8.17	3.8.17
	1 ŽB VĚNCE-3.NP					
379	Odstranění bednění	2	2	0	15.8.17	16.8.17
	1 ŽB VĚNCE-3.NP					
380	Odstranění podpěr	5	2	10	1.8.17	2.8.17
	1 STROPY NAD 2.NP					
390	Nadezdívka	4	1	0	17.8.17	17.8.17
	1 VNĚJŠÍ ZDI-3.NP					
400	Nosné prvky krovu	8	22	0	18.8.17	18.9.17
	1 STŘECHA					
410	Hydroizolace	4	3	0	14.9.17	18.9.17
	1 STŘECHA					
420	Kontralatě+latě	4	5	0	19.9.17	25.9.17
	1 STŘECHA					
430	Krytina	6	7	0	22.9.17	3.10.17
	1 STŘECHA					

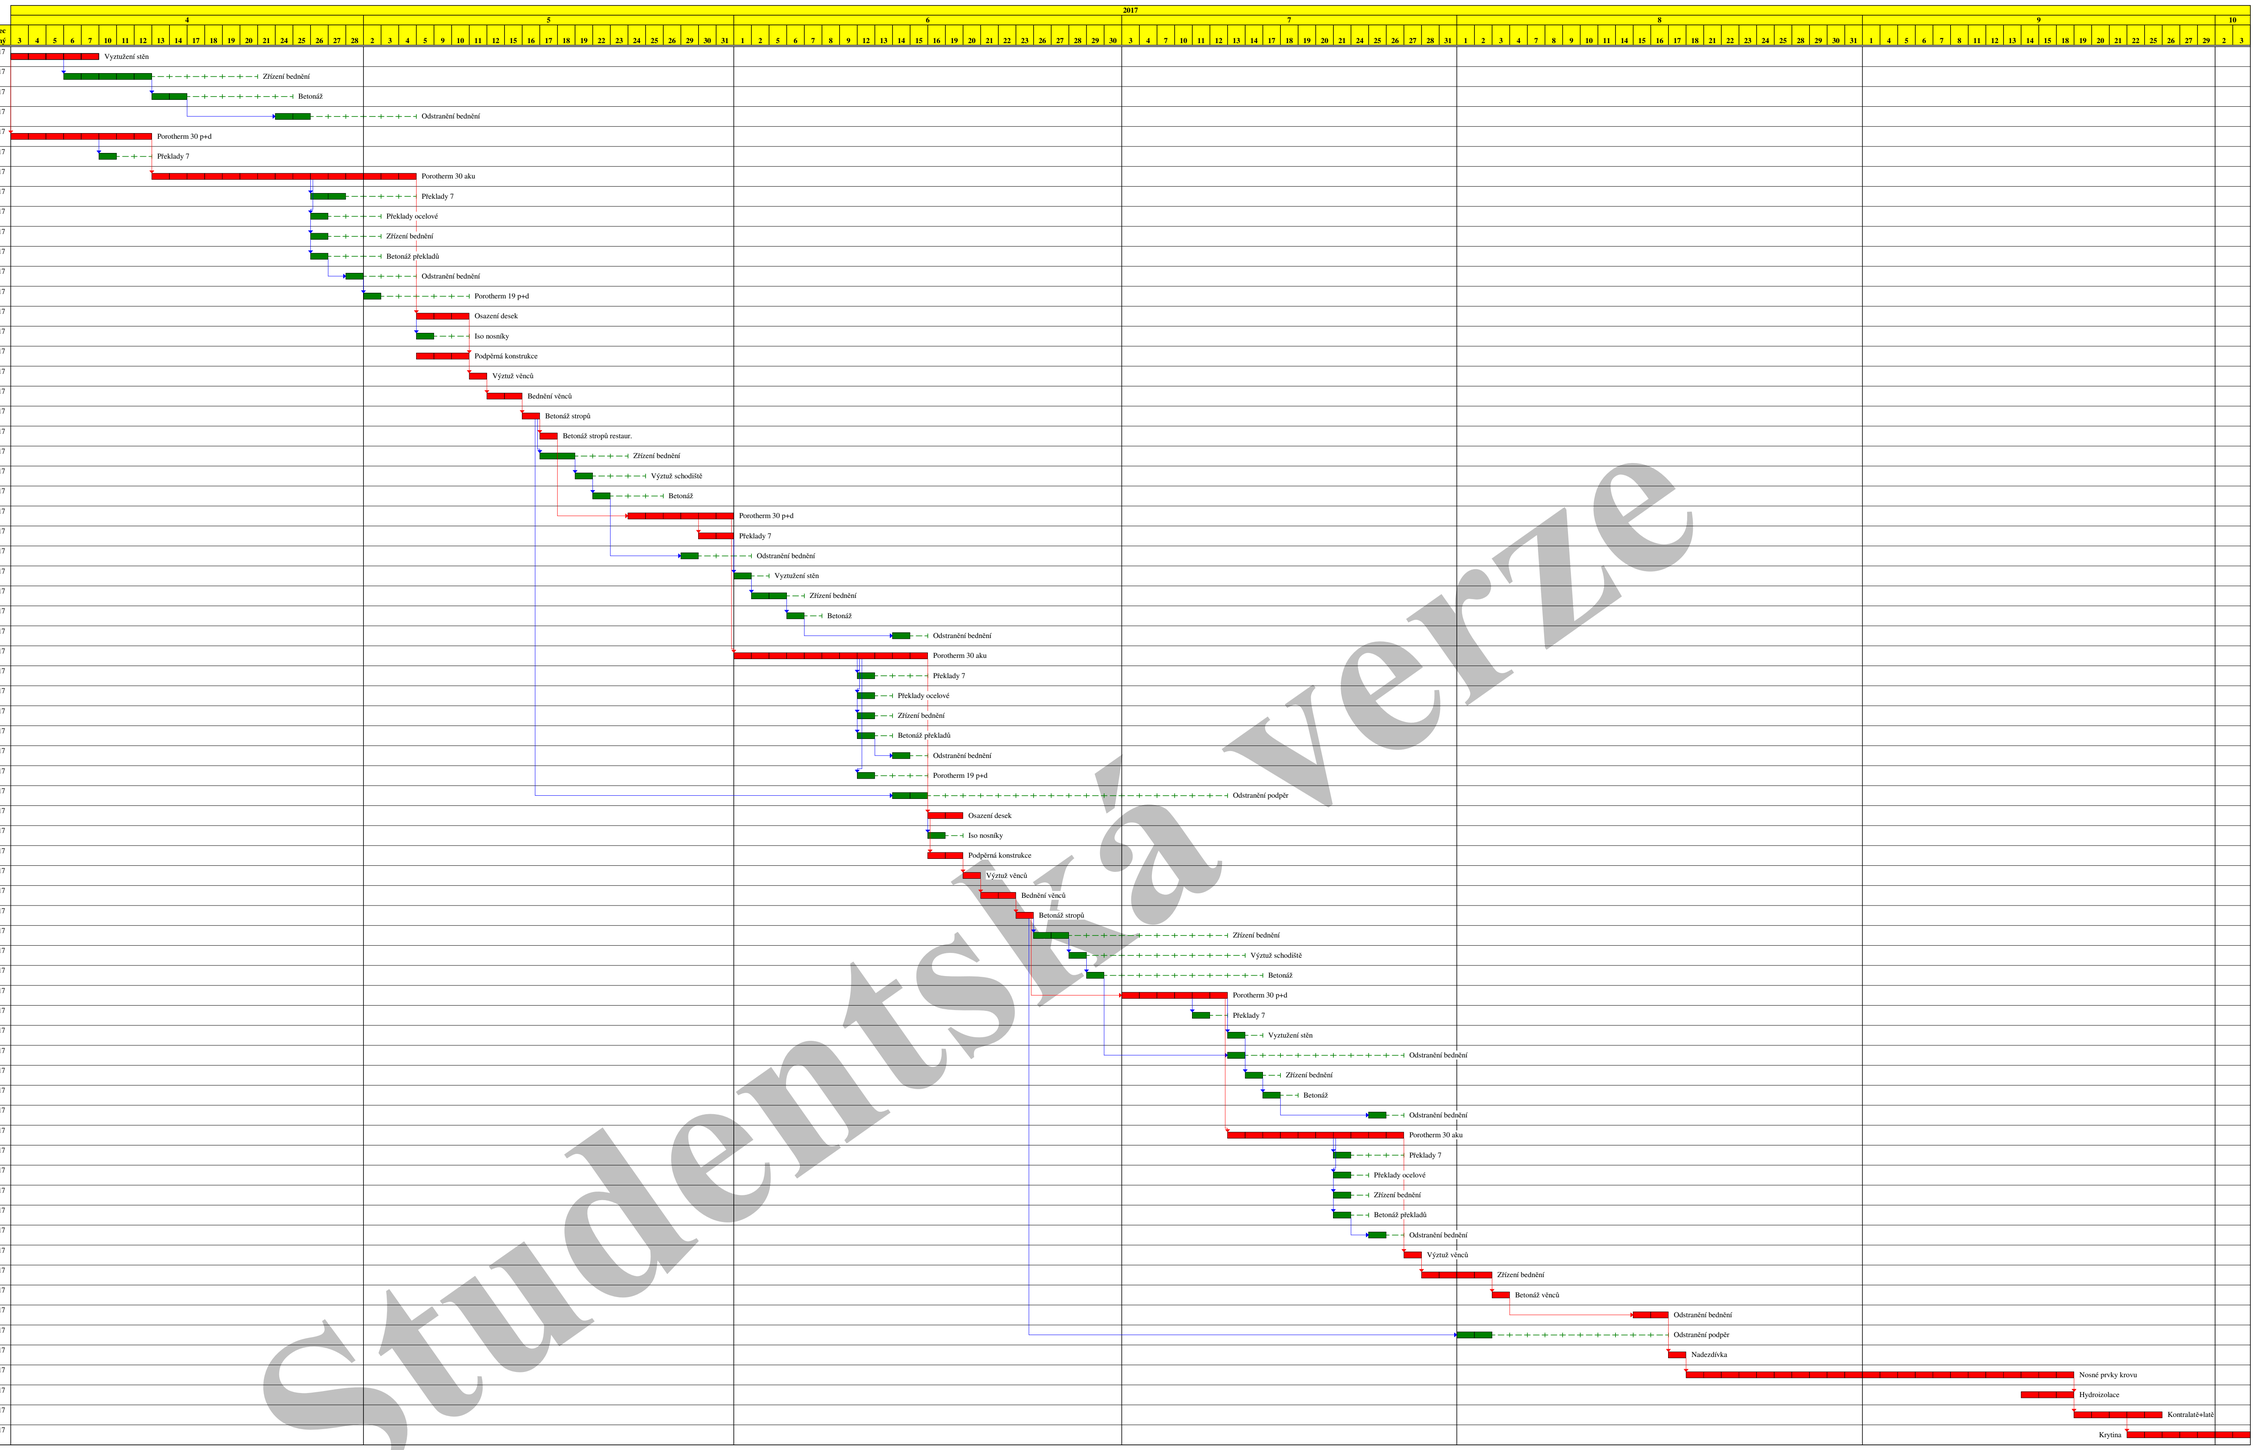

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - .

Studentská verze

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Název BP: REALIZACE HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY PENZIONU V ČELADNÉ

Název výkresu: ČASOVÝ PLÁN

Datum: 05/2017

Měřítko:

Číslo výkresu: 5

Vypracoval: LUKÁŠ MIKULKA

Vedoucí BP: Ing. JITKA VLČKOVÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ
