ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	0	**1 SO01 a SO02 - Skladovací hala s administrativní částí**	**260 dny**	**04.03. 19**	**28.02. 20**
2	1	**1.1 Zařízení staveniště - zřízení**	**6 dny**	**04.03. 19**	**11.03. 19**
3	2	1.1.1 Předání a převzetí staveniště	0 dny	04.03. 19	04.03. 19
4	1	1.1.2 Zahájení stavby	0 dny	04.03. 19	04.03. 19
5	2	1.1.3 Montáž oplocení ZS	1 den	04.03. 19	04.03. 19
6	1	1.1.4 Vytyčení inženýrských sítí	1 den	05.03. 19	05.03. 19
7	2	1.1.5 Objekty ZS	4 dny	06.03. 19	11.03. 19
8	1	**1.2 Hrubá spodní stavba**	**25 dny**	**12.03. 19**	**15.04. 19**
9	2	**1.2.1 Provedení pilotového založení objektu**	**15 dny**	**12.03. 19**	**01.04. 19**
10	1	1.2.1.1 Piloty - průměr 350 mm	2 dny	12.03. 19	13.03. 19
11	2	1.2.1.2 Piloty - průměr 650 mm	10 dny	14.03. 19	27.03. 19
12	1	1.2.1.3 Technologická přestávka 1	3 dny	28.03. 19	01.04. 19
13	2	**1.2.2 Zemní práce**	**2 dny**	**28.03. 19**	**29.03. 19**
14	1	1.2.2.1 Hloubení nezapažených jam	1 den	28.03. 19	28.03. 19
15	2	1.2.2.2 Hloubení rýh	1 den	29.03. 19	29.03. 19
16	1	**1.2.3 Základy**	**11 dny**	**01.04. 19**	**15.04. 19**
17	2	1.2.3.1 Výztuž ŽB základových pásů	1 den	01.04. 19	01.04. 19
18	1	1.2.3.2 Betonáž ŽB základových pásů C 12/15	1 den	02.04. 19	02.04. 19
19	2	1.2.3.3 Technologická přestávka 2	3 dny	03.04. 19	05.04. 19
20	1	1.2.3.4 Montáž prefa žb prahu	1 den	02.04. 19	02.04. 19
21	2	1.2.3.5 Montáž prefa žb kalichu	2 dny	02.04. 19	03.04. 19
22	1	1.2.3.6 Výztuž a bednění podkladní ŽB desky	1 den	08.04. 19	08.04. 19
23	2	1.2.3.7 Betonáž podkladní ŽB desky C 12/15	2 dny	09.04. 19	10.04. 19
24	1	1.2.3.8 Technologická přestávka 2	3 dny	11.04. 19	15.04. 19
25	2	1.2.3.9 Zdění základového zdiva z betonových tvárnic, výplň. Beton C 12/15	1 den	08.04. 19	08.04. 19
26	1	**1.3 Hrubá vrchní stavba**	**170 dny**	**09.04. 19**	**02.12. 19**
27	2	**1.3.1 Montáž železobetonového skeletu**	**110 dny**	**09.04. 19**	**09.09. 19**
28	1	1.3.1.1 Montáž sloupů přerušených 1.NP	1 den	09.04. 19	09.04. 19
29	2	1.3.1.2 Technologická přestávka 3	3 dny	10.04. 19	12.04. 19
30	1	1.3.1.3 Montáž železobetonových průvlaků	1 den	15.04. 19	15.04. 19
31	2	1.3.1.4 Montáž ŽB schodiště	1 den	16.04. 19	16.04. 19
32	1	1.3.1.5 Technologická přestávka 4	3 dny	17.04. 19	19.04. 19
33	2	1.3.1.6 Montáž panelů SPIROLL	2 dny	22.04. 19	23.04. 19
34	1	1.3.1.7 Technologická přestávka 5	3 dny	24.04. 19	26.04. 19
35	2	1.3.1.8 Montáž sloupů přerušených 2.NP	1 den	29.04. 19	29.04. 19
36	1	1.3.1.9 Technologická přestávka 6	3 dny	30.04. 19	02.05. 19
37	2	1.3.1.10 Montáž železobetonových průvlaků	1 den	03.05. 19	03.05. 19
38	1	1.3.1.11 Montáž ŽB schodiště	1 den	06.05. 19	06.05. 19
39	2	1.3.1.12 Technologická přestávka 7	3 dny	07.05. 19	09.05. 19
40	1	1.3.1.13 Montáž panelů SPIROLL	2 dny	10.05. 19	13.05. 19
41	2	1.3.1.14 Technologická přestávka 8	3 dny	14.05. 19	16.05. 19
42	1	1.3.1.15 Montáž sloupů přerušených 3.NP	1 den	17.05. 19	17.05. 19
43	2	1.3.1.16 Technologická přestávka 9	3 dny	20.05. 19	22.05. 19
44	1	1.3.1.17 Montáž železobetonových průvlaků	1 den	23.05. 19	23.05. 19
45	2	1.3.1.18 Montáž ŽB schodiště	1 den	24.05. 19	24.05. 19
46	1	1.3.1.19 Technologická přestávka 10	3 dny	27.05. 19	29.05. 19
47	2	1.3.1.20 Montáž panelů SPIROLL	2 dny	30.05. 19	31.05. 19
48	1	1.3.1.21 Technologická přestávka 11	3 dny	03.06. 19	05.06. 19
49	2	1.3.1.22 Montáž sloupů přerušených 4.NP	1 den	06.06. 19	06.06. 19
50	1	1.3.1.23 Technologická přestávka 12	3 dny	07.06. 19	11.06. 19
51	2	1.3.1.24 Montáž železobetonových průvlaků	1 den	12.06. 19	12.06. 19
52	1	1.3.1.25 Montáž ŽB schodiště	1 den	13.06. 19	13.06. 19
53	2	1.3.1.26 Technologická přestávka 13	3 dny	14.06. 19	18.06. 19
54	1	1.3.1.27 Montáž panelů SPIROLL	2 dny	19.06. 19	20.06. 19
55	2	1.3.1.28 Technologická přestávka 14	3 dny	21.06. 19	25.06. 19
56	1	1.3.1.29 Montáž sloupů přerušených 5.NP	1 den	26.06. 19	26.06. 19
57	2	1.3.1.30 Technologická přestávka 15	3 dny	27.06. 19	01.07. 19
58	1	1.3.1.31 Montáž železobetonových průvlaků	1 den	02.07. 19	02.07. 19
59	2	1.3.1.32 Montáž ŽB schodiště	1 den	03.07. 19	03.07. 19
60	1	1.3.1.33 Technologická přestávka 16	3 dny	04.07. 19	08.07. 19
61	2	1.3.1.34 Montáž panelů SPIROLL	2 dny	09.07. 19	10.07. 19
62	1	1.3.1.35 Technologická přestávka 17	3 dny	11.07. 19	15.07. 19
63	2	1.3.1.36 Montáž sloupů přerušených 6.NP	1 den	16.07. 19	16.07. 19
64	1	1.3.1.37 Technologická přestávka 18	3 dny	17.07. 19	19.07. 19
65	2	1.3.1.38 Montáž železobetonových průvlaků	1 den	22.07. 19	22.07. 19
66	1	1.3.1.39 Montáž ŽB schodiště	1 den	23.07. 19	23.07. 19
67	2	1.3.1.40 Technologická přestávka 19	3 dny	24.07. 19	26.07. 19
68	1	1.3.1.41 Montáž panelů SPIROLL	2 dny	29.07. 19	30.07. 19
69	2	1.3.1.42 Technologická přestávka 20	3 dny	31.07. 19	02.08. 19
70	1	1.3.1.43 Montáž sloupů ocelových 7.NP	1 den	05.08. 19	05.08. 19
71	2	1.3.1.44 Montáž ocelových prvků	1 den	06.08. 19	06.08. 19
72	1	1.3.1.45 Montáž sloupů sklad	2 dny	07.08. 19	09.08. 19
73	2	1.3.1.46 Technologická přestávka 24	3 dny	12.08. 19	14.08. 19
74	1	1.3.1.47 Montáž železobetonových průvlaků	3 dny	02.09. 19	04.09. 19
75	2	1.3.1.48 Technologická přestávka 25	3 dny	05.09. 19	09.09. 19
76	1	**1.3.2 Opláštění**	**30 dny**	**05.09. 19**	**16.10. 19**
77	2	1.3.2.1 Montáž ocelové konstrukce pro osazení panelů Kingspan	10 dny	05.09. 19	18.09. 19
78	1	1.3.2.2 Montáž - Stěnové panely Kingspan, lemovací prvky	20 dny	19.09. 19	16.10. 19
79	2	**1.3.3 Zastřešení**	**33 dny**	**07.08. 19**	**20.09. 19**
80	1	1.3.3.1 Montáž žb vazníku - sklad	3 dny	10.09. 19	12.09. 19
81	2	1.3.3.2 Montáž trapézových plechů	2 dny	09.08. 19	12.08. 19
82	1	1.3.3.3 Osazování ocelových profilů IPE	2 dny	07.08. 19	08.08. 19
83	2	1.3.3.4 Montáž - Střešní panely Kingspan - sklad	4 dny	13.09. 19	18.09. 19
84	1	1.3.3.5 Montáž - Střešní panely Kingspan - administrativa	2 dny	13.08. 19	14.08. 19
85	2	1.3.3.6 Montáž parozábrany střechy	2 dny	13.08. 19	14.08. 19
86	1	1.3.3.7 Montáž parozábrany střešní terasy	1 den	13.08. 19	13.08. 19
87	2	1.3.3.8 Montáž tepelné izolace střešní terasy	1 den	14.08. 19	14.08. 19
88	1	1.3.3.9 Montáž tepelné izolace střechy - administrativa	2 dny	15.08. 19	16.08. 19
89	2	1.3.3.10 Betonová dlažba terasy na terče	1 den	15.08. 19	15.08. 19
90	1	1.3.3.11 Klempířské práce - oplechování atiky, klempířské prvky terasy	2 dny	19.09. 19	20.09. 19
91	2	**1.3.4 Vnitřní zděné příčky**	**50 dny**	**24.09. 19**	**02.12. 19**
92	1	1.3.4.1 Příčky SDK - sklad	2 dny	24.09. 19	25.09. 19
93	2	1.3.4.2 Příčky SDK 1.NP	2 dny	05.11. 19	06.11. 19
94	1	1.3.4.3 Příčky SDK 2.NP	3 dny	07.11. 19	11.11. 19
95	2	1.3.4.4 Příčky SDK 3.NP	3 dny	12.11. 19	14.11. 19
96	1	1.3.4.5 Příčky SDK 4.NP	3 dny	15.11. 19	19.11. 19
97	2	1.3.4.6 Příčky SDK 5.NP	3 dny	20.11. 19	22.11. 19
98	1	1.3.4.7 Příčky SDK 6.NP	3 dny	25.11. 19	27.11. 19
99	2	1.3.4.8 Příčky SDK 7.NP	3 dny	28.11. 19	02.12. 19
100	1	**1.4 Dokončovací práce**	**117 dny**	**19.09. 19**	**28.02. 20**
101	2	**1.4.1 Výplně vnějších otvorů**	**17 dny**	**17.10. 19**	**08.11. 19**
102	1	1.4.1.1 Výplně otvorů - sklad	2 dny	07.11. 19	08.11. 19
103	2	1.4.1.2 Výplně otvorů 1.NP	1 den	17.10. 19	17.10. 19
104	1	1.4.1.3 Výplně otvorů 2.NP	2 dny	18.10. 19	21.10. 19
105	2	1.4.1.4 Výplně otvorů 3.NP	2 dny	22.10. 19	23.10. 19
106	1	1.4.1.5 Výplně otvorů 4.NP	2 dny	24.10. 19	25.10. 19
107	2	1.4.1.6 Výplně otvorů 5.NP	2 dny	28.10. 19	29.10. 19
108	1	1.4.1.7 Výplně otvorů 6.NP	3 dny	30.10. 19	01.11. 19
109	2	1.4.1.8 Výplně otvorů 7.NP	3 dny	04.11. 19	06.11. 19
110	1	**1.4.2 Vnitřní hrubé rozvody a instalace**	**30 dny**	**07.11. 19**	**18.12. 19**
111	2	1.4.2.1 VZT rozvody	10 dny	07.11. 19	20.11. 19
112	1	1.4.2.2 ZTI rozvody	7 dny	21.11. 19	29.11. 19
113	2	1.4.2.3 ÚT rozvody	7 dny	02.12. 19	10.12. 19
114	1	1.4.2.4 Elektroinstalace	6 dny	11.12. 19	18.12. 19
115	2	**1.4.3 Úpravy povrchů vnitřní**	**27 dny**	**07.11. 19**	**13.12. 19**
116	1	1.4.3.1 Omítka vnitřního zdiva - sklad	2 dny	07.11. 19	08.11. 19
117	2	1.4.3.2 Omítka vnitřního zdiva 1.NP	3 dny	07.11. 19	11.11. 19
118	1	1.4.3.3 Omítka vnitřního zdiva 2.NP	4 dny	12.11. 19	15.11. 19
119	2	1.4.3.4 Omítka vnitřního zdiva 3.NP	4 dny	18.11. 19	21.11. 19
120	1	1.4.3.5 Omítka vnitřního zdiva 4.NP	4 dny	22.11. 19	27.11. 19
121	2	1.4.3.6 Omítka vnitřního zdiva 5.NP	4 dny	28.11. 19	03.12. 19
122	1	1.4.3.7 Omítka vnitřního zdiva 6.NP	4 dny	04.12. 19	09.12. 19
123	2	1.4.3.8 Omítka vnitřního zdiva 7.NP	4 dny	10.12. 19	13.12. 19
124	1	**1.4.4 Podlahy a podlahové konstrukce**	**33 dny**	**19.09. 19**	**04.11. 19**
125	2	1.4.4.1 Tepelné a akustické izolace podlah 2.NP	2 dny	18.10. 19	21.10. 19
126	1	1.4.4.2 Tepelné a akustické izolace podlah 3.NP	2 dny	22.10. 19	23.10. 19
127	2	1.4.4.3 Tepelné a akustické izolace podlah 4.NP	2 dny	24.10. 19	25.10. 19
128	1	1.4.4.4 Tepelné a akustické izolace podlah 5.NP	2 dny	28.10. 19	29.10. 19
129	2	1.4.4.5 Tepelné a akustické izolace podlah 6.NP	2 dny	30.10. 19	31.10. 19
130	1	1.4.4.6 Tepelné a akustické izolace podlah 7.NP	2 dny	01.11. 19	04.11. 19
131	2	1.4.4.7 Drátkobeton - sklad	3 dny	19.09. 19	23.09. 19
132	1	1.4.4.8 Betonové mazaniny podlahy 1.NP	1 den	17.10. 19	17.10. 19
133	2	1.4.4.9 Technologická přestávka 24	3 dny	24.09. 19	26.09. 19
134	1	**1.4.5 Předstěny a podhledy**	**3 dny**	**07.11. 19**	**11.11. 19**
135	2	1.4.5.1 Podhledy 7.NP	3 dny	07.11. 19	11.11. 19
136	1	**1.4.6 Konstrukce zámečnické**	**7 dny**	**07.11. 19**	**15.11. 19**
137	2	1.4.6.1 Zámečnické konstrukce 1.NP - točité schody, zábradlí	1 den	07.11. 19	07.11. 19
138	1	1.4.6.2 Zámečnické konstrukce 2.NP - točité schody, zábradlí	1 den	08.11. 19	08.11. 19
139	2	1.4.6.3 Zámečnické konstrukce 3.NP - točité schody, zábradlí	1 den	11.11. 19	11.11. 19
140	1	1.4.6.4 Zámečnické konstrukce 4.NP - točité schody, zábradlí	1 den	12.11. 19	12.11. 19
141	2	1.4.6.5 Zámečnické konstrukce 5.NP - točité schody, zábradlí	1 den	13.11. 19	13.11. 19
142	1	1.4.6.6 Zámečnické konstrukce 6.NP - točité schody, zábradlí	1 den	14.11. 19	14.11. 19
143	2	1.4.6.7 Zámečnické konstrukce 7.NP - točité schody, zábradlí	1 den	15.11. 19	15.11. 19
144	1	**1.4.7 Obklady keramické**	**8 dny**	**16.12. 19**	**25.12. 19**
145	2	1.4.7.1 Obklady keramické - sklad	1 den	16.12. 19	16.12. 19
146	1	1.4.7.2 Obklady keramické 1.NP	1 den	17.12. 19	17.12. 19
147	2	1.4.7.3 Obklady keramické 2.NP	1 den	18.12. 19	18.12. 19
148	1	1.4.7.4 Obklady keramické 3.NP	1 den	19.12. 19	19.12. 19
149	2	1.4.7.5 Obklady keramické 4.NP	1 den	20.12. 19	20.12. 19
150	1	1.4.7.6 Obklady keramické 5.NP	1 den	23.12. 19	23.12. 19
151	2	1.4.7.7 Obklady keramické 6.NP	1 den	24.12. 19	24.12. 19
152	1	1.4.7.8 Obklady keramické 7.NP	1 den	25.12. 19	25.12. 19
153	2	**1.4.8 Nášlapné vrstvy podlah**	**48 dny**	**22.10. 19**	**26.12. 19**
154	1	1.4.8.1 Dlažba - sklad	1 den	26.12. 19	26.12. 19
155	2	1.4.8.2 Dlažby 1.NP	4 dny	22.10. 19	25.10. 19
156	1	1.4.8.3 Dlažby 2.NP	4 dny	28.10. 19	31.10. 19
157	2	1.4.8.4 Dlažby 3.NP	4 dny	01.11. 19	06.11. 19
158	1	1.4.8.5 Dlažby 4.NP	4 dny	07.11. 19	12.11. 19
159	2	1.4.8.6 Dlažby 5.NP	4 dny	13.11. 19	18.11. 19
160	1	1.4.8.7 Dlažby 6.NP	4 dny	19.11. 19	22.11. 19
161	2	1.4.8.8 Dlažby 7.NP	4 dny	25.11. 19	28.11. 19
162	1	**1.4.9 Malby**	**23 dny**	**29.11. 19**	**31.12. 19**
163	2	1.4.9.1 Malby - sklad	2 dny	29.11. 19	02.12. 19
164	1	1.4.9.2 Malby 1.NP	3 dny	03.12. 19	05.12. 19
165	2	1.4.9.3 Malby 2.NP	3 dny	06.12. 19	10.12. 19
166	1	1.4.9.4 Malby 3.NP	3 dny	11.12. 19	13.12. 19
167	2	1.4.9.5 Malby 4.NP	3 dny	16.12. 19	18.12. 19
168	1	1.4.9.6 Malby 5.NP	3 dny	19.12. 19	23.12. 19
169	2	1.4.9.7 Malby 6.NP	3 dny	24.12. 19	26.12. 19
170	1	1.4.9.8 Malby 7.NP	3 dny	27.12. 19	31.12. 19
171	2	**1.4.10 Vnitřní kompletace**	**43 dny**	**20.12. 19**	**18.02. 20**
172	1	1.4.10.1 Kompletace VZT 1.NP	1 den	01.01. 20	01.01. 20
173	2	1.4.10.2 Kompletace ZTI 1.NP	1 den	20.12. 19	20.12. 19
174	1	1.4.10.3 Kompletace elektroinstalací 1.NP	1 den	23.12. 19	23.12. 19
175	2	1.4.10.4 Kompletace ÚT 1.NP	1 den	24.12. 19	24.12. 19
176	1	1.4.10.5 Osazování dveřních křídel 1.NP	1 den	25.12. 19	25.12. 19
177	2	1.4.10.6 Kompletace VZT 2.NP	1 den	26.12. 19	26.12. 19
178	1	1.4.10.7 Kompletace ZTI 2.NP	1 den	27.12. 19	27.12. 19
179	2	1.4.10.8 Kompletace elektroinstalací 2.NP	1 den	30.12. 19	30.12. 19
180	1	1.4.10.9 Kompletace ÚT 2.NP	1 den	31.12. 19	31.12. 19
181	2	1.4.10.10 Osazování dveřních křídel 2.NP	1 den	01.01. 20	01.01. 20
182	1	1.4.10.11 Kompletace VZT 3.NP	1 den	02.01. 20	02.01. 20
183	2	1.4.10.12 Kompletace ZTI 3.NP	1 den	03.01. 20	03.01. 20
184	1	1.4.10.13 Kompletace elektroinstalací 3.NP	1 den	06.01. 20	06.01. 20
185	2	1.4.10.14 Kompletace ÚT 3.NP	1 den	07.01. 20	07.01. 20
186	1	1.4.10.15 Osazování dveřních křídel 3.NP	1 den	08.01. 20	08.01. 20
187	2	1.4.10.16 Kompletace VZT 4.NP	1 den	09.01. 20	09.01. 20
188	1	1.4.10.17 Kompletace ZTI 4.NP	1 den	10.01. 20	10.01. 20
189	2	1.4.10.18 Kompletace elektroinstalací 4.NP	1 den	13.01. 20	13.01. 20
190	1	1.4.10.19 Kompletace ÚT 4.NP	1 den	14.01. 20	14.01. 20
191	2	1.4.10.20 Osazování dveřních křídel 4.NP	1 den	15.01. 20	15.01. 20
192	1	1.4.10.21 Kompletace VZT 5.NP	1 den	16.01. 20	16.01. 20
193	2	1.4.10.22 Kompletace ZTI 5.NP	1 den	17.01. 20	17.01. 20
194	1	1.4.10.23 Kompletace elektroinstalací 5.NP	1 den	20.01. 20	20.01. 20
195	2	1.4.10.24 Kompletace ÚT 5.NP	1 den	21.01. 20	21.01. 20
196	1	1.4.10.25 Osazování dveřních křídel 5.NP	1 den	22.01. 20	22.01. 20
197	2	1.4.10.26 Kompletace VZT 6.NP	1 den	23.01. 20	23.01. 20
198	1	1.4.10.27 Kompletace ZTI 6.NP	1 den	24.01. 20	24.01. 20
199	2	1.4.10.28 Kompletace elektroinstalací 6.NP	1 den	27.01. 20	27.01. 20
200	1	1.4.10.29 Kompletace ÚT 6.NP	1 den	28.01. 20	28.01. 20
201	2	1.4.10.30 Osazování dveřních křídel 6.NP	1 den	29.01. 20	29.01. 20
202	1	1.4.10.31 Kompletace VZT 7.NP	1 den	30.01. 20	30.01. 20
203	2	1.4.10.32 Kompletace ZTI 7.NP	1 den	31.01. 20	31.01. 20
204	1	1.4.10.33 Kompletace elektroinstalací 7.NP	1 den	03.02. 20	03.02. 20
205	2	1.4.10.34 Kompletace ÚT 7.NP	1 den	04.02. 20	04.02. 20
206	1	1.4.10.35 Osazování dveřních křídel 7.NP	1 den	05.02. 20	05.02. 20
207	2	1.4.10.36 Kompletace VZT - sklad	2 dny	06.02. 20	07.02. 20
208	1	1.4.10.37 Kompletace ZTI - sklad	2 dny	10.02. 20	11.02. 20
209	2	1.4.10.38 Kompletace elektroinstalací - sklad	2 dny	12.02. 20	13.02. 20
210	1	1.4.10.39 Kompletace ÚT - sklad	2 dny	14.02. 20	17.02. 20
211	2	1.4.10.40 Osazování dveřních křídel - sklad	1 den	18.02. 20	18.02. 20
212	1	**1.4.11 Zařízení staveniště - odstranění**	**8 dny**	**19.02. 20**	**28.02. 20**
213	2	1.4.11.1 Dokončení stavby	3 dny	19.02. 20	21.02. 20
214	1	1.4.11.2 Odstranění objektů ZS	3 dny	24.02. 20	26.02. 20
215	2	1.4.11.3 Odstranění oplocení ZS	1 den	27.02. 20	27.02. 20
216	1	1.4.11.4 Předání stavby	1 den	28.02. 20	28.02. 20

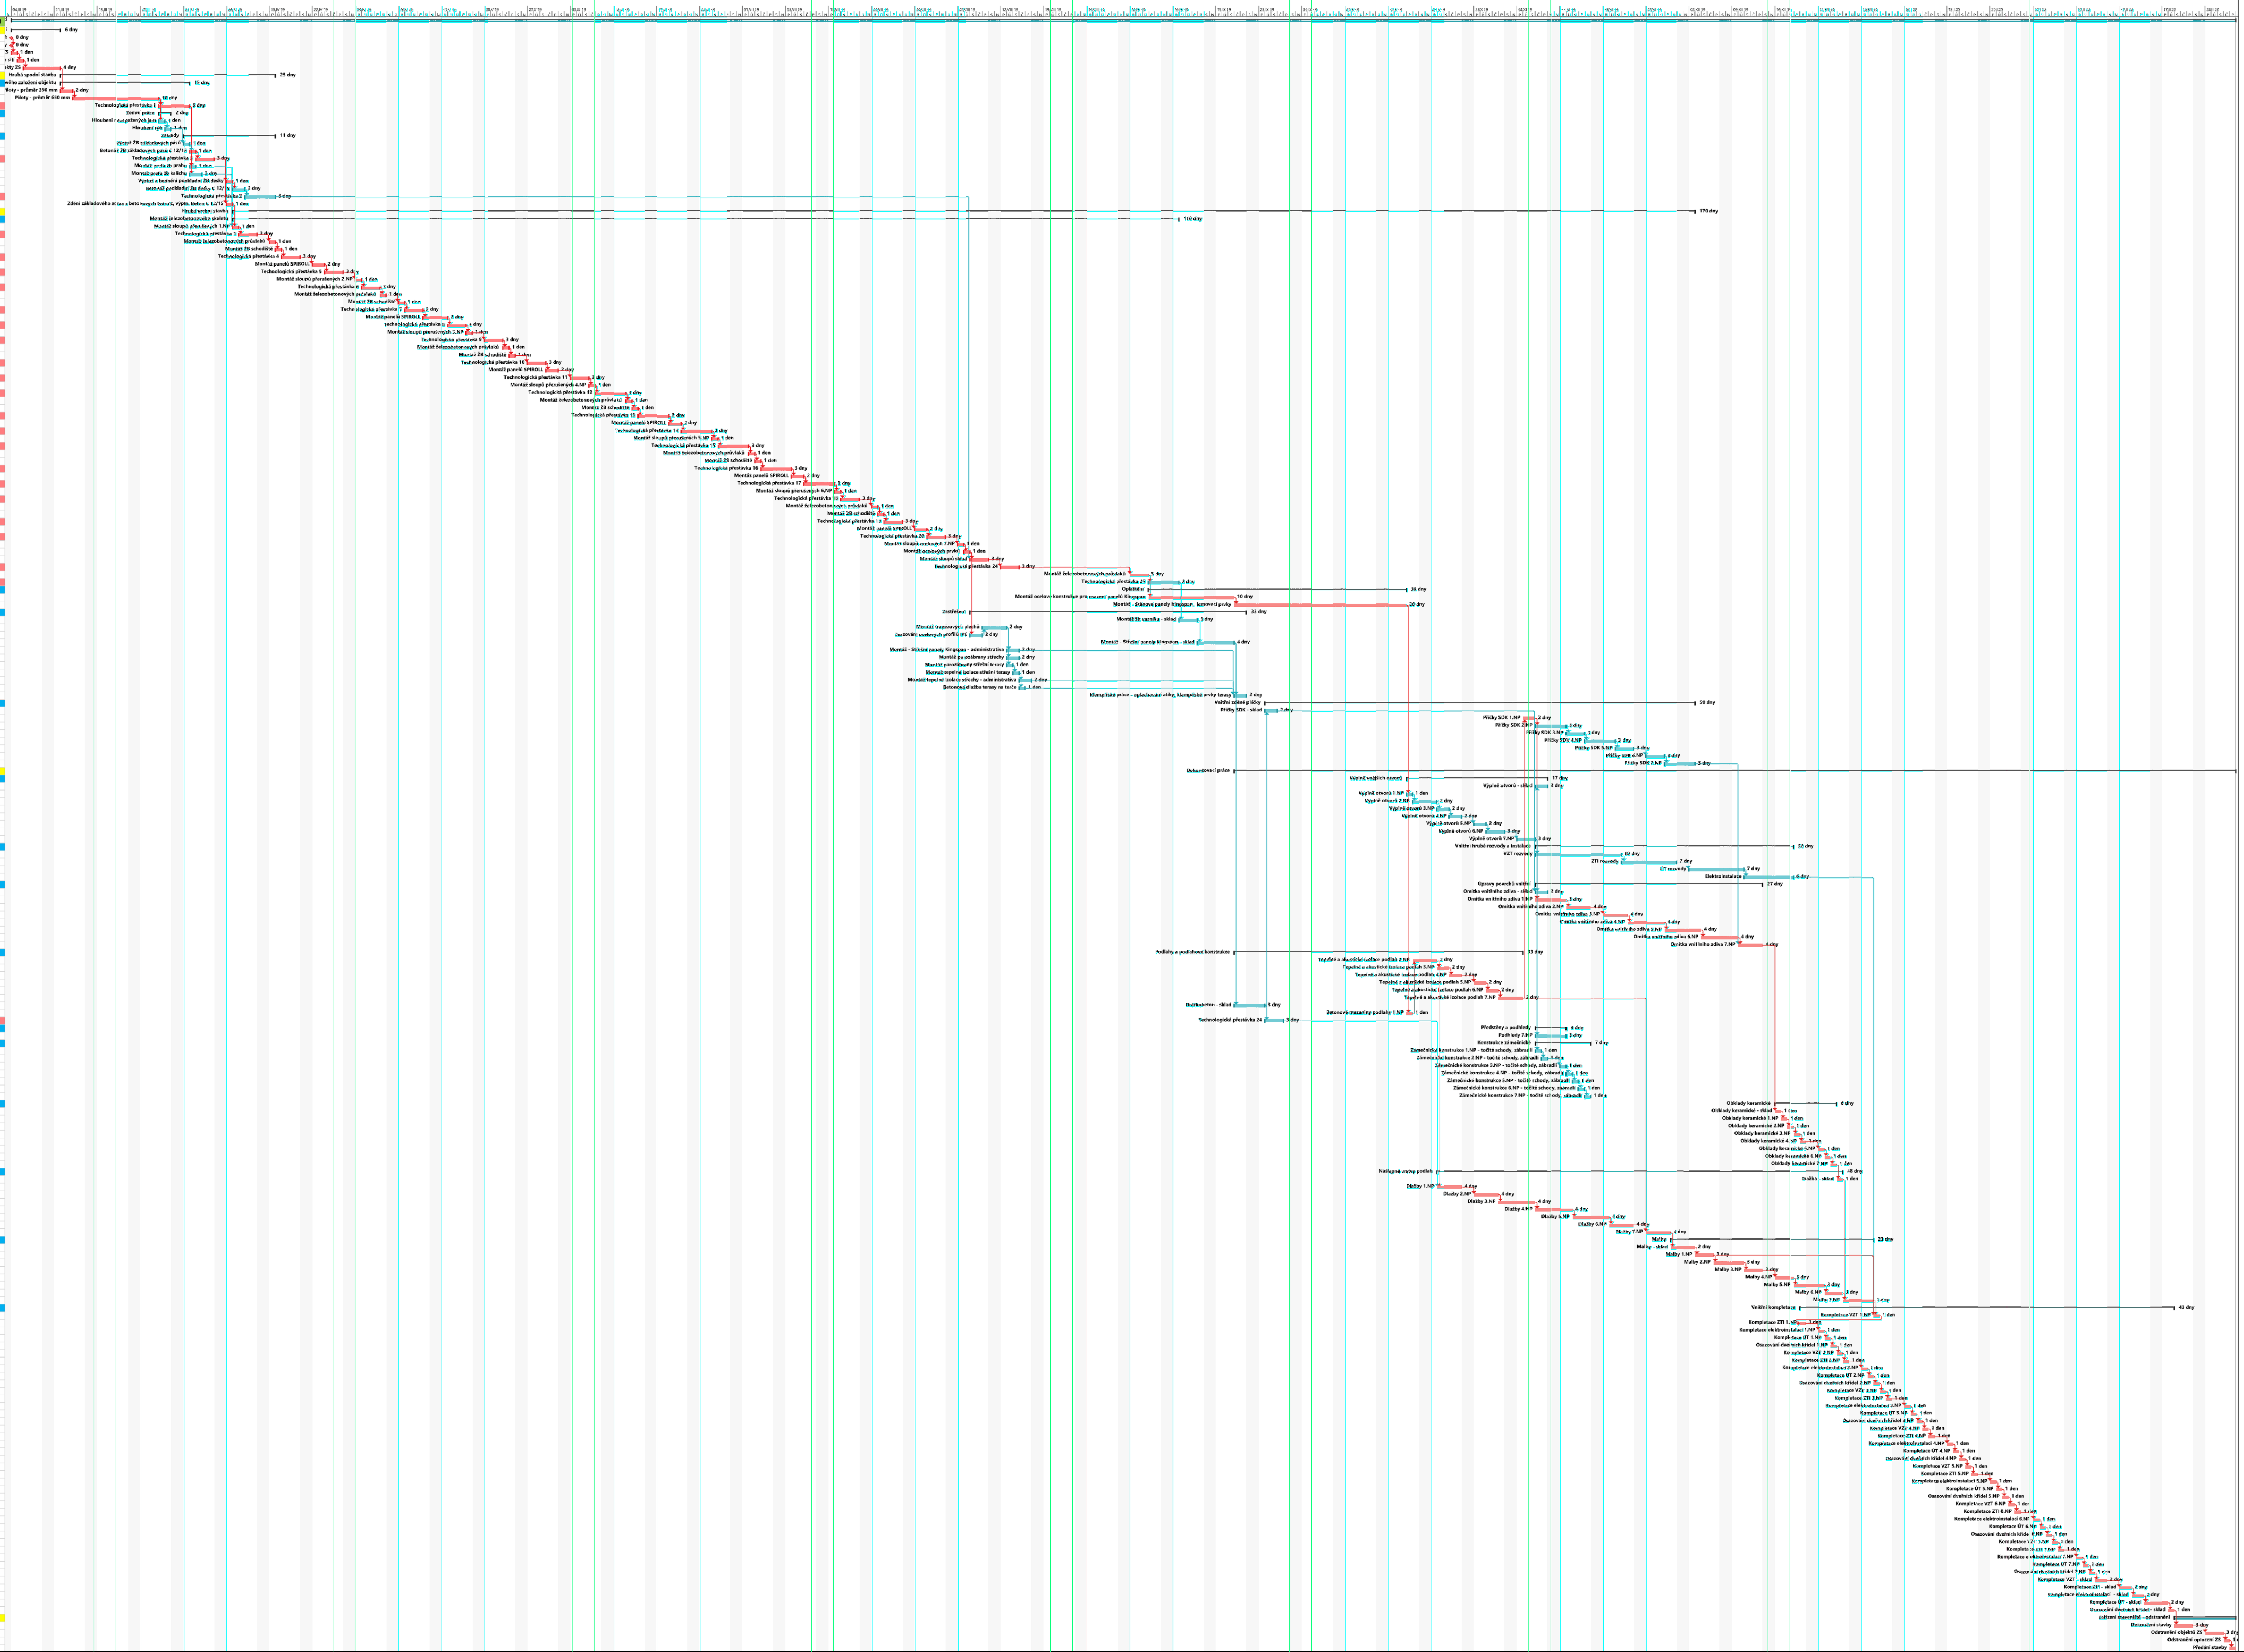

Projekt: Harmonogram | Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín

Stránka 1

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	FAKULTA STAVEBNÍ – ústav technologie, mechanizace a řízení staveb	
VYPRACOVAL	Bc. Josef Polášek		
KONTROLOVAL	Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.		
NÁZEV DP	SKLADOVACÍ HALA S ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTÍ BRNO - SLATINA	FORMÁT	A1
STAVEBNÍK	STK Slatina reality s.r.o	DATUM	1/2019
MÍSTO STAVBY	Slatina; ul. Řípská; p.č. 2252/14, 2252/107, 2252/128, 2252/77	STUPEŇ PD	–
OBSAH:	ČASOVÝ HARMONOGRAM SO01 A SO02	MĚŘÍTKO -	Č. VÝKRESU P.06
