



						2017										2018										2019							
SO	Název	Cena	Množství	Zahájení	Dokončení	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen			
SO 01	Příprava území a zemní práce	6 066 032 Kč	22642 m3	6.3.2017	30.3.2017	6 066 032 Kč																										6 066 032 Kč	
	Základy	10 885 909 Kč		31.3.2017	12.6.2017	2 721 477 Kč	2 721 477 Kč	2 721 477 Kč																								10 885 909 Kč	
	1.pp	7 206 363 Kč		12.6.2017	30.8.2017				2 402 121 Kč	2 402 121 Kč	2 402 121 Kč																						7 206 363 Kč
	1.np	7 036 752 Kč		24.8.2017	7.11.2017						1 759 188 Kč	1 759 188 Kč	1 759 188 Kč																				7 036 752 Kč
	2.np	7 037 553 Kč		18.10.2017	14.12.2017									2 345 851 Kč	2 345 851 Kč																	7 037 553 Kč	
	3.np	7 034 242 Kč		11.12.2017	19.2.2018										2 344 747 Kč	2 344 747 Kč	2 344 747 Kč															7 034 242 Kč	
	4.np	7 059 131 Kč		15.2.2018	20.4.2018												2 353 044 Kč	2 353 044 Kč	2 353 044 Kč													7 059 131 Kč	
	5.np	6 931 191 Kč		17.4.2018	20.6.2018															2 310 397 Kč	2 310 397 Kč												6 931 191 Kč
	střecha, rozvody, povrchy	5 520 028 Kč		20.6.2018	18.9.2018																1 380 007 Kč	1 380 007 Kč	1 380 007 Kč	1 380 007 Kč	1 380 007 Kč								5 520 028 Kč
	dokončovací práce	8 190 251 Kč		9.8.2018	9.11.2018																			2 047 563 Kč	2 047 563 Kč	2 047 563 Kč	2 047 563 Kč						
Vedlejší náklady	1 217 479 Kč	kpl	6.3.2017	9.11.2018	608 740 Kč																					608 740 Kč						1 217 479 Kč	
SO 11	Přípojka vodovodu	16 500 Kč	6,60 m	červenec 2018																	16 500 Kč											16 500 Kč	
SO 12	Vodovod	11 250 Kč	4,50 m	červenec 2018																	11 250 Kč											11 250 Kč	
SO 13	Přeložka vodovodu	336 500 Kč	60 m	srpen 2018																		336 500 Kč										336 500 Kč	
SO 14	Dešťová kanalizace	1 154 000 Kč	68,60 m	červenec 2018																	1 154 000 Kč											1 154 000 Kč	
SO 15	Splašková kanalizace	301 500 Kč	35,25 m	červenec 2018																	301 500 Kč											301 500 Kč	
SO 16	Přípojka a rozvod plynu	108 160 Kč	33,80 m	srpen 2018																	108 160 Kč											108 160 Kč	
SO 21	Přípojka NN	18 500 Kč	46,2 m	březen 2017		18 500 Kč																										18 500 Kč	
SO 22	Přeložka NN + VN	152 500 Kč	92 m	srpen 2018																		152 500 Kč										152 500 Kč	
SO 23	Přeložka VO	155 000 Kč	155,5m	srpen 2018																		155 000 Kč										155 000 Kč	
SO 26	Přeložka SLP	58 000 Kč	104,9m	srpen 2018																		58 000 Kč										58 000 Kč	
SO 31	Rozšíření přístupové komunikace	1 036 390 Kč	339,8 m2	říjen 2018																				1 036 390 Kč								1 036 390 Kč	
SO 32	Komunikace a zpevněné plochy	464 850 Kč	258,25 m2	listopad 2018																					464 850 Kč							464 850 Kč	
SO 41	Sadové a venkovní úpravy	980 000 Kč	3500 m2	březen 2019																							464 850 Kč			980 000 Kč		980 000 Kč	
SO 42	Opěrné zdi	1 320 798 Kč	465,89 m2	srpen - září 2018																			660 399 Kč	660 399 Kč								1 320 798 Kč	
						9 414 749 Kč	2 721 477 Kč	2 721 477 Kč	5 123 598 Kč	2 402 121 Kč	4 161 309 Kč	1 759 188 Kč	4 105 039 Kč	4 105 039 Kč	4 690 598 Kč	2 344 747 Kč	4 697 791 Kč	2 353 044 Kč	4 663 440 Kč	2 310 397 Kč	3 690 404 Kč	2 971 417 Kč	4 789 969 Kč	4 087 969 Kč	3 083 953 Kč	3 121 152 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	980 000 Kč	80 298 877 Kč		
Cena komplet		80 298 877 Kč																															



DRUH PRÁCE:	DIPLOMOVÁ PRÁCE			
VYPRACOVAL:	ING. JAKUB DOLEŽEL			
VEDOUcí DP:	ING. MARTIN MOHAPL, Ph. D.			
NÁZEV STAVBY:	REZIDENCE KOCIÁNKA		MĚŘÍTKO:	-
	UL. KOCIÁNKA, BRNO - MĚSTO, JIHMORAVSKÝ KRAJ		FORMÁT:	3 x A4
			ÚČEL:	RDS
OBSAH:	ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN		ČÍSLO PŘÍLOHY:	2
	OBJEKTOVÝ		DATUM:	11/2016

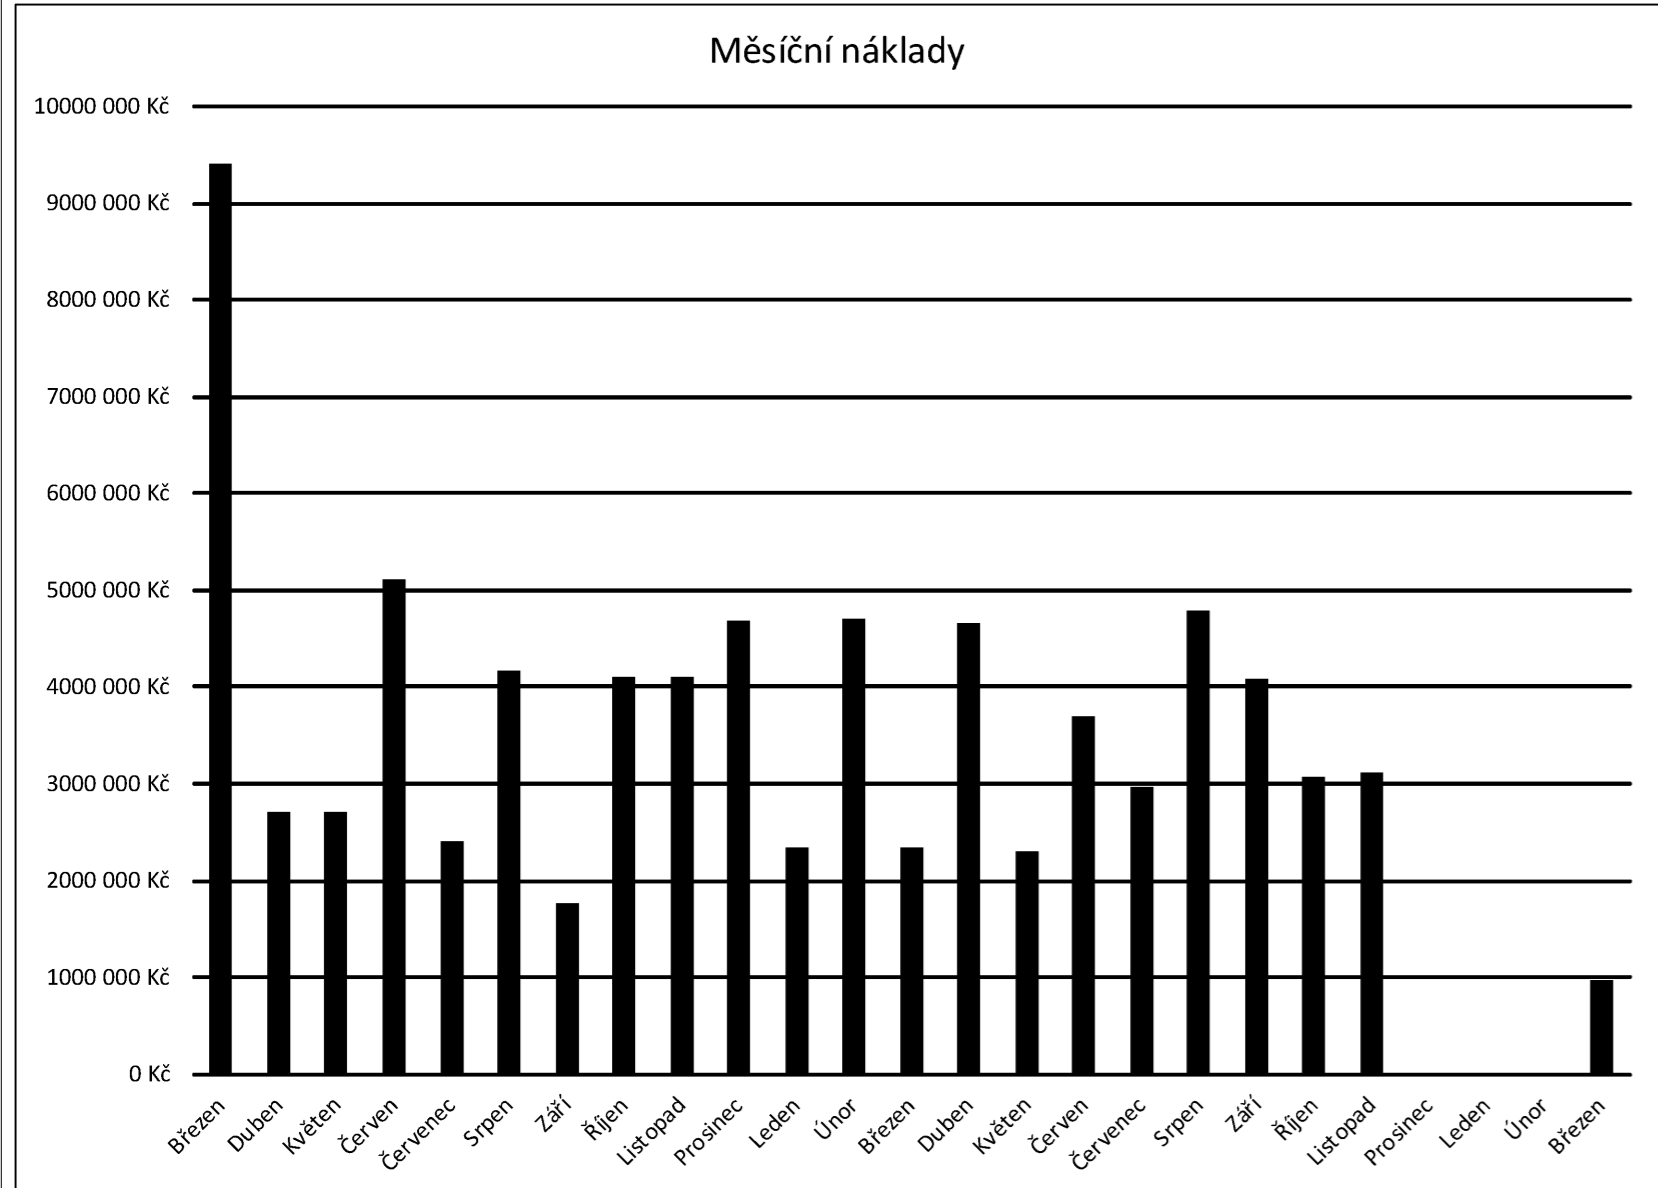

VUT BRNO

FAKULTA ústav

STAVEBNÍ technologie,

mechanizace a řízení staveb
