ID	Kód WBS	Název úkolu	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán
1	1	**Harmonogram prací D1 úsek 22 aktualizace k 27.4.2016**	**25.2. 16**	**30.11. 16**
2	1.1	**Podpis smlouvy o Dílo**	25.2. 16	25.2. 16
3	1.2	**Předání staveniště**	1.3. 16	1.3. 16
4	1.3	**Zahájení provádění Díla**	1.3. 16	1.3. 16
5	1.4	**Realizace Díla**	**1.3. 16**	**30.11. 16**
6	1.4.1	**SO 101.1 - Dálnice D1 km 162.750 - 168.170**	**16.6. 16**	**30.11. 16**
7	1.4.1.1	**Pravá polovina D1 (PJP)**	**16.6. 16**	**31.8. 16**
47	1.4.1.2	**Levá polovina D1 (LJP)**	**1.9. 16**	**15.11. 16**
79	1.4.1.3	**Střední dělící pás (SDP)**	**16.11. 16**	**30.11. 16**
83	1.4.2	**SO 101.2 - Opravy větví MÚK**	**1.8. 16**	**15.11. 16**
84	1.4.2.1	**Pravá polovina (PJP)**	**1.8. 16**	**31.8. 16**
87	1.4.2.2	**Levá polovina (LJP)**	**16.10. 16**	**15.11. 16**
90	1.4.3	**SO 101.3 - Opravy před stavbou**	**1.3. 16**	**15.3. 16**
100	1.4.4	**SO 101.4 - Propustky**	**1.9. 16**	**16.11. 16**
115	1.4.5	**SO 101.5 - Oplocení**	**1.7. 16**	**30.11. 16**
120	1.4.6	**SO 150 - Lesní cesta v km 164.483**	**1.11. 16**	**30.11. 16**
129	1.4.7	**SO 172.1 - Dopravní opatření během výstavby**	**1.3. 16**	**30.11. 16**
130	1.4.7.1	**Etapa 0**	**1.3. 16**	**15.3. 16**
132	1.4.7.2	**Etapa 1**	**1.3. 16**	**15.3. 16**
135	1.4.7.3	**Etapa 2a**	**16.3. 16**	**15.4. 16**
139	1.4.7.4	**Etapa 2b**	**16.4. 16**	**15.6. 16**
143	1.4.7.5	**Etapa 3**	**16.6. 16**	**31.8. 16**
146	1.4.7.6	**Etapa 4**	**1.9. 16**	**15.11. 16**
149	1.4.7.7	**Etapa 5**	**16.11. 16**	**30.11. 16**
151	1.4.8	**SO 172.2.1 - Provizorní stavební úpravy – komunikace**	**1.3. 16**	**15.6. 16**
152	1.4.8.1	**Provizorní přejezd SDP v km 168.260 - 168.380**	**1.3. 16**	**15.3. 16**
163	1.4.8.2	**Levá polovina (LJP)**	**16.3. 16**	**15.4. 16**
178	1.4.8.3	**Střední dělící pás (SDP)**	**16.4. 16**	**15.6. 16**
190	1.4.9	**SO 172.2.2 - Provizorní stavební úpravy – mosty**	**16.3. 16**	**15.6. 16**
191	1.4.9.1	**Levá polovina (LJP) - levý most**	**16.3. 16**	**15.4. 16**
193	1.4.9.2	**Střední dělící pás (SDP) - levý most**	**16.4. 16**	**15.6. 16**
201	1.4.10	**SO 172.3.1 - Oprava odpočívek Devět Křížů - Stavební úpravy**	**16.6. 16**	**30.11. 16**
206	1.4.11	**SO 172.3.2 - Oprava odpočívek Devět Křížů - Dopravní značení**	**16.6. 16**	**30.11. 16**
211	1.4.12	**SO 172.3.3 - Oprava odpočívek Devět Křížů - VO**	**16.6. 16**	**30.11. 16**
216	1.4.13	**SO 172.3.4 - Oprava odpočívek Devět Křížů - Úprava kabelů NN**	**16.6. 16**	**30.11. 16**
221	1.4.14	**SO 173.1 - Dopravní značení**	**1.8. 16**	**15.11. 16**
222	1.4.14.1	**Pravá polovina (PJP)**	**1.8. 16**	**31.8. 16**
225	1.4.14.2	**Levá polovina (LJP)**	**16.10. 16**	**15.11. 16**
228	1.4.15	**SO 173.3 - Dopravní značení proměnné**	**16.10. 16**	**30.11. 16**
237	1.4.16	**SO 201.1 - Most ev. č. D1 – 202 – pravý most**	**16.6. 16**	**31.8. 16**
271	1.4.17	**SO 201.2 - Most ev. č. D1 – 202 – levý most**	**1.9. 16**	**15.11. 16**
305	1.4.18	**SO 221.1 - Nadjezd ev.č. D1 – 203**	**16.4. 16**	**15.11. 16**
327	1.4.19	**SO 221.2 - Nadjezd ev.č. D1 – 203 (snesení)**	**1.3. 16**	**15.3. 16**
331	1.4.20	**SO 222 - Nadjezd ev.č. D1 – 204 (snesení)**	**1.3. 16**	**15.3. 16**
335	1.4.21	**SO 301 - Kanalizace D1 v km 162.750 - 168.170**	**16.4. 16**	**15.11. 16**
336	1.4.21.1	**Páteřní řad kanalizace ve SDP**	**16.4. 16**	**15.6. 16**
344	1.4.21.2	**Odvodnění PJP**	**16.6. 16**	**31.8. 16**
347	1.4.21.3	**Odvodnění LJP**	**1.9. 16**	**15.11. 16**
350	1.4.22	**SO 451 - Ochrana kabelů Telefónica O2 v SDP dálnice D1**	**16.4. 16**	**15.6. 16**
353	1.4.23	**SO 490 - Ochrana kabelů ŘSD v SDP dálnice D1 po dobu stavby**	**16.4. 16**	**15.6. 16**
356	1.4.24	**SO 491 - Dálniční systém SOS - kabelové vedení**	**16.4. 16**	**30.9. 16**
360	1.4.25	**SO 492 - Dálniční systém SOS - hlásky**	**16.4. 16**	**30.11. 16**
364	1.4.26	**SO 493 - Dálniční systém SOS - meteostanice**	**1.9. 16**	**15.11. 16**
368	1.4.27	**SO 494 - Dálniční systém SOS - kabelové šachty a prostupy**	**16.4. 16**	**15.11. 16**
372	1.4.28	**SO 495 - Dálniční systém SOS - trubky pro optické kabely**	**16.4. 16**	**15.11. 16**
376	1.4.29	**SO 496 - Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy**	**16.4. 16**	**15.11. 16**
380	1.4.30	**SO 497 - Dálniční systém SOS - optický kabel DIS**	**1.9. 16**	**15.11. 16**
382	1.4.31	**SO 498 - Dálniční systém SOS - kamerový systém**	**1.9. 16**	**15.11. 16**
385	1.4.32	**SO 499 - Úpravy dispečinku SSÚD Domašov**	**1.11. 16**	**30.11. 16**
388	1.4.33	**SO 801 - Vegetační úpravy**	**1.9. 16**	**30.11. 16**
399	1.5	**Realizace - průběh výstavby a technologická přestávka**	**1.3. 16**	**31.3. 17**
400	1.5.1	Realizace - výstavba běží - etapy 0, 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5	1.3. 16	30.11. 16
401	1.5.2	Zimní technologická přestávka	1.12. 16	28.2. 17
402	1.5.3	Realizace - dokončovací práce a předání Díla	1.12. 16	31.3. 17
403	1.6	**Termíny postupných závazných milníků dle Modifikace**	**1.3. 16**	**31.3. 17**
404	1.6.1	Termín zahájení stavby	1.3. 16	1.3. 16
405	1.6.2	Dle modifikovaných OP - dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapám 0,1 a 2 dle ZOV do 3,5 měsíců od zahájení stavby	15.6. 16	15.6. 16
406	1.6.3	Modifikace OP - dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapě 3 dle ZOV do 6 měsíců od zahájení stavby	31.8. 16	31.8. 16
407	1.6.4	Modifikace OP - Doba pro uvedení stavby do provozu (9 měsíců od zahájení stavby)	30.11. 16	30.11. 16
408	1.6.5	1.1.3.3 OP - Doba pro dokončení stavby-Předání Díla (13 měsíců od zahájení stavby)	31.3. 17	31.3. 17
409	1.6.5	Původní milník 1.6.4 Doba pro uvedení stavby do provozu	13.7. 17	13.7. 17

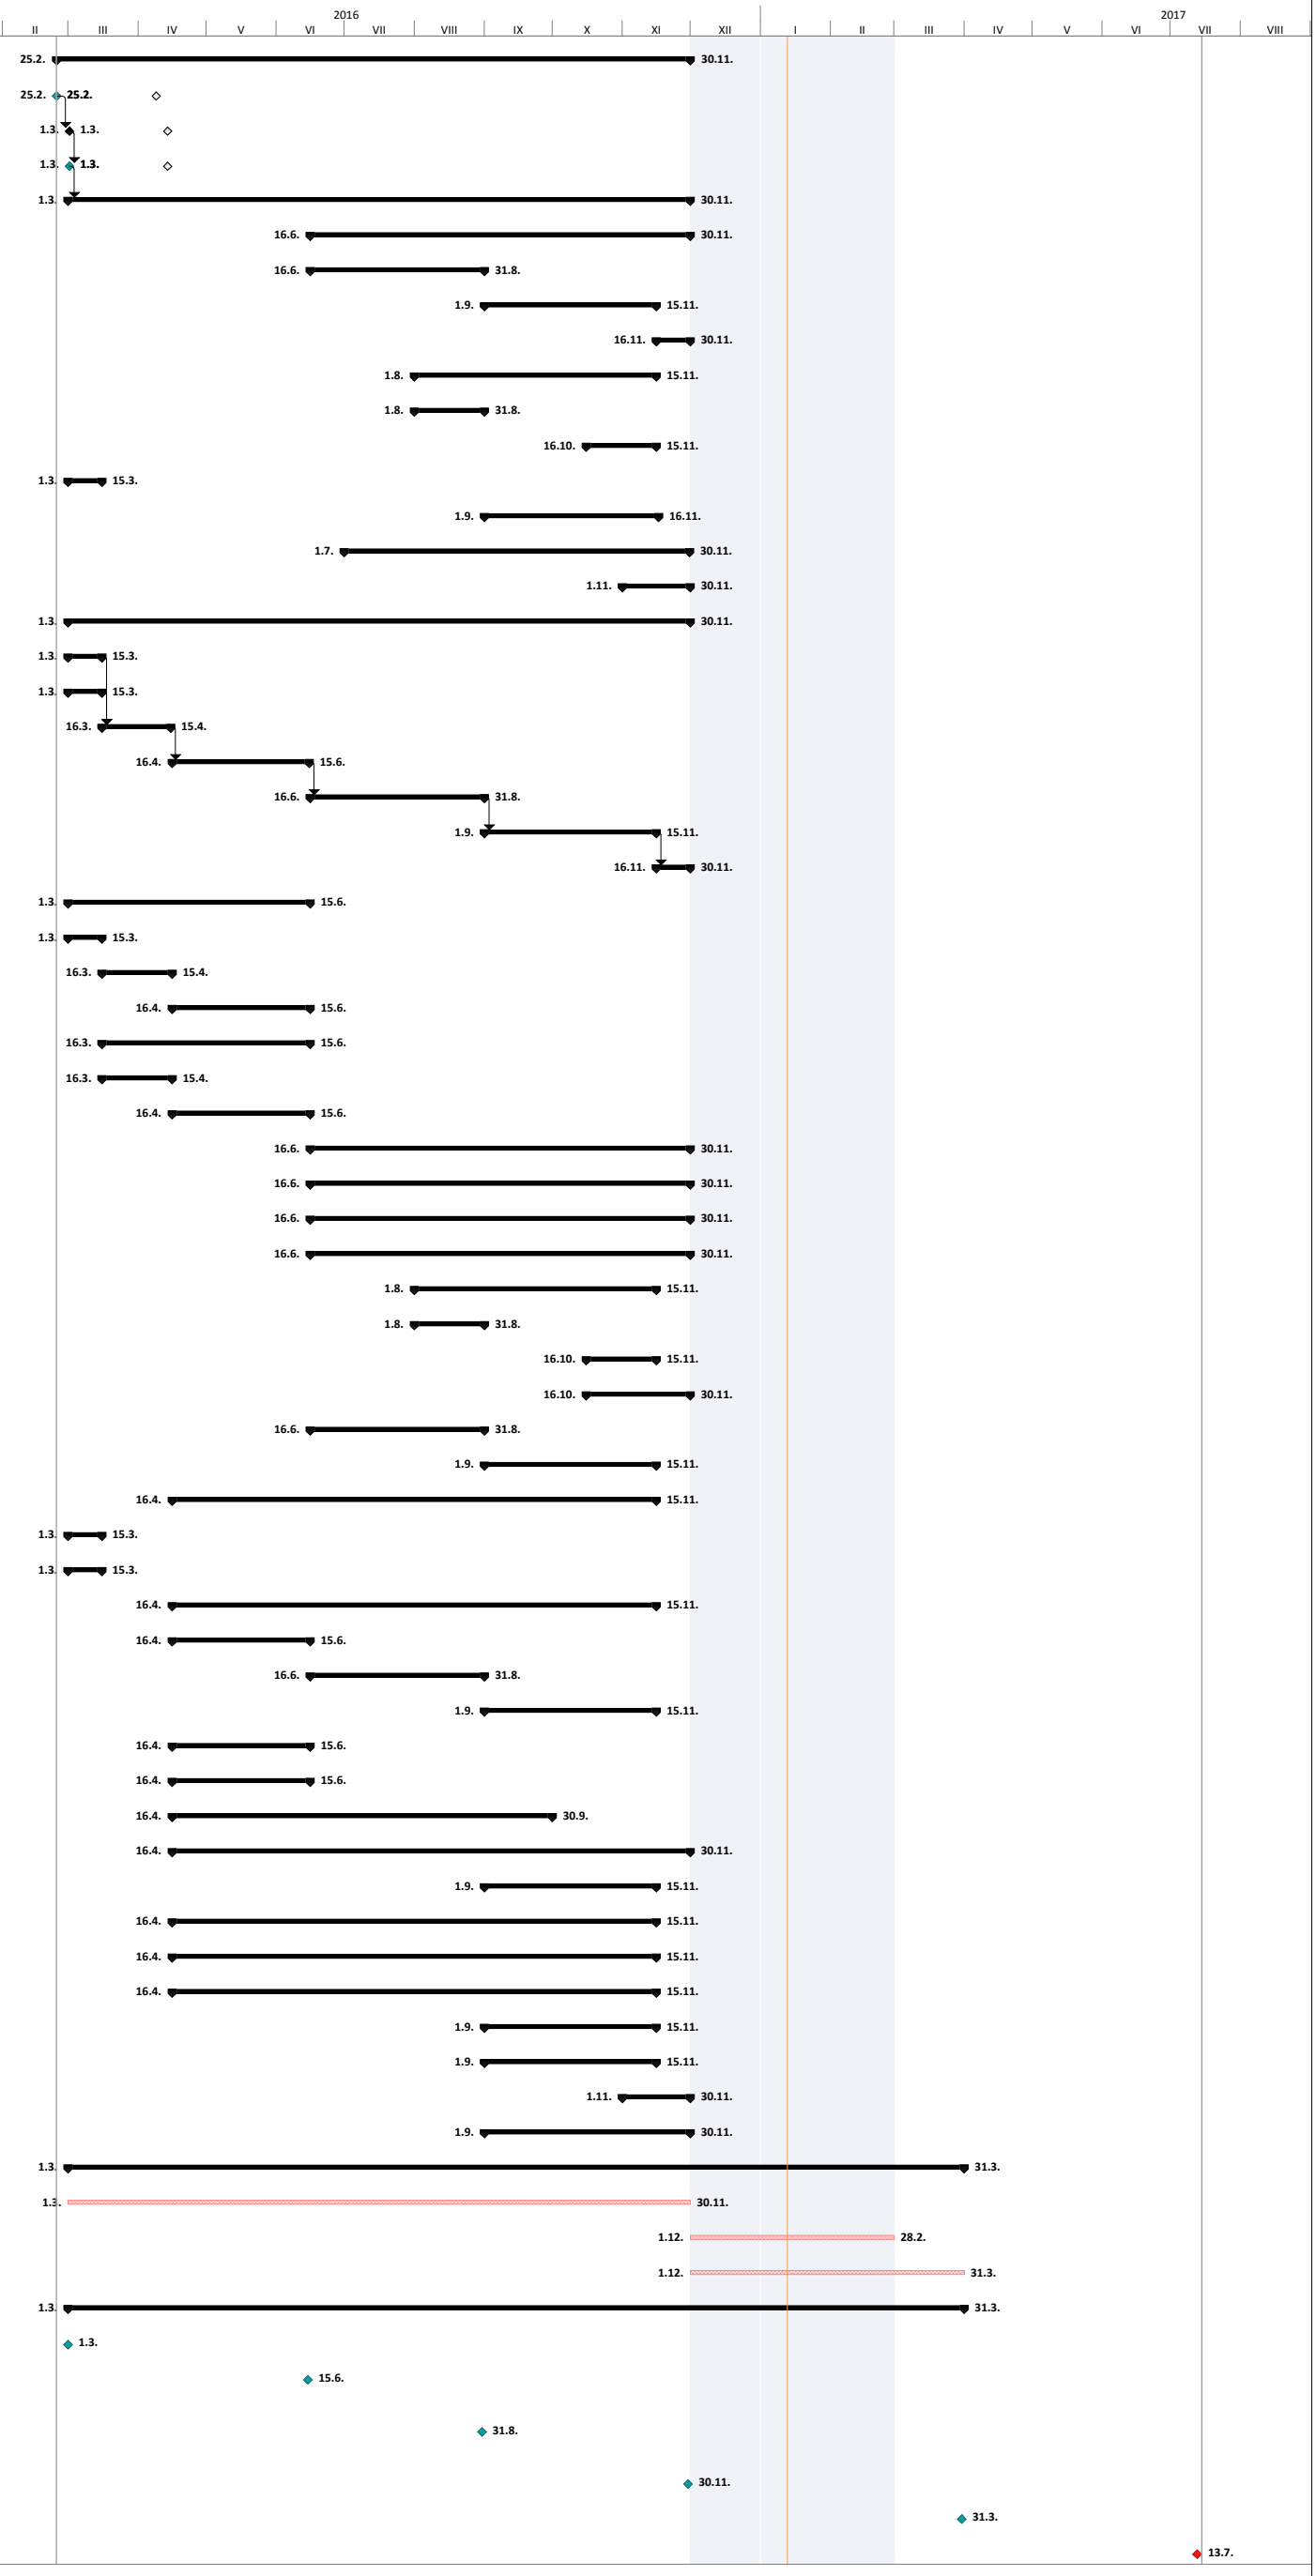

Rozdělení kritického úkolu
Průběh kritického úkolu
Úkol
Rozdělení
Průběh úkolu
Ruční úkol
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Pouze s dobou trvání
Kritický
Kritické rozdělení
Směrný plán
Rozdělení podle směrného plánu
Milník podle směrného plánu
Milník
Průběh souhrnného úkolu
Souhrnný
Ruční souhrn
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Neaktivní úkol
Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Konečný termín
PD
SoD
OBJ ZAH
OBJ DOK
