ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ

	Název stavebního objektu	M.J. [dle THU]	Počet M.J.	Cena dle THU [Kč]	Cena celková [Kč]	Celková cena za soubor [Kč]	Doba trvání: Týden	Doba trvání: Měsíc	Termíny: Zahájení	Termíny: Dokončení
SO 201	Příprava území	m²	2 728,70	550,00 Kč	1 500 785 Kč	1 722 206 Kč	2	0,3	17.02.2020	28.02.2020
201.02	Přeložka veřejného osvětlení	m	115,56	1 916,00 Kč	221 421 Kč		1	0,2	10.08.2021	16.08.2021
SO 204	Objekt F	m²	15 084,00	7 335,00 Kč	110 641 140 Kč	110 641 140 Kč	130	25,9	02.03.2020	26.08.2022
SO 206	Vodní plocha - napojení na retenční objekt	m	60,00	8 840,00 Kč	530 400 Kč	530 400 Kč	2	0,3	06.12.2021	17.12.2021
SO 207	Sadové úpravy	m²	2 925,57	548,00 Kč	1 603 211 Kč	1 603 211 Kč	5	1,0	07.09.2021	11.10.2021
SO 208-01	Komunikace a zpevněné plochy - veřejná část (asfaltový beton)	m²	492,14	2 980,00 Kč	1 466 568 Kč	3 183 542 Kč	3	0,6	26.10.2021	15.11.2021
208-01a	Komunikace a zpevněné plochy - veřejná část (dlažba)	m²	1 015,96	1 690,00 Kč	1 716 974 Kč		5	1,0	16.11.2021	20.12.2021
SO 208-02	Komunikace a zpevněné plochy - areálová část	m²	266,71	5 300,00 Kč	1 413 584 Kč	2 785 700 Kč	3	0,6	11.01.2022	31.01.2022
208-02a	Komunikace a zpevněné plochy - areálová část (kamenivo)	m²	177,13	3 500,00 Kč	619 951 Kč		2	0,4	01.02.2022	14.02.2022
208-02b	Komunikace a zpevněné plochy - areálová část (dlažba)	m²	445,07	1 690,00 Kč	752 166 Kč		2	0,4	15.02.2022	28.02.2022
SO 210-01	Venkovní kanalizace - pro veřejnou potřebu	m	189,00	6 615,00 Kč	1 250 235 Kč	1 872 785 Kč	2	0,4	12.10.2021	25.10.2021
210-02	Venkovní kanalizace - přípojka kanalizace	m	10,00	5 215,00 Kč	52 150 Kč		1	0,2	16.11.2021	22.11.2021
210-03	Venkovní kanalizace - areálová kanalizace	m	23,00	6 200,00 Kč	142 600 Kč		2	0,4	28.12.2021	10.01.2022
210-03a	Venkovní kanalizace - areálová kanalizace - splašková	m	57,00	6 200,00 Kč	353 400 Kč		2	0,4	14.12.2021	27.12.2021
210-03b	Venkovní kanalizace - areálová kanalizace - dešťová	m	12,00	6 200,00 Kč	74 400 Kč		3	0,6	23.11.2021	13.12.2021
SO 211-01	Venkovní rozvody vody - přípojka vody a vodoměrná šachta-D,F	m	19,00	5 430,00 Kč	103 170 Kč	391 495 Kč	1	0,2	23.11.2021	29.11.2021
211-03	Venkovní rozvody vody - areálové rozvody vody	m	95,00	3 035,00 Kč	288 325 Kč		2	0,4	30.11.2021	13.12.2021
SO 213-01	Přípojka STL plynu - přípojka STL plynu-D,F	m	28,00	7 850,00 Kč	219 800 Kč	219 800 Kč	1	0,1	04.10.2021	08.10.2021
SO 214.02	Venkovní osvetlení	m	451,65	1 916,00 Kč	865 365 Kč	865 365 Kč	2	0,4	24.08.2021	06.09.2021
SO 215	Venkovní rozvody SLP	m	276,00	1 500,00 Kč	414 000 Kč	414 000 Kč	1	0,2	17.08.2021	23.08.2021
	Suma celkových nákladů v jednotlivých týdnech (bez DPH)					0 Kč	0 Kč			
	Suma celkových nákladů v jednotlivých měsících (bez DPH)					1 500 785 Kč	4 255 428 Kč	3 404 343 Kč	3 404 343 Kč	4 255 428 Kč
	Suma finančních toků v čase (bez DPH)					1 500 785 Kč	5 756 213 Kč	9 160 556 Kč	12 564 899 Kč	16 820 327 Kč
	Suma celkových nákladů (bez DPH)				124 228 843 Kč					

Grafická část

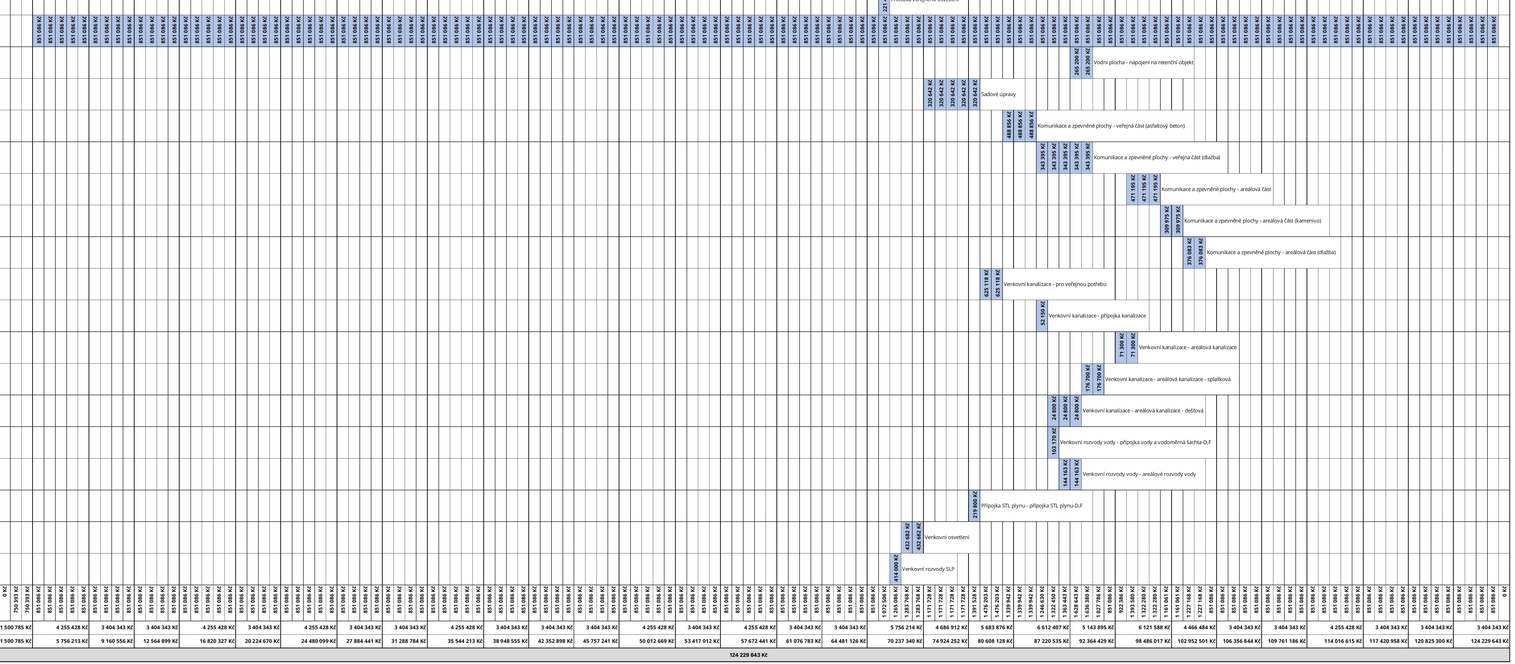

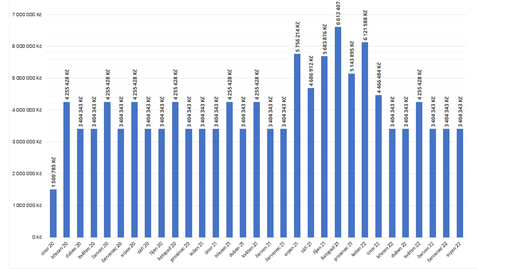
Potřeba finančních prostředků v jednotlivých měsících
0 Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
3 000 000 Kč
4 000 000 Kč
5 000 000 Kč
6 000 000 Kč
7 000 000 Kč
1 500 785 Kč
4 255 428 Kč
3 404 343 Kč
5 756 213 Kč
4 686 912 Kč
5 683 876 Kč
6 412 407 Kč
5 143 895 Kč
4 409 484 Kč
3 404 343 Kč
4 255 428 Kč
3 404 343 Kč
3 404 343 Kč
3 404 343
