Stavebně technologický projekt modernizace objektu T8, VUT v Brně

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Zařízení staveniště**	**380 dny**	**31.12. 13**	**15.6. 15**
2	Mobilní oplocení	380 dny	31.12. 13	15.6. 15
3	Buňkoviště	380 dny	31.12. 13	15.6. 15
4	Přípojení energií	380 dny	31.12. 13	15.6. 15
5	Stavební výtah	282 dny	10.1. 14	9.2. 15
6	Schodišťová věž	282 dny	10.1. 14	9.2. 15
7	Lešení I. etapa	55 dny	15.4. 14	30.6. 14
8	Lešení II. etapa	54 dny	19.8. 14	2.11. 14
9	Lešení III. Etapa	50 dny	3.3. 15	11.5. 15
10	Vnitřní prostorové lešení	19 dny	17.4. 15	13.5. 15
11	Sila na suché omítkové směsi	82 dny	3.10. 14	26.1. 15
12	Skládka materiálu 6	364 dny	31.12. 13	24.5. 15
13	Skládka zeminy uvnitř objektu	27 dny	3.2. 14	11.3. 14
14	Skládka materiálu 6a, 6b	60 dny	10.3. 15	1.6. 15
15	Kontejner na zářivky	87 dny	11.4. 14	11.8. 14
16	Ostatní odpadové kontejnery	380 dny	31.12. 13	15.6. 15

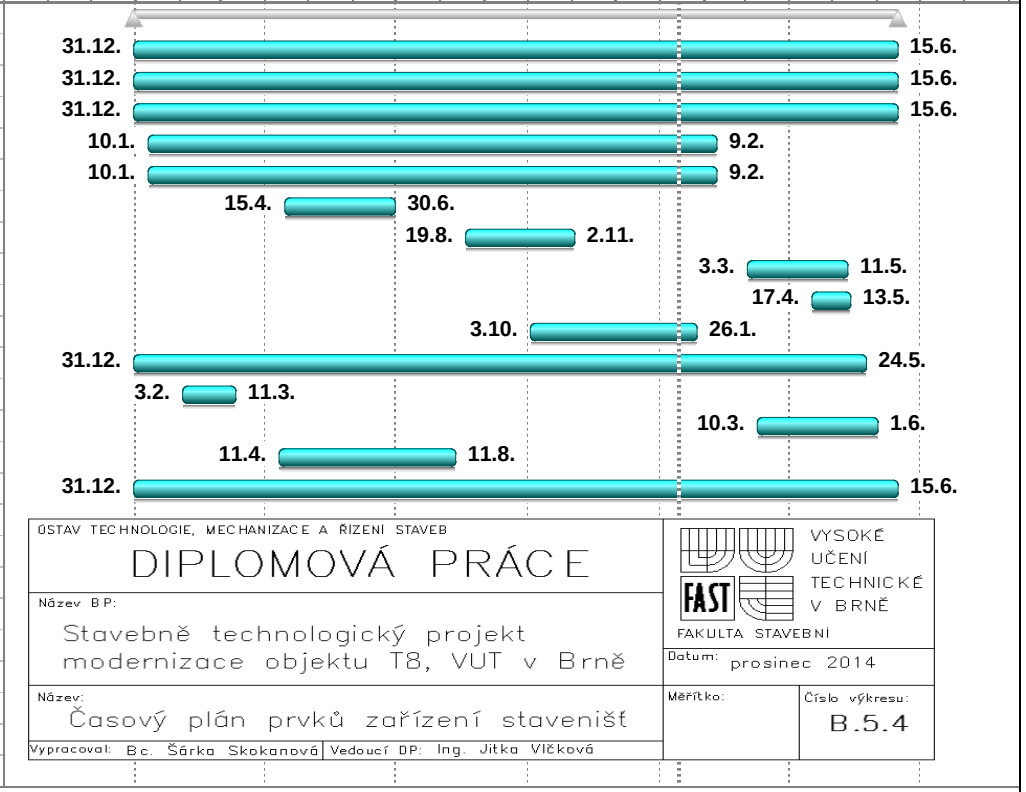

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Název BP:
Stavebně technologický projekt modernizace objektu T8, VUT v Brně

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

Datum: prosinec 2014

Název:
Časový plán prvků zařízení staveniš

Měřítko:

Číslo výkresu:
B.5.4

Vypracoval: Bc. Šárka Skokanová | Vedoucí DP: Ing. Jitka Vičková

Projekt: zařízení staveniště.mpp
Datum: 14.1. 15

Úkol		Zahrnutý úkol		Vnější úkoly	
Průběh		Zahrnutý milník	◇	Souhrn projektu	
Milník	◆	Zahrnutý průběh		Seskupit podle souhrnu	
Souhrnný		Rozdělení		Konečný termín	⇩

Vypracoval: Bc. Šárka Skokanová
