P.10 Časový plán montáže hlavního stavebního objektu

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	MJ	Množství	Nh	Pracovníci
1		**BD MIROSLAV**	**71,85 dny**	**7.5. 18**	**14.8. 18**			**0**	**0**	**0**
2		Zahájení etapy hrubá vrchní stavba-montáž	0 dny	7.5. 18	7.5. 18			0	0	0
3		**1S**	**17,03 dny**	**7.5. 18**	**30.5. 18**			**0**	**0**	**0**
4		Montáž sloupů 1S obvodových	0,68 dny	7.5. 18	7.5. 18	2	ks	12	1,35	3
5		Montáž zemních panelů 1S	6,8 dny	7.5. 18	16.5. 18	4	m2	224,46	0,97	4
6		Montáž sloupů vnitřních	0,23 dny	16.5. 18	16.5. 18	5	ks	4	1,35	3
7		Montáž průvlaků	0,27 dny	16.5. 18	16.5. 18	6;5	ks	4	1,59	3
8		Montáž stěn výtahové šachty	0,23 dny	16.5. 18	17.5. 18	7;5	ks	4	1,35	3
9		Výztuž věnců	0,56 dny	16.5. 18	17.5. 18	5	t	0,65	27,67	4
10		Bednění věnců	0,54 dny	17.5. 18	17.5. 18	9	m2	22,02	0,79	4
11		Betonáž věnců	0,29 dny	17.5. 18	17.5. 18	10	m3	6,48	1,45	4
12		Schodiště	0,27 dny	24.5. 18	24.5. 18	13;5	ks	3	1,43	2
13		Montáž stropu 1S	1,59 dny	22.5. 18	24.5. 18	5;6;7;11FS+3 dny	ks	37	1,72	5
14		Zálivka	3,57 dny	24.5. 18	30.5. 18	13	m3	32	3,57	4
15		**1NP**	**15,41 dny**	**4.6. 18**	**25.6. 18**			**0**	**0**	**0**
16		Sloupy 1NP	0,23 dny	4.6. 18	4.6. 18	14FS+3 dny	ks	4	1,35	3
17		Zdivo 1NP	3,46 dny	4.6. 18	7.6. 18	14FS+3 dny	m2	158	0,7	4
18		Výztuž věnců	0,38 dny	7.6. 18	7.6. 18	17	t	0	27,67	4
19		Bednění věnců	0,53 dny	7.6. 18	8.6. 18	18	m2	21	0,79	4
20		Betonáž věnců	0,2 dny	8.6. 18	8.6. 18	19	m3	4	1,45	4
21		Průvlaky	0,2 dny	7.6. 18	7.6. 18	16;17	ks	3	1,59	3
22		Montáž stěn výtahové šachty	0,23 dny	4.6. 18	4.6. 18	14FS+3 dny	ks	4	1,35	3
23		Schodiště	0,18 dny	15.6. 18	15.6. 18	17;24	ks	3	1,43	3
24		Montáž stropu 1NP	1,45 dny	13.6. 18	15.6. 18	17;20FS+3 dny;21	ks	27	1,72	4
25		Montaz stropu-filigran	0,22 dny	13.6. 18	13.6. 18	17;20FS+3 dny;21	ks	8	0,88	4
26		Montaz balkonu 2 NP	0,11 dny	13.6. 18	13.6. 18	25	ks	4	0,88	4
27		Betonáž stropů Filigrán, zalivka spiroll	6,39 dny	15.6. 18	25.6. 18	26;25;24	m3	113,68	0,9	2
28		**2NP**	**15,4 dny**	**28.6. 18**	**19.7. 18**			**0**	**0**	**0**
29		Sloupy 2NP	0,23 dny	28.6. 18	28.6. 18	27FS+3 dny	ks	4	1,35	3
30		Zdivo 2NP	3,46 dny	28.6. 18	3.7. 18	27FS+3 dny	m2	158	0,7	4
31		Výztuž věnců	0,39 dny	3.7. 18	4.7. 18	30	t	0,45	27,67	4
32		Bednění věnců	0,51 dny	4.7. 18	4.7. 18	31	m2	21	0,79	4
33		Betonáž věnců	0,2 dny	4.7. 18	4.7. 18	32	m3	4,49	1,45	4
34		Průvlaky	0,2 dny	3.7. 18	4.7. 18	29;30	ks	3	1,59	3
35		Montáž stěn výtahové šachty	0,23 dny	28.6. 18	28.6. 18	27FS+3 dny	ks	4	1,35	3
36		Schodiště	0,18 dny	11.7. 18	11.7. 18	30;37	ks	3	1,43	3
37		Montáž stropu 2NP	1,45 dny	10.7. 18	11.7. 18	30;34;33FS+3 dny	ks	27	1,72	4
38		Montaz stropu-filigran	0,22 dny	10.7. 18	10.7. 18	30;34;33FS+3 dny	ks	8	0,88	4
39		Montaz balkonu 3 NP	0,11 dny	10.7. 18	10.7. 18	38	ks	4	0,88	4
40		Betonáž stropů Filigrán, zalivka spiroll	6,39 dny	11.7. 18	19.7. 18	37;38;39	m3	113,68	0,9	2
41		**3NP**	**15,01 dny**	**24.7. 18**	**14.8. 18**			**0**	**0**	**0**
42		Sloupy 3NP	0,23 dny	24.7. 18	25.7. 18	40FS+3 dny	ks	4	1,35	3
43		Zdivo 3NP	3,36 dny	24.7. 18	30.7. 18	40FS+3 dny	m2	154	0,7	4
44		Výztuž věnců	0,39 dny	30.7. 18	30.7. 18	43	t	0,45	27,67	4
45		Bednění věnců	0,51 dny	30.7. 18	31.7. 18	44	m2	21	0,79	4
46		Betonáž věnců	0,2 dny	31.7. 18	31.7. 18	45	m3	4,49	1,45	4
47		Průvlaky	0,2 dny	30.7. 18	30.7. 18	42;43	ks	3	1,59	3
48		Montáž stěn výtahové šachty	0,23 dny	25.7. 18	26.7. 18	40FS+4 dny	ks	4	1,35	3
49		Montáž stropu 3NP	1,16 dny	3.8. 18	6.8. 18	43;47;46FS+3 dny	ks	27	1,72	5
50		Montaz stropu-filigran	0,88 dny	3.8. 18	6.8. 18	43;47;46FS+3 dny	ks	8	0,88	4
51		Montáž zastřešení balkonů	0,11 dny	6.8. 18	6.8. 18	50	ks	4	0,88	4
52		Betonáž stropů Filigrán	6,39 dny	6.8. 18	14.8. 18	49;50;51	m3	113,68	0,9	2
53		Předání smontovaného skeletu	0 dny	14.8. 18	14.8. 18	52		0	0	0

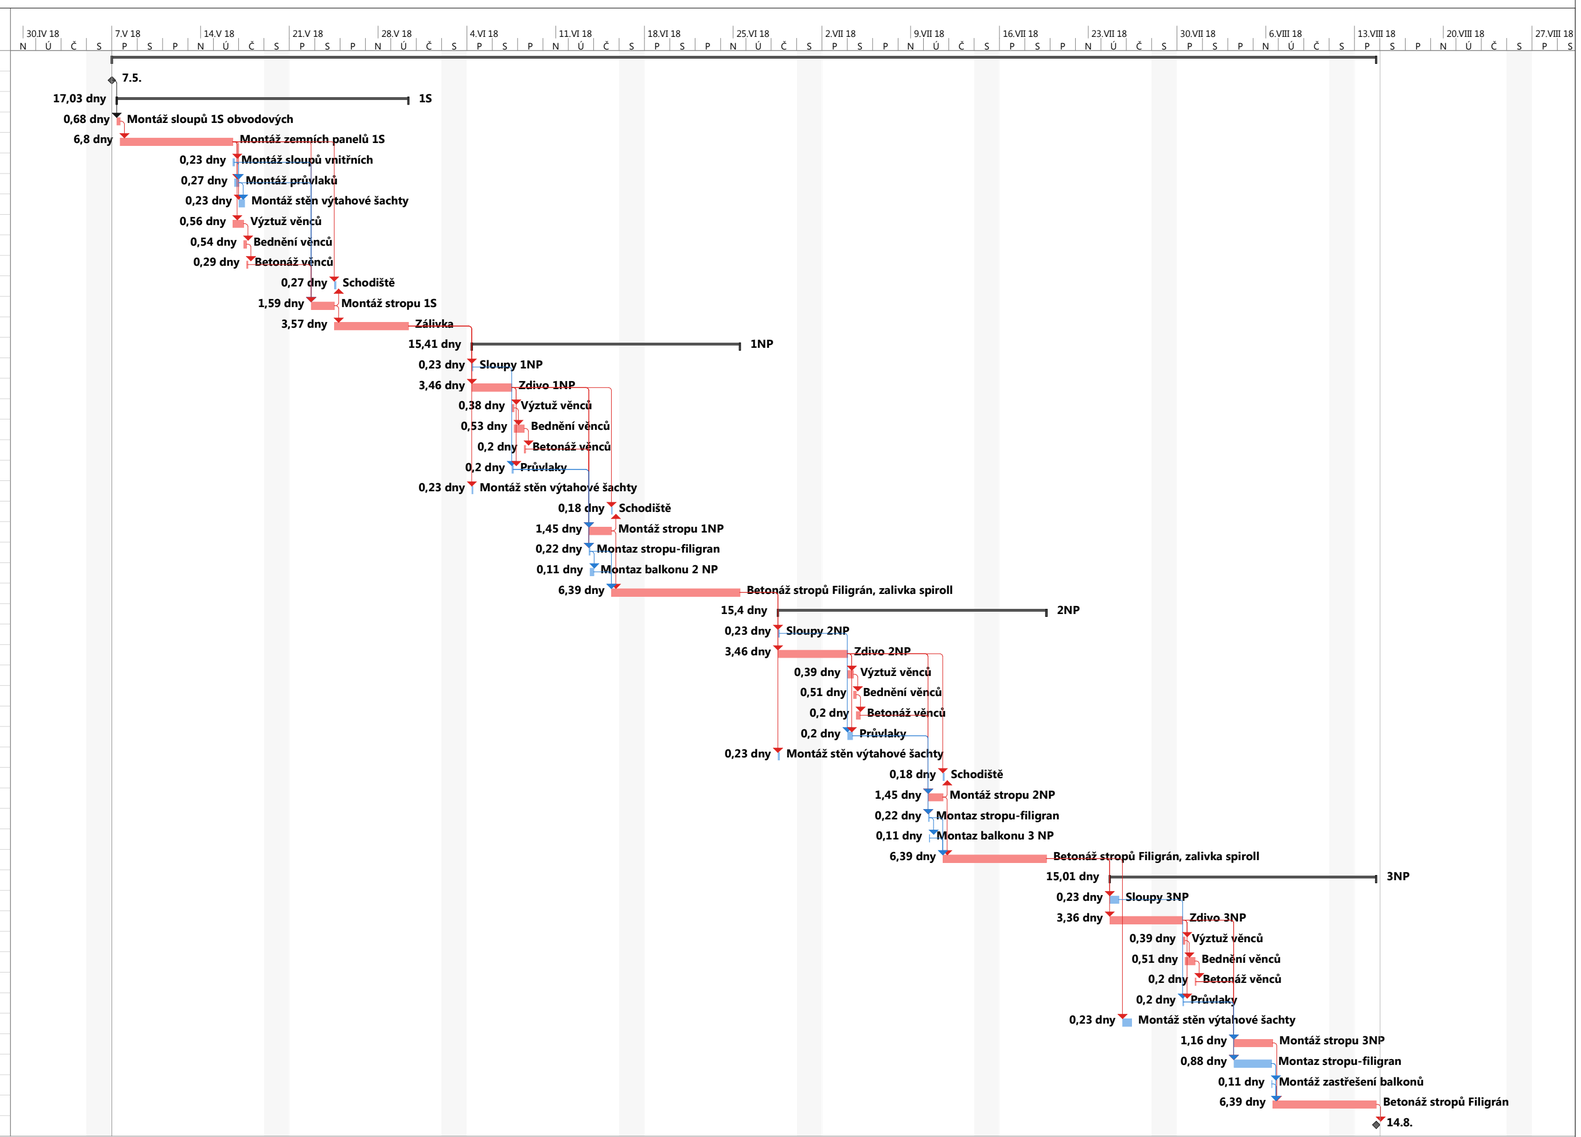

Projekt: 7.HMG
Datum: 12.1. 18

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Kritický · Kritické rozdělení · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu

DIPLOMOVÁ PRÁCE
BC. ALENA JEDLIČKOVÁ

P.10 Časový plán montáže hlavního stavebního objektu
